PRONACOM
Mejorando para Competir

# PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Reporte de Informes de Renglón 081
Préstamo BID 1734-OC/GU
Mes de Agosto de 2016

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

| No. de Contrato | Nombre | Tipo de servicios | Renglón | Monto Mensual | Monto total del Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| BID1734/OC-GU-AI-015-2016 | Hugo Leonel Ibañez Cabrera | Técnicos | 081 | Q8,500.00 | Q 76,500.00 |
| BID1734/OC-GU-AI-017-2016 | Belka Ivanna Cojulún Samayoa | Profesionales | 081 | Q18,000.00 | Q 162,000.00 |
| BID1734/OC-GU-AI-018-2016 | Dina Alejandra Alburez Márquez | Profesionales | 081 | Q14,000.00 | Q 126,000.00 |
| BID1734/OC-GU-AI-020-2016 | Amán José Rafael Sánchez Melgar | Profesionales | 081 | Q18,000.00 | Q 153,600.00 |
| BID1734/OC-GU-AI-023-2016 | Ana Paulina Boesche Quan | Profesionales | 081 | Q7,500.00 | Q 37,258.16 |
| BID1734/OC-GU-AI-035-2016 | Devora Emperatris Meza Orellana | Profesionales | 081 | Q17,000.00 | Q 85,000.00 |
| | | | | Q 83,000.00 | |

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-015-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

# PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
# MINISTERIO DE ECONOMÍA

**INFORME DEL MES DE AGOSTO 2016**

Para: Lic. José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Competitividad

De: HUGO LEONEL IBAÑEZ CABRERA

Nombre de Asesoría: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Asunto: Informe mensual

Fecha: 31 DE AGOSTO 2016

Estimado Director:

De manera atenta y respetuosa, describo a continuación las actividades realizadas durante el mes de AGOSTO 2016 y logros obtenidos.

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

a) Revisión de las facturas del renglón 029

Revisión de las facturas que corresponde al renglón 029 al mes Agosto 2016, en lo que se refiere al cumplimiento de los datos especificados y el cumplimiento de todos los requisitos legales que correspondan.

b) Revisión de las facturas del renglón 081

Revisión de las facturas que corresponde al renglón 081 al mes de Agosto 2016, en lo que se refiere al cumplimiento de los datos especificados y el cumplimiento de los requisitos legales que correspondan.

c) Revisión de las facturas del renglón 189

Revisión de las facturas en que a su parte legal corresponde, asimismo cotejar que el producto corresponda con los Términos de Referencia, como corresponda. Deberá estar aprobado por el Director Ejecutivo, revisión que este el CD, revisión de la factura que contenga los timbres (a quien corresponda).

d) Revisión de los Compromisos de los renglones especificados

Revisión de toda la documentación este acorde a los valores y los requisitos específicos en cada compromiso.

e) Envió de facturas del renglón 029 Recursos Humanos del Ministerio de Economía.

f) Envió de Cur's a la UDAF, del Ministerio de Economía

g) Control y resguardo de los Cur's de JULIO 2016

Durante el mes de JULIO 2016, se generaron 42 cur's, los cuales ya fueron archivados donde corresponde.

h) Suministro de Cur's a las personas que lo solicitan

i) Participación de Reuniones semanales en Anadie.

j) Participación en Taller de la presentación de Metro-Riel, en las mesas de Trabajo con las instituciones involucradas y personeros de la Firma IDOM.

**César Daniel Avila Palma**
Jefe Financiero
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMIA

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016


FECHA : 10/08/2016
HORA : 9:53.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 199 | 04/07/2016 | COM | NOR | OGA | 26700379 | RIVERA FLORES SILVIA ARAUELY | Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo según contrato BID1734/OC-GU-A1-027-2016, C.5 NOB CID CGU-944/2016 | 162,500.00 | 0.00 | 162,500.00 | 162,500.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 162,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 200 | 200 | 04/07/2016 | COM | NOR | OGA | 7187165 | ACEITUNO DIAZ JORGE MARIO | Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para análisis informático y diagnóstico de nuevos sistemas según contrato BID1734/OC-GU-A1-026-2016, C.1 CID/CGU-889/2016 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 96,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 12/07/2016 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 74,771.37 | 0.00 | 74,771.37 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 12/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 74,771.37 | | | | | | | | | | | |
| 202 | 126 | 13/07/2016 | DEV | NOR | OGA | IDOM | IDOM, INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.U. | Devengado por servicios de consultoría para la elaboración de estudios de evaluación y estructuración de la iniciativa de alianza para el desarrollo de infraestructura económica del Proyecto de Interconexión vial, según contrato BID1734/OC-GU-FC4002-2016, AM 134-2016 C.2 NOB CID/CGU-435/2015 Pago 1. | 3,042,605.18 | 733,485.17 | 2,309,120.01 | 2,309,120.01 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 3,042,605.18 | | | | | | | | | | | |
| 203 | 203 | 13/07/2016 | COM | NOR | OGA | 23998869 | SYRINX TECNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso por renovación de servicio de hosting/alojamiento de cuentas de correo y página web, renovación de nombre de dominio investinguatemala.org | 5,389.54 | 0.00 | 5,389.54 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,389.54 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | 15/07/2016 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-87535 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 22,945.83 | 4,052.57 | 18,893.26 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 18/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 22,945.83 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 205 | 20/07/2016 | COM | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | Compromiso de la contratación de servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-A1-028-2016, C.3 NOB CID CGU-1290 2016, periodo del 6 de julio al 31 de diciembre de 2016. | 105,096.77 | 0.00 | 105,096.77 | 59,353.26 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 105,096.77 | | | | | | | | | | | |
| 206 | 34 | 20/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 50913483 | EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA | Devengado por arrendamiento de bodegas para Pronacom, según acta No. 001-2016, correspondiente al mes de julio de 2016. FACT A número 001697. | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 25/07/2016 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto


FECHA : 10/08/2016
HORA : 9:53.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 3,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 207 | 29/07/2016 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicios telefónicos para el Programa, durante el mes de junio de 2016, PBX 2421-2464 | 5,591.00 | 0.00 | 5,591.00 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 5,591.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 208 | 29/07/2016 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de internet para oficinas de Programa, durante el mes de julio de 2016 enlace 720284 | 7,640.00 | 0.00 | 7,640.00 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 7,640.00 | | | | | | | | | | | |
| 209 | 209 | 29/07/2016 | CYD | NOR | OGA | 326435 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de energía eléctrica para el Programa durante el periodo del 5 de junio al 6 de julio de 2016 | 6,089.15 | 0.00 | 6,089.15 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 6,089.15 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 103 | 27/07/2016 | DEV | NOR | SUB | 1597590 | IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL | Devengado por servicios técnicos como asistente de contabilidad de conformidad con el contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2016 AM 139-2016, correspondiente al mes de julio de 2016 FACT A105 C 5 NOG CID/CGU-405/2016 | 8,500.00 | 425.00 | 8,075.00 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 27/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 8,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 127 | 22/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 49224328 | SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL | Devengado por Servicios Profesionales como Asesor Técnico en Automatización de Tramites según contrato BID1734/OC-GU-AI-020-2016, AM 155-2016, correspondiente al mes de julio de 2016. FACT C10. C 1 . NOG CID/CGU-457/2016. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 27/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 18,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 96 | 22/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 51288990 | VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES | Devengado por servicios técnicos como Asesor 2 para documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734-OC-GU-AI-012-2016, AM 128-2016 contra entrega del producto cuarto Cuarto informe de desarrollo de documentaciones y simplificaciones FACT E7 C1. NOG CID/CGU-405/2016 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 18,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 182 | 22/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 1518819 | BERDOCIA MORALES ERWIN | Devengado por servicios profesionales según contrato BID1734-OC-GU-AI-024-2016, AM 236-2016, correspondiente al segundo pago contra entrega del producto evaluación de actividades, resultados y productos generados por el componente FACT82 C5 CID/CGU-945/2016. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | ELARAC | | ELARAC | CDAVILAP | SMZAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto



**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016**

**EJERCICIO: 2016**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | USUARIOS Solicito | USUARIOS Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 97 | 22/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 64626474 | OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA | Devengado por servicios profesionales como Asesor I para documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-A1-013-2016, AM 129-2016, contra entregu del producto cuatro cuarto informe de desarrollo de documentaciones y simplificaciones. FACT A119 C.1 NOB CID CGU-405/2016 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 215 | 102 | 22/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 26705974 | COBULUN SAMAYOA BELSA IVANNA | Devengado por Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación según contrato BID1734/OC-GU-A1-017-2016 AM 133-2016, correspondiente al mes de julio de 2016. FACT A24 C.3 NOB CID/CGU-405/2016. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 27/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 18,000.00 | | | | | | | | | | |
| 216 | 101 | 22/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 1660/1823 | ALBUREZ MARQUEZ DINA ALEJANDRA | Devengado por servicios profesionales como Asesor en Relaciones Publicas de conformidad con el contrato BID1734/OC-GU-A1-018-2016, AM 132-2016 correspondiente al mes de julio de 2016 FACT C11. C 5 NOB CID/CGU-404/2016 | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 27/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 14,000.00 | | | | | | | | | | |
| 217 | 192 | 22/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 6580580 | VELASQUEZ RODRIGUEZ ANA ELIZABETH | Devengado por servicios profesionales como asesor para la implementación de mesas de competitividad según contrato BID1734/OC-GU-A1-024-2016 correspondiente al primero y segundo pago contra entrega del producto uno y dos FACT A106 A108 C4 NOB CID/CGU-493-2016 | 42,630.00 | 0.00 | 42,630.00 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 42,630.00 | | | | | | | | | | |
| 218 | 218 | 25/07/2016 | COM | NOR | OGA | 7415530 | MACARIO QUINO ASARIO | Compromiso por compra de hilo rayón 150% hilo Alemán para uso artesanal. libre de tales agencias para uso del Programa Tejiendo Alimentos. | 56,004.00 | 0.00 | 56,004.00 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 56,004.00 | | | | | | | | | | |
| 219 | 219 | 25/07/2016 | COM | NOR | OGA | 80079460 | CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso por servicio de mensajería para Promacom, correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de julio de 2016 | 9,591.87 | 0.00 | 9,591.87 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 9,591.87 | | | | | | | | | | |
| 220 | 220 | 25/07/2016 | COM | NOR | OGA | 7055269 | SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso por servicio de limpieza para Promacom, durante el mes de julio de 2016 | 4,980.81 | 0.00 | 4,980.81 | 0.00 | APROBADO | JLLARAC | | JLLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 4,980.81 | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto



Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 205 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 25909839 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | Devengado por servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AS-028-2016, correspondiente al primer pago contra entrega del producto uno documento que contenga análisis de la situación actual en promipymes. C.3 NOB CID/CGU-1390/2016. FACT A132 | 15,764.51 | 703.77 | 15,060.74 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 15,764.51 | | | | | | | | | | | |
| 222 | 165 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 38599259 | GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Devengado por servicios de asesoría y soporte informático, según acta 009-2016. C5 NOB CID/CGU-935/2016, correspondiente al mes de julio de 2016. FACT C 001879. | 11,050.00 | 0.00 | 11,050.00 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 11,050.00 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 219 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 60079460 | CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | Devengado por servicio de mensajería para Pronacom, correspondiente al periodo del 1 de junio al 15 de julio de 2016. Fact B967 | 9,591.87 | 428.21 | 9,163.66 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 9,591.87 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 218 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 7815530 | MACARIO QUINO ASARIO | Devengado por compra de hilo rayón 100% hilo Alemán para uso artesanal, libre de tintes azoicos para uso del Programa Tejiendo Alimentos. | 56,004.00 | 1,500.11 | 54,503.89 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 56,004.00 | | | | | | | | | | | |
| 225 | 95 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Devengado por servicios profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AS-036-2016 AM 113-2016, contra entrega del cuarto producto documento de asesoría en validación de documentos administrativos. Fact A96 C 5 NOB CID/CGU-435/2016. | 27,000.00 | 1,205.36 | 25,794.64 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 52 | 27,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 226 | 230 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 7055369 | SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Compromiso por servicio de limpieza para Pronacom, durante el mes de julio de 2016. Fact B1 1290 | 4,980.81 | 0.00 | 4,980.81 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 4,980.81 | | | | | | | | | | | |
| 227 | 203 | 26/07/2016 | DEV | NOR | OGA | 23996989 | SYRINX TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA | Devengado por renovación de servicio de hosting/alojamiento de cuentas de correo y página web, renovación de nombre de dominio investinguatemala.org | 5,389.54 | 240.61 | 5,148.93 | 0.00 | APROBADO | RLARAC | | RLARAC | CDAVILAP | NSUAREZ | S | S | 29/07/2016 |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 5,389.54 | | | | | | | | | | | |
| 228 | 228 | 26/07/2016 | COM | NOR | SUE | 4967542 | ZENTENO LINARES YURI ORLANDO | AC - COMPROMISO HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2016 AL 31-12-2016 | 45,483.87 | 0.00 | 45,483.87 | 0.00 | APROBADO | batch process web | | batch process web | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | Total Fuente | 11 | 45,483.87 | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto


FECHA : 10/08/2016
HORA : 9:53.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016**

**EJERCICIO: 2016**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 229 | 26/07/2016 | COM | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - COMPROMISO HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029. DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2016 AL 31-12-2016 | 548,000.00 | 0.00 | 548,000.00 | 548,000.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **548,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 230 | 230 | 26/07/2016 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011, 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 100,250.00 | 22,273.73 | 77,976.27 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 27/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **100,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 231 | 229 | 27/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 104,000.00 | 3,907.14 | 100,092.86 | 100,092.86 | ERRADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **104,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 232 | 119 | 27/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 17,000.00 | 758.93 | 16,241.07 | 16,241.07 | ERRADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **17,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 233 | 229 | 27/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 104,000.00 | 3,907.14 | 100,092.86 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 28/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **104,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 234 | 119 | 27/07/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 17,000.00 | 758.93 | 16,241.07 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | batch_mantto_web | CDAVILAP | NJUAREZ | S | S | 28/07/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **17,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 235 | 226 | 28/07/2016 | COM | RTO | SUE | 4967542 | ZENTENO LINARES YURI ORLANDO | REVERSION COMPROMISO. HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029. DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2016 AL 31-12-2016 | -45,483.87 | 0.00 | -45,483.87 | 0.00 | APROBADO | RCLARA | | RCLARA | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **-45,483.87** | | | | | | | | | | | |
| 236 | 236 | 29/07/2016 | COM | NOR | SUE | 4967542 | ZENTENO LINARES YURI ORLANDO | AU - COMPROMISO HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029. DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016 | 15,483.87 | 0.00 | 15,483.87 | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 11 | | **15,483.87** | | | | | | | | | | | |
| 237 | 236 | 29/07/2016 | COM | RTO | SUE | 4967542 | ZENTENO LINARES YURI ORLANDO | REVERSION DE COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016 | -15,483.87 | 0.00 | -15,483.87 | 0.00 | APROBADO | RCLARA | | RCLARA | CDAVILAP | | N | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto


FECHA : 10/08/2016
HORA : 9:53.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora = 108, Fecha elaboracion >= 01/07/2016**

**EJERCICIO: 2016**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | -15,483.87 | | | | | | | | | | | |
| 238 | 238 | 29/07/2016 | COM | NOR | SUE | 4967542 | ZENTENO LINARES YURI ORLANDO | AU - COMPROMISO HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2016 AL 31-08-2016 | 45,483.87 | 0.00 | 45,483.87 | 45,483.87 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | 45,483.87 | | | | | | | | | | | |
| 239 | 151 | 01/08/2016 | DEV | NOR | SUE | 89361296 | BOESCHE QUAN ANA PAULINA | Devengado por servicios técnicos como Asesor Técnico para la difusión de Derecho al Consumidor, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2016, AM 189-2016, correspondiente al mes de julio de 2016. FACT A107 C 1 CUDC/GU-655/2016. | 7,500.00 | 375.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | APROBADO | RLARAC | | JLARAC | CDAVILAP | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | 7,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 240 | 110 | 09/08/2016 | CYD | DEV | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | DEVOLUCION TOTAL POR CUENTA CANCELADA DEL BENEFICIARIO NOMINA ADICIONAL SS-41609 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 | -24,228.43 | 0.00 | -24,228.43 | 0.00 | SOLICITADO | RCLARA | RCLARA | RCLARA | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | -24,228.43 | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 42** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 4,813,521.69 778,977.02 4,034,544.67 3,269,895.07

**TOTAL ENTIDAD:** 4,813,521.69 778,977.02 4,034,544.67 3,269,895.07

**CANTIDAD DE CUR: 42** **TOTAL GENERAL:** 4,813,521.69 778,977.02 4,034,544.67 3,269,895.07

Ministerio de Economía

PRONACOM
Mejorando para Competir

13 Calle 3-40 Zona 10 Edificio Atlantis
Torre 2, Oficina 302, Guatemala, Guatemala
Tel +502 2421-2464
www.pronacom.org

Guatemala, 13 de Julio 2016
PRONACOM-FIN/146-2016/hlic

COPIA

Señor
Estuardo Silva
Encargado Nomina 029
Subgerencia de Recursos Humanos
Ministerio de Economía.

Señor Silva:

De la manera más atenta y éxitos en sus labores diarias. Adjunto a la presente me permito enviarle las facturas e informes de las personas que se encuentran en el reglón 029 que corresponde a Julio 2016.

| Nombre | Monto Q. | Factura No. e informe |
|---|---|---|
| Lidia Nohemí Fajardo Flores | 6,000.00 | 012 |
| Brenda García Aceituno | 5,000.00 | 012 |
| Sonia María Aimee Rivas Godoy de Palma | 19,000.00 | 030 |
| Sofía Genoveva Medina Itzol | 10,000.00 | 070 |
| Verónica Xiomara Osorio Flores | 10,000.00 | 022 |
| Ana Gabriela Pérez Estrada | 19,000.00 | 060 |
| Luis Carlos Orellana Morales | 17,000.00 | 093 |
| Ana Elisa Calderón Menéndez | 18,000.00 | 087 |
| Yuri Zenteno Linares | 30,000.00 | 012 |
| **ULTIMA LINEA** | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Agradeciendo su atención, cordiales saludos,

Hugo Leonel Ibáñez Cabrera
Asistente de Contabilidad

César Daniel Avila Palma
Jefe Financiero
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMIA

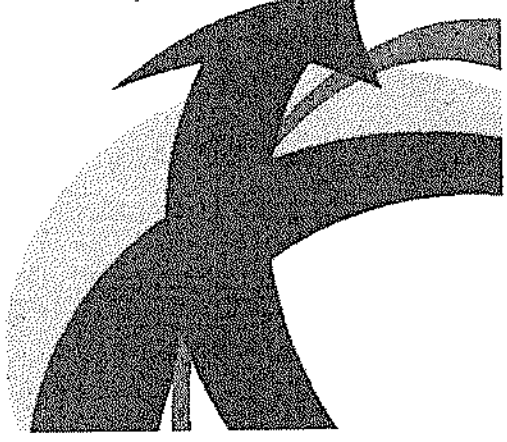

COPIA

| 07--01 | 108 |
|---|---|

## CONTROL RECEPCION Y ENTREGA DE CURS

PRONACOM
AGENCIA NACIONAL DE INVERSIONES DE GUATEMALA

RG-01-UDAF-2014

| ENTREGADO UNIDAD EJECUTORA | | | | RECIBIDO UDAF | | | RECIBIDO UNIDAD EJECUTORA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. CUR | FECHA | MONTO | | FECHA | NOMBRE | | FECHA | NOMBRE | FIRMA |
| 1 | 206 | 20/07/2016 | 3.400,00 | | | | | | | |
| 2 | 207 | 20/07/2016 | 5.591,00 | | | | | | | |
| | 208 | 20/07/2016 | 7.640,00 | | | | | | | |
| | 209 | 20/07/2016 | 6.089,15 | | | | | | | |
| | 210 | 21/07/2016 | 8.075,00 | | | | | | | |
| | 211 | 22/07/2016 | 17.198,43 | | | | | | | |
| | 212 | 22/07/2016 | 17.198,43 | | | | | | | |
| | 213 | 22/07/2016 | 23.883,93 | | | | | | | |
| | 214 | 22/07/2016 | 17.196,43 | | | | | | | |
| 10 | 215 | 22/07/2016 | 17.196,43 | | | | | | | |
| 11 | 216 | 22/07/2016 | 13.375,00 | | | | | | | |
| 12 | 217 | 22/07/2016 | 42.630,00 | | | | | | | |
| 13 | | ULTIMA LINEA | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |

B.G.

Observaciones

Hugo Leonel Ibáñez Cabrera
Asistente de Contabilidad

# COPIA

| 07--03 | 108 |
|---|---|

## CONTROL RECEPCION Y ENTREGA DE CURS

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

RG-01-UDAF-2014

| ENTREGADO UNIDAD EJECUTORA | | | | RECIBIDO UDAF | | | RECIBIDO UNIDAD EJECUTORA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. CUR | FECHA | MONTO | FECHA | NOMBRE | | FECHA | NOMBRE | FIRMA | |
| 1 | 226 | 26/07/2016 | 4.980,81 | | | | | | | |
| 2 | 227 | 26/07/2016 | 5.148,93 | | | | | | | |
| 3 | | ULTIMA LINEA | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |

Observaciones

Hugo Leonel Ibáñez Cabrera
Asistente de Contabilidad

COPIA

| 07--02 | 108 |
|---|---|

## CONTROL RECEPCION Y ENTREGA DE CURS

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

RG-01-UDAF-2014

| ENTREGADO UNIDAD EJECUTORA | | | | RECIBIDO UDAF | | | RECIBIDO UNIDAD EJECUTORA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. CUR | FECHA | MONTO | | FECHA | NOMBRE | | FECHA | NOMBRE | FIRMA |
| 1 | 221 | 26/07/2016 | 15.060,74 | | | | | | | |
| 2 | 222 | 26/07/2016 | 11.050,00 | | | | | | | |
| 3 | 223 | 26/07/2016 | 9.163,66 | | | | | | | |
| 4 | 224 | 26/07/2016 | 54.503,89 | | | | | | | |
| 5 | 225 | 26/07/2016 | 25.794,64 | | | | | | | |
| 6 | | ULTIMA LINEA | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |

Observaciones

Hugo Leonel Ibáñez Cabrera
Asistente de Contabilidad

ANADIE
Alianzas Público Privadas

# AGENDA

"PRIMER INFORME DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA CONSULTORA IDOM, EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO METRO RIEL"

Jueves 28 de Julio de 2016

| HORA | TEMA |
|---|---|
| 8:30 a 9:00 | Registro de participantes |
| 9:00 a 9:15 | Palabras de bienvenida a cargo de la Ingeniera Lucrecia Ruiz, Directora Ejecutiva en Funciones de la ANADIE |
| 9:15 a 10:30 | Presentación del "Primer Informe de Resultados de los estudios realizados por la consultora IDOM, en el marco de la estructuración del proyecto Metro Riel, a cargo del equipo de IDOM |
| 10:30 a 11:00 | **Coffe Break** |
| 11:00 a 12:15 | Retroalimentación, preguntas y respuestas en relación a los resultados presentados |
| 12:15 a 12:30 | Cierre del evento a cargo del Ingeniero Rafael Díaz, Gerente del Proyecto. |

PRONACOM
Mejorando para Competir

13 Calle 3-40 Zona 10 Edificio Atlantis
Torre 2, Oficina 302. Guatemala, Guatemala
Tel +502 2421-2464
www.pronacom.org

Ministerio de Economía

Guatemala, 11 de Agosto 2016
PRONACOM-FIN/170-2016/hlic

COPIA

Señor
Estuardo Silva
Encargado Nomina 029
Subgerencia de Recursos Humanos
Ministerio de Economía.

Señor Silva:

De la manera más atenta y éxitos en sus labores diarias. Adjunto a la presente me permito enviarle las facturas e informes de las personas que se encuentran en el reglón 029 que corresponde a Agosto 2016.

| Nombre | Monto Q. | Factura No. e informe |
|---|---|---|
| Lidia Nohemí Fajardo Flores | 6,000.00 | 013 |
| Brenda García Aceituno | 5,000.00 | 014 |
| Sofía Genoveva Medina Itzol | 10,000.00 | 072 |
| Verónica Xiomara Osorio Flores | 10,000.00 | 023 |
| Luis Carlos Orellana Morales | 17,000.00 | 094 |
| Ana Elisa Calderón Menéndez | 18,000.00 | 088 |
| **ULTIMA LINEA** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Agradeciendo su atención, cordiales saludos,

Hugo Leonel Ibáñez Cabrera
Asistente de Contabilidad

Estuardo Silva M.
Encargado Nómina 029
Dirección de Recursos Humanos
Ministerio de Economía
Rec. 11/08/16
9:00 hrs

## CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORME

Por este medio hago **CONSTAR** que he recibido y leído el informe abajo indicado de los servicios prestados dentro de la contratación titulada:

***Asesor en Comunicación***
Nombre o título de los servicios de asesoría

Que realizó:

***Belka Ivanna Cojulún Samayoa***
Nombre de la persona contratada

Como parte de los servicios de asesoría prestados al Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el cual recibo a entera conformidad porque cumplen con los Términos de Referencia del Contrato No.: ***BID 1734/OC-GU-AI-017-2016***

Por lo que se solicita trasladar a donde corresponda para continuar con el proceso respectivo de pago, por la cantidad de: ***Q. 18,000.00***

Se adjunta el Informe No. **5**

Titulado:

***"Informe de avance del plan de trabajo de la asesoría y seguimiento a las acciones de comunicación y divulgación de Pronacom y el Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva durante el mes de agosto. Acciones con medios de comunicación, agencias y otras instituciones relacionadas con competitividad, apoyo a la organización y ejecución de eventos, programas de difusión u otras actividades que formen parte de la estrategia de comunicación, así como en la elaboración y análisis de discursos y otros materiales necesarios para la realización de presentaciones públicas".***

Impreso en: ***21 hojas***
Cantidad en hojas

**SI**
Indicar si se adjunta en CD

Fecha de entrega del informe: ***31 de agosto de 2016***

**Aprobación del Informe:**

**Firma y sello:**

José Fernando Suriano Báez
Director Ejecutivo
PRONACOM

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-017-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

**PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**INFORME AGOSTO 2016**

Para: José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo

De: Belka Ivanna Cojulún Samayoa

Nombre de Asesoría: Asesor en Comunicación

Asunto: INFORME 5

Fecha: 31 de agosto de 2016

Señor Director:

De manera atenta y respetuosa, describo las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2016 y los logros obtenidos.

## INFORME 5

Informe de avance del plan de trabajo de la asesoría y seguimiento a las acciones de comunicación y divulgación de Pronacom y el Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva durante el mes de agosto. Acciones con medios de comunicación, agencias y otras instituciones relacionadas con competitividad, apoyo a la organización y ejecución de eventos, programas de difusión u otras actividades que formen parte de la estrategia de comunicación, así como en la elaboración y análisis de discursos y otros materiales necesarios para la realización de presentaciones públicas.

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se editaron los textos de cinco boletínes informativos digitales con noticias sobre el trabajo semanal del Programa Nacional de Competitividad –PRONACOM- para ser enviados a las instituciones aliadas y contrapartes de la organización.

Esto sirvió para enviar información precisa, con una redacción correcta, para dar a conocer los proyectos en los que trabaja actualmente PRONACOM y el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, así como para reafirmar el compromiso de la institución con la competitividad de Guatemala.

2. Se coordinó el diseño de materiales para colgar en las redes sociales, junto con los textos de complemento para los mismos.

   Entre los mensajes que se compartieron estuvieron posiciones de Guatemala en el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF) y el Doing Business, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, así como mensajes clave de PRONACOM.

   Esto sirve para informar a los usuarios de las redes sociales de PRONACOM, con mensajes claros y atractivos que atraigan su atención y permitan obtener más seguidores.

3. Se apoyó en las publicaciones en la fanpage de Facebook y en el Twitter de PRONACOM, se respondieron comentarios y mensajes directos enviados a estas redes sociales y se filtraron mensajes irrespetuosos y/o que contenían vocabulario inapropiado.

   Los mensajes y respuestas redactados se enfocaron en datos sobre competitividad de Guatemala, actividades de PRONACOM y competitividad regional.

   Con estas publicaciones se logró dar a conocer a los seguidores de las redes sociales de PRONACOM el trabajo que realiza la institución y la situación actual del país en materia de competitividad, lo cual brinda una plataforma para comunicar los logros del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva. (Ver Anexo I).

4. Se cubrieron las reuniones de la Misión de la Millennium Challenge Corporation que visitó Guatemala, con toma de fotografías, publicaciones en redes sociales y la redacción de un comunicado de prensa. El comunicado fue enviado a periodistas de medios escritos, impresos y digitales.

   Esto logró dar a conocer que PRONACOM lidera el Programa Umbral MCC y también logró que algunos medios publicaran sobre éstos.

5. Se continúo la coordinación del rediseño de la página web de PRONACOM, así como la actualización de la información de las secciones que la conforman.

Se elaboró un esquema para agregar la información de los proyectos de PRONACOM, y posteriormente se redactó cada uno, de acuerdo al estilo de la página web de PRONACOM.

Esto sirvió para actualizar la página web y ofrecer un diseño más amigable y fácil de navegar. De esta forma se busca que los usuarios cuenten con toda la información sobre PRONACOM y el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, así como al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

6. Se asistió a la presentación de Gobierno Abierto, el 11 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de apoyar y dar cobertura a la validación y aprobación el Plan Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.

   Este Plan incluye 22 compromisos basados en los principios de transparencia, colaboración y participación. PRONACOM impulsa el Gobierno Abierto, ya que su aplicación aumenta la confianza en las instituciones y mejora la competitividad del país, lo cual impacta el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva de la institución, en el Componente 1 de clima de negocios.

   Durante la actividad se tomaron fotografías y se publicaron mensajes en las redes sociales de PRONACOM.

   Esto servirá para posicionar a PRONACOM con la implementación de Gobierno Abierto.

7. Se coordinó la alimentación de las secciones de Noticias, Documentos de Interés e Información Pública al portal web del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) www.pronacom.gt.

   Esto sirve para dar a conocer los proyectos que trabaja actualmente Pronacom a varios públicos, así como documentos que los respaldan, lo cual brinda una plataforma para comunicar los logros del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.

8. Se enviaron correos a periodistas que cubren temas relacionados con PRONACOM para felicitarlos por el aniversario de sus medios de comunicación. Estos fueron Nómada, Prensa Libre y Diario de Centroamérica.

   Esto servirá para estrechar lazos con los medios de comunicación y que PRONACOM sea una opción para sus publicaciones sobre temas de competitividad.

9. Se apoyó la logística de la segunda reunión de Consejo Asesor de PRONACOM 2016, la cual se realizó el jueves 25 de agosto.

   El Consejo Asesor está conformado por representantes de otras instituciones del Estado, así como por representantes de la sociedad civil, tales como el sector laboral, académico y medios de comunicación.

   Durante esta reunión se dio a conocer la actualización de la Agenda Nacional de Competitividad, la Política Económica 2016-2018 y el rediseño de la página web de PRONACOM.

   Se colaboró con el texto de la invitación, así como con la redacción del comunicado de prensa, talking points y coordinación de los materiales gráficos para el evento.

   Además se convocó a medios de comunicación, se atendieron a los que asistieron a la actividad y posteriormente se les envió el comunicado de prensa y fotografías a los que no lograron llegar.

   También se tomaron fotografías durante el evento y se realizaron publicaciones en Facebook y Twitter.

   Esto servirá para integrar a todos los sectores de la sociedad en el trabajo por la competitividad nacional, el cual no debe ser exclusivo de una persona o de algunos grupos. Además, se logró dar a conocer los proyectos de PRONACOM, no solo a los medios de comunicación y participantes de la reunión, sino a la población guatemalteca que sigue las redes sociales de PRONACOM y que tiene acceso a los medios que publicaron notas al respecto.

10. Se apoyó en la elaboración de Talking Points para actividades públicas a las que asistió el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Acisclo Valladares Urruela.

    Entre los temas abordados estuvieron el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y su participación en un desayuno de la organización Guatemala Próspera.

    Esto sirvió para que el Comisionado mencionara los mensajes clave de PRONACOM durante sus intervenciones.

11. Se apoyó la redacción de un artículo sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte para la revista de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Esto servirá para posicionar a PRONACOM como la institución que lidera este Plan en Guatemala, así como para dar a conocer las acciones que se han realizado hasta la fecha en relación a este Plan.

## LOGROS OBTENIDOS

1. El trabajo realizado al coordinar el rediseño de la página web de PRONACOM logró lanzar el proyecto en la segunda reunión de Consejo Asesor de PRONACOM 2016, lo cual logró que todos los asistentes conocieran la nueva imagen de esta herramienta. Esto brindó una plataforma para comunicar los avances del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.

2. Con el envío de correos a los periodistas por el aniversario de sus medios, así como la atención que se les brindó para la segunda reunión de Consejo Asesor de PRONACOM 2016, se logró reforzar la relación con este público y ayudó a posicionar a PRONACOM como fuente de información para temas de competitividad y cobertura positiva de la institución en las publicaciones.

3. La cobertura brindada durante la visita de la delegación de la Millennium Challenge Corporation (MCC) logró dar a conocer el apoyo político e institucional al más alto nivel con el que cuenta la MCC para la ejecuión eficiente del Programa Umbral Guatemala.

4. El apoyo brindado para la redacción del artículo sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte logró dar a conocer este tema a los lectores de la revista de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, especialmente el trabajo de coordinación que realiza PRONACOM para el mismo.

**Belka Ivanna Cojulún Samayoa**

**Aprobado por:**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

# Anexo I

**Redes sociales de PRONACOM (Facebook y Twitter)**

## Facebook

Pronacom
Página
Mensajes
Notificaciones
Estadísticas
Herramientas de publicación
Configuración
Ayuda
PRONACOM
Mejorando para Competir
"El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que lo forman".
Camilo Cruz
Me gusta
Enviar mensaje
Más
Llamar
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Estado
Foto/video
Oferta, Evento +
Escribe algo...
Pronacom agregó 5 fotos nuevas.
El Ministro de Economía, Rubén Morales Monroy, se reunió hoy con el Alcalde de Flores, Petén, Carlos René Caal, para trabajar la dinamización de la economía local en ese municipio, con el fin de acelerar el desarrollo, crecimiento y las oportunidades de empleo, y con ello mejorar la vida de sus habitantes.
Durante este encuentro también participaron el Viceministro de la MIPYME, Ezra Orozco; y la Subdirectora Ejecutiva de PRONACOM, Aimeé Rivas de Palma.
+2
736 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta
Comentar
Compartir
Ruben Morales Monroy, Teresa Melchor y 11 personas más
2 veces compartido
Organización · Ciudad de Guatemala
4.6 CERRADO AHORA
Busca publicaciones en esta página
26 196 personas alcanzadas con tus publicaciones esta semana
INFORMACIÓN
13 calle 3-40 zona 10 Nivel 3, Edifi... Guardar
Guatemala City
2421 2464
Normalmente responde en un día
Enviar un mensaje ahora
Promocionar sitio web
Luchy Muriedas
6 amigos en común, incluidos Marina Chacon y Erick Galvez
Cómo crear publicaciones eficaces
Las publicaciones visuales breves dirigidas al público adecuado tienen más éxito.
Ver todos los consejos para páginas
FOTOS

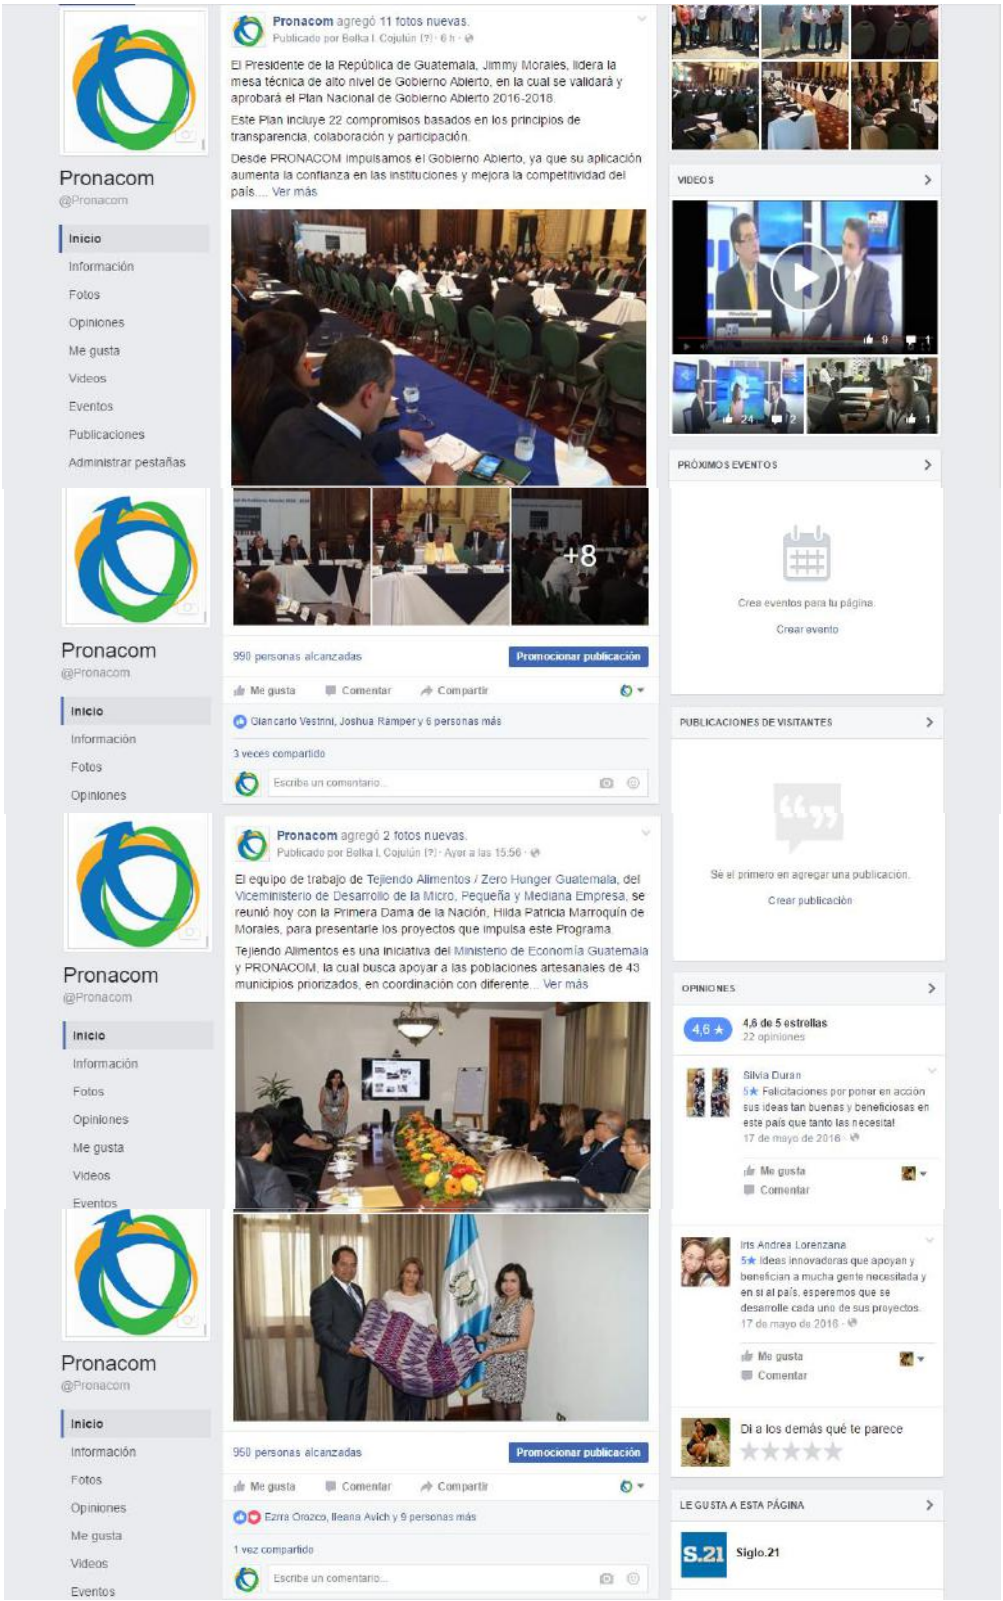
Pronacom agregó 11 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 6 h ·
El Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, lidera la mesa técnica de alto nivel de Gobierno Abierto, en la cual se validará y aprobará el Plan Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.
Este Plan incluye 22 compromisos basados en los principios de transparencia, colaboración y participación.
Desde PRONACOM impulsamos el Gobierno Abierto, ya que su aplicación aumenta la confianza en las instituciones y mejora la competitividad del país.... Ver más
+8
990 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Giancarlo Vestrini, Joshua Ramper y 6 personas más
3 veces compartido
Escribe un comentario...
Pronacom agregó 2 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · Ayer a las 15:56 ·
El equipo de trabajo de Tejiendo Alimentos / Zero Hunger Guatemala, del Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se reunió hoy con la Primera Dama de la Nación, Hilda Patricia Marroquín de Morales, para presentarle los proyectos que impulsa este Programa.
Tejiendo Alimentos es una iniciativa del Ministerio de Economía Guatemala y PRONACOM, la cual busca apoyar a las poblaciones artesanales de 43 municipios priorizados, en coordinación con diferente... Ver más
950 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Ezra Orozco, Ileana Avich y 9 personas más
1 vez compartido
Escribe un comentario...
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
VIDEOS
PRÓXIMOS EVENTOS
Crea eventos para tu página.
Crear evento
PUBLICACIONES DE VISITANTES
Sé el primero en agregar una publicación.
Crear publicación
OPINIONES
4.6 ★
4,6 de 5 estrellas
22 opiniones
Silvia Duran
5★ Felicitaciones por poner en acción sus ideas tan buenas y beneficiosas en este país que tanto las necesita!
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta · Comentar
Iris Andrea Lorenzana
5★ Ideas innovadoras que apoyan y benefician a mucha gente necesitada y en si al país, esperemos que se desarrolle cada uno de sus proyectos.
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta · Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
S.21
Siglo.21

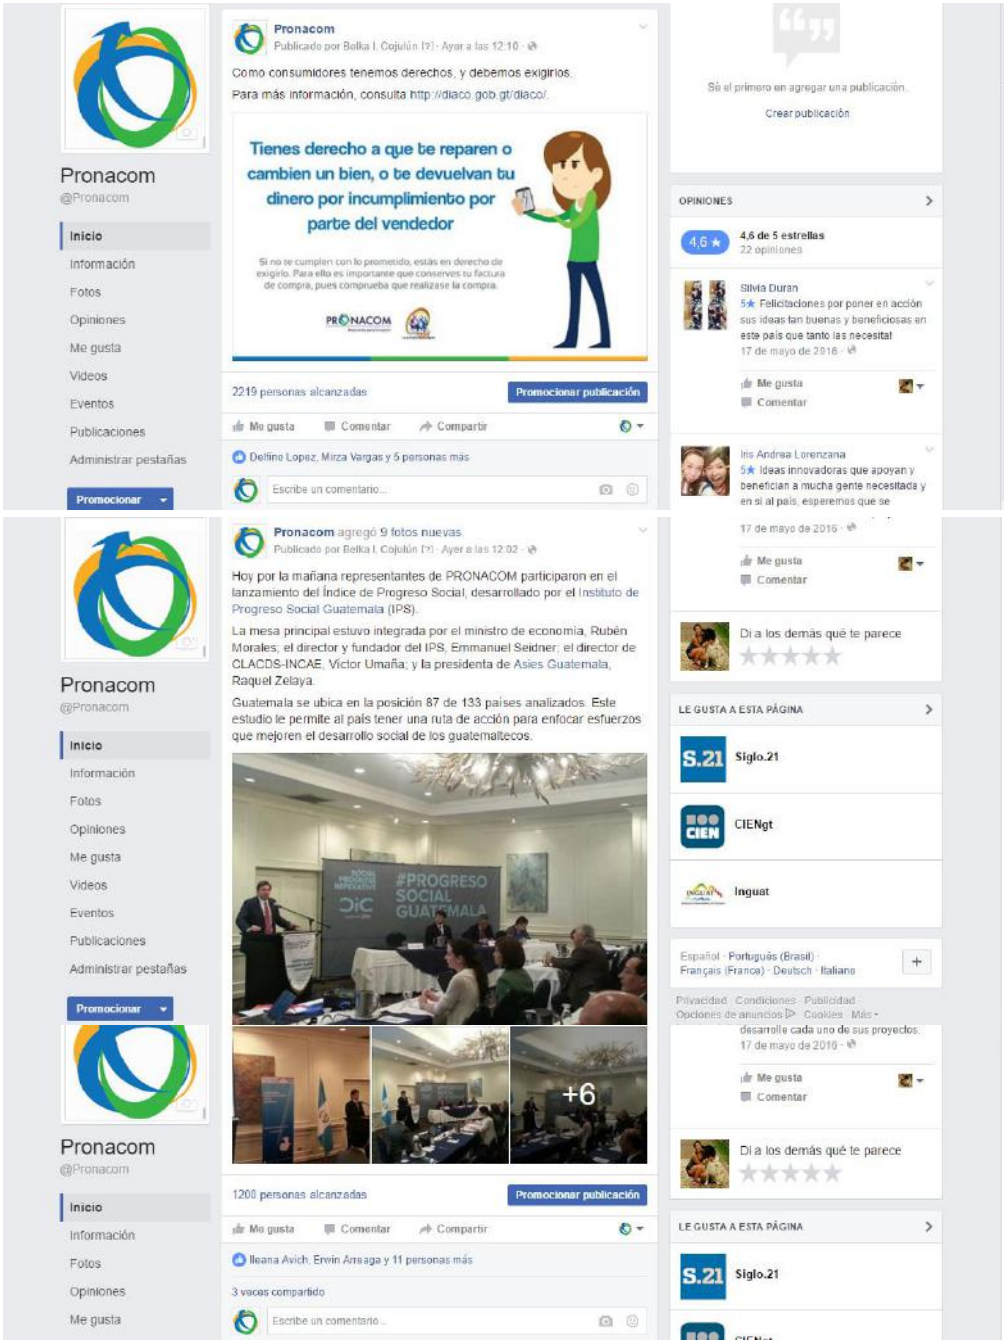
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Promocionar
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · Ayer a las 12:10 ·
Como consumidores tenemos derechos, y debemos exigirlos.
Para más información, consulta http://dlaco.gob.gt/dlaco/.
Tienes derecho a que te reparen o cambien un bien, o te devuelvan tu dinero por incumplimiento por parte del vendedor
Si no te cumplen con lo prometido, estás en derecho de exigirlo. Para ello es importante que conserves tu factura de compra, pues comprueba que realizaste la compra.
PRONACOM
2219 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Delfino Lopez, Mirza Vargas y 5 personas más
Escribe un comentario...
Sé el primero en agregar una publicación.
Crear publicación
OPINIONES
4,6 ★ 4,6 de 5 estrellas
22 opiniones
Silvia Duran
5★ Felicitaciones por poner en acción sus ideas tan buenas y beneficiosas en este país que tanto las necesita!
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta
Comentar
Ins Andrea Lorenzana
5★ Ideas innovadoras que apoyan y benefician a mucha gente necesitada y en si al país, esperemos que se
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Promocionar
Pronacom agregó 9 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · Ayer a las 12:02 ·
Hoy por la mañana representantes de PRONACOM participaron en el lanzamiento del Índice de Progreso Social, desarrollado por el Instituto de Progreso Social Guatemala (IPS).
La mesa principal estuvo integrada por el ministro de economía, Rubén Morales; el director y fundador del IPS, Emmanuel Seidner; el director de CLACDS-INCAE, Víctor Umaña; y la presidenta de Asies Guatemala, Raquel Zelaya.
Guatemala se ubica en la posición 87 de 133 países analizados. Este estudio le permite al país tener una ruta de acción para enfocar esfuerzos que mejoren el desarrollo social de los guatemaltecos.
#PROGRESO SOCIAL GUATEMALA
+6
1200 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Ileana Avich, Ervin Arreaga y 11 personas más
3 veces compartido
Escribe un comentario...
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
S.21 Siglo.21
CIEN CIENgt
Inguat
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios · Cookies · Más
desarrolle cada uno de sus proyectos.
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
S.21 Siglo.21

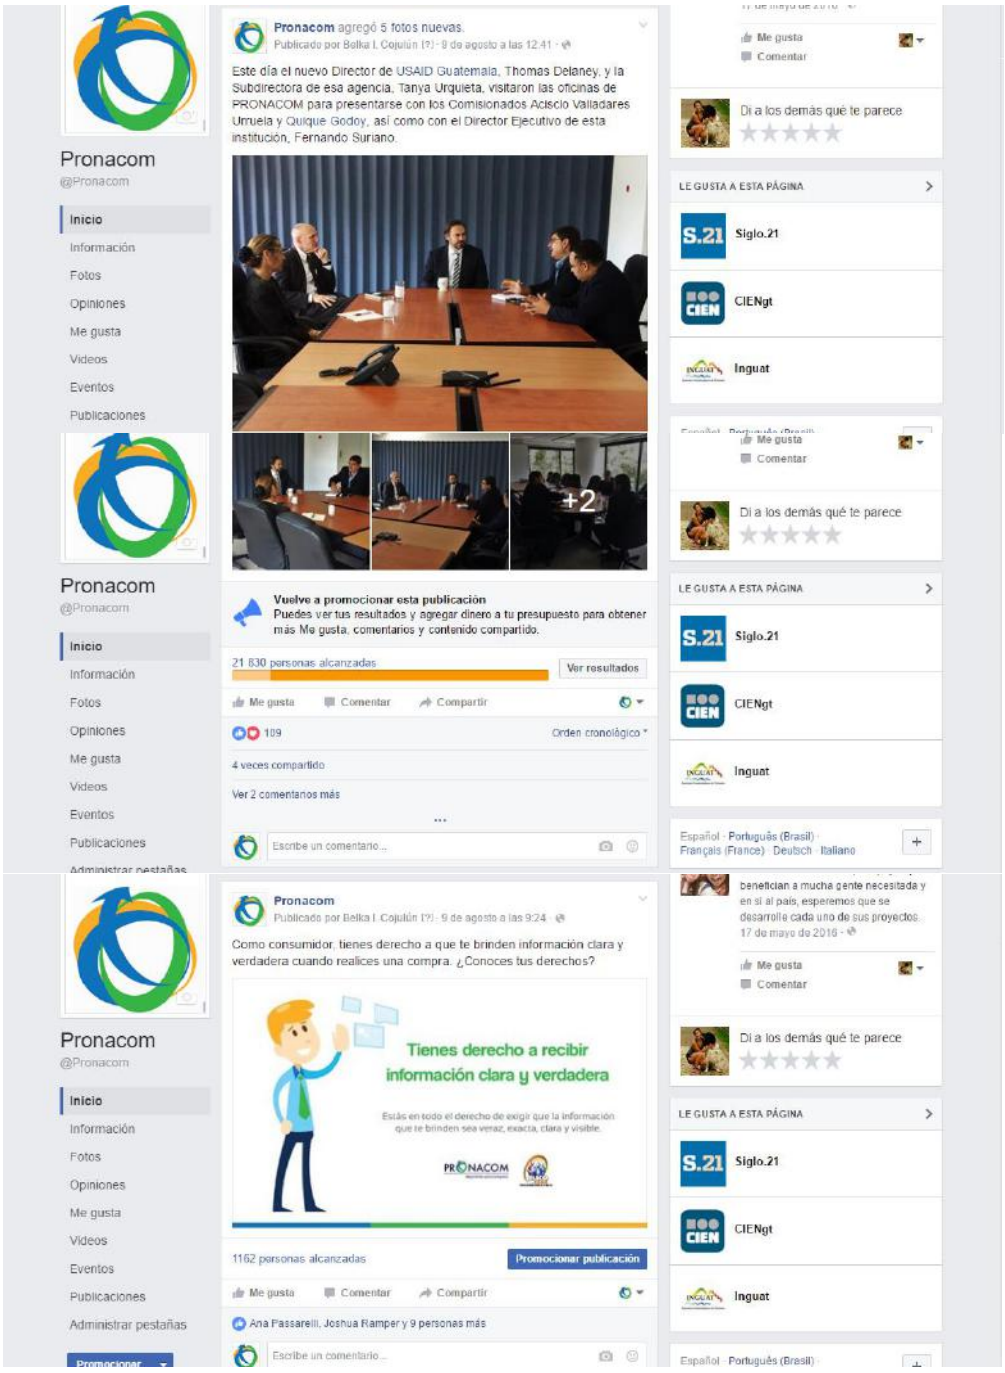
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Pronacom agregó 5 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún (?) · 9 de agosto a las 12:41
Este día el nuevo Director de USAID Guatemala, Thomas Delaney, y la Subdirectora de esa agencia, Tanya Urquieta, visitaron las oficinas de PRONACOM para presentarse con los Comisionados Aciscio Valladares Urruela y Quique Godoy, así como con el Director Ejecutivo de esta institución, Fernando Suriano.
+2
Vuelve a promocionar esta publicación
Puedes ver tus resultados y agregar dinero a tu presupuesto para obtener más Me gusta, comentarios y contenido compartido.
21 830 personas alcanzadas
Ver resultados
Me gusta
Comentar
Compartir
109
Orden cronológico
4 veces compartido
Ver 2 comentarios más
Escribe un comentario...
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
Siglo.21
CIENgt
Inguat
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Administrar pestañas
Como consumidor, tienes derecho a que te brinden información clara y verdadera cuando realices una compra. ¿Conoces tus derechos?
Tienes derecho a recibir información clara y verdadera
Estás en todo el derecho de exigir que la información que te brinden sea veraz, exacta, clara y visible.
PRONACOM
1162 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Ana Passarelli, Joshua Ramper y 9 personas más
benefician a mucha gente necesitada y en si al país, esperemos que se desarrolle cada uno de sus proyectos.
17 de mayo de 2016

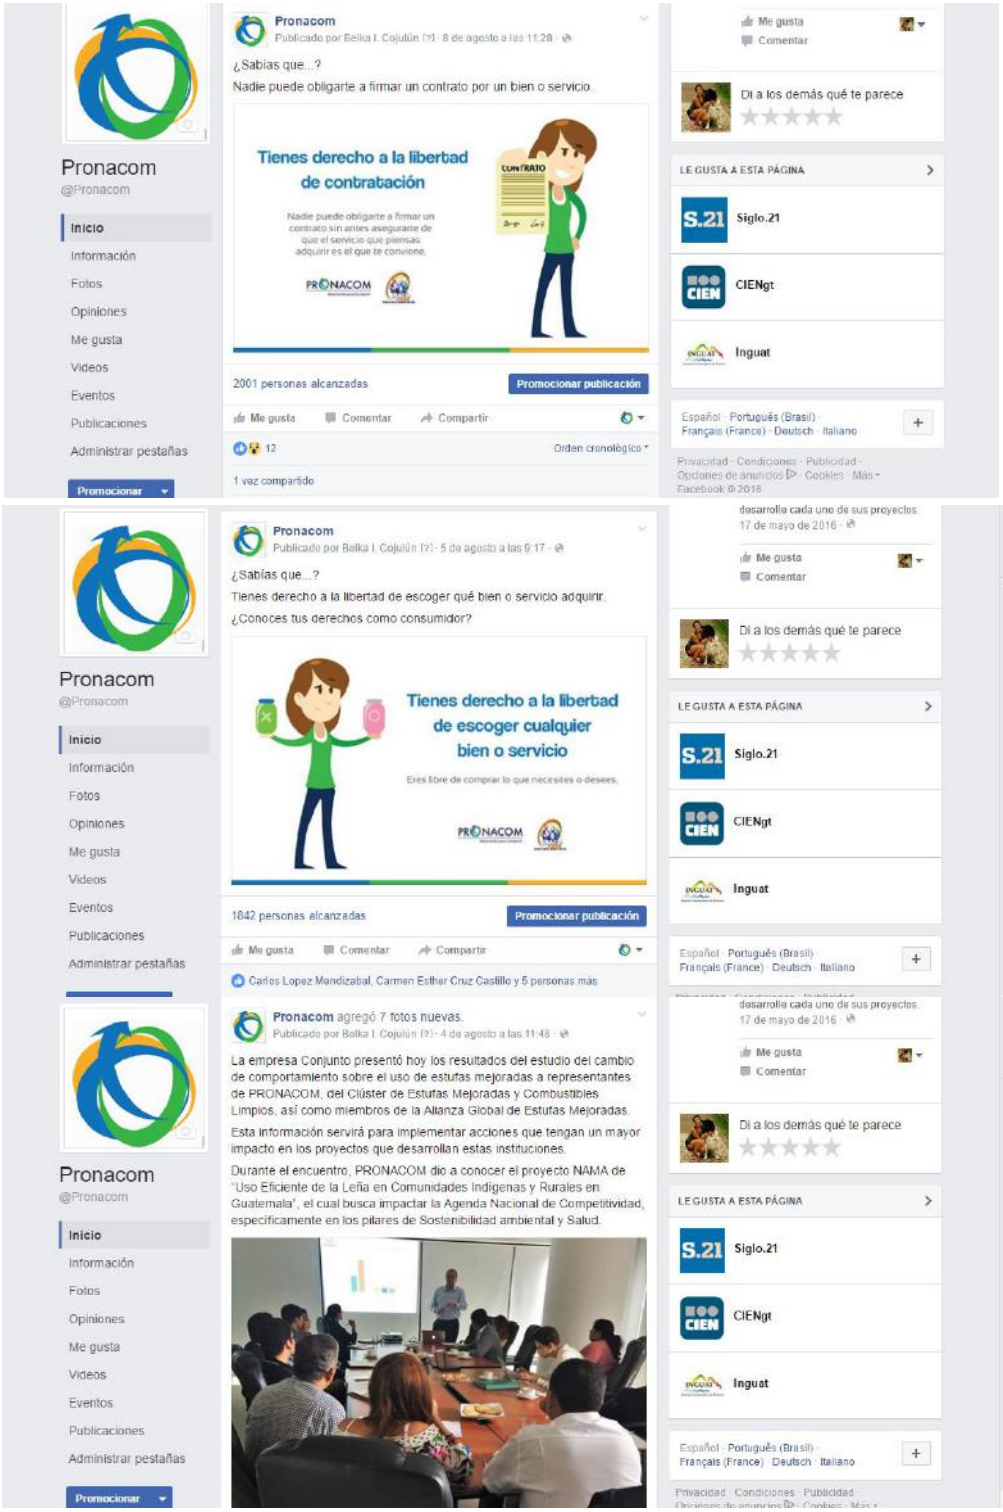
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 8 de agosto a las 11:28 ·
¿Sabías que...?
Nadie puede obligarte a firmar un contrato por un bien o servicio.
Tienes derecho a la libertad de contratación
Nadie puede obligarte a firmar un contrato sin antes asegurarte de que el servicio que piensas adquirir es el que te conviene.
PRONACOM
CONTRATO
2001 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
12
Orden cronológico
1 vez compartido
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Promocionar
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
Siglo.21
CIENgt
Inguat
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios · Cookies · Más · Facebook © 2016
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 5 de agosto a las 9:17 ·
¿Sabías que...?
Tienes derecho a la libertad de escoger qué bien o servicio adquirir.
¿Conoces tus derechos como consumidor?
Tienes derecho a la libertad de escoger cualquier bien o servicio
Eres libre de comprar lo que necesites o desees.
PRONACOM
1842 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Carlos Lopez Mendizabal, Carmen Esther Cruz Castillo y 5 personas más
Pronacom agregó 7 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 4 de agosto a las 11:48 ·
La empresa Conjunto presentó hoy los resultados del estudio del cambio de comportamiento sobre el uso de estufas mejoradas a representantes de PRONACOM, del Clúster de Estufas Mejoradas y Combustibles Limpios, así como miembros de la Alianza Global de Estufas Mejoradas.
Esta información servirá para implementar acciones que tengan un mayor impacto en los proyectos que desarrollan estas instituciones.
Durante el encuentro, PRONACOM dio a conocer el proyecto NAMA de "Uso Eficiente de la Leña en Comunidades Indígenas y Rurales en Guatemala", el cual busca impactar la Agenda Nacional de Competitividad, específicamente en los pilares de Sostenibilidad ambiental y Salud.
desarrolla cada uno de sus proyectos.
17 de mayo de 2016 ·

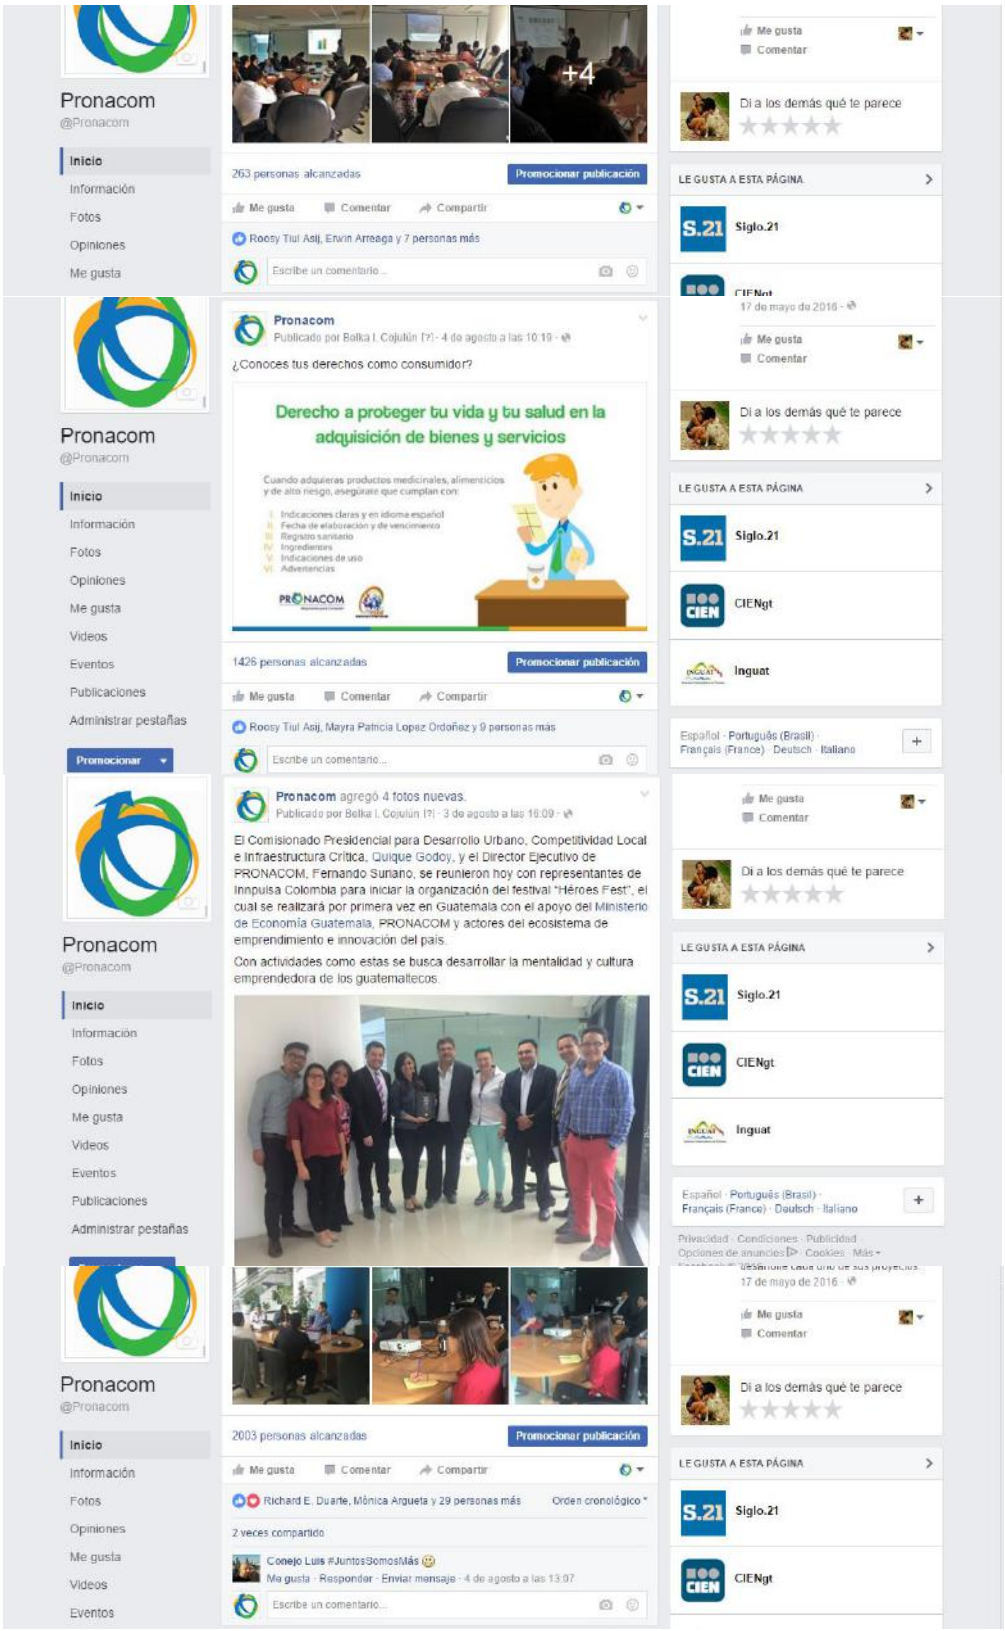
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
263 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta · Comentar · Compartir
Roosy Tiul Asij, Ervin Arreaga y 7 personas más
Escribe un comentario...
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 4 de agosto a las 10:19 ·
¿Conoces tus derechos como consumidor?
Derecho a proteger tu vida y tu salud en la adquisición de bienes y servicios
Cuando adquieras productos medicinales, alimenticios y de alto riesgo, asegúrate que cumplan con:
I. Indicaciones claras y en idioma español
II. Fecha de elaboración y de vencimiento
III. Registro sanitario
IV. Ingredientes
V. Indicaciones de uso
VI. Advertencias
PRONACOM
1426 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Roosy Tiul Asij, Mayra Patricia Lopez Ordoñez y 9 personas más
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Promocionar
Pronacom agregó 4 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 3 de agosto a las 16:09 ·
El Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Quique Godoy, y el Director Ejecutivo de PRONACOM, Fernando Suriano, se reunieron hoy con representantes de Innpulsa Colombia para iniciar la organización del festival "Héroes Fest", el cual se realizará por primera vez en Guatemala con el apoyo del Ministerio de Economía Guatemala, PRONACOM y actores del ecosistema de emprendimiento e innovación del país.
Con actividades como estas se busca desarrollar la mentalidad y cultura emprendedora de los guatemaltecos.
2003 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Richard E. Duarte, Mónica Argueta y 29 personas más
Orden cronológico
2 veces compartido
Conejo Luis #JuntosSomosMás
Me gusta · Responder · Enviar mensaje · 4 de agosto a las 13:07
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
S.21
Siglo.21
CIENgt
Inguat
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios · Cookies · Más
17 de mayo de 2016

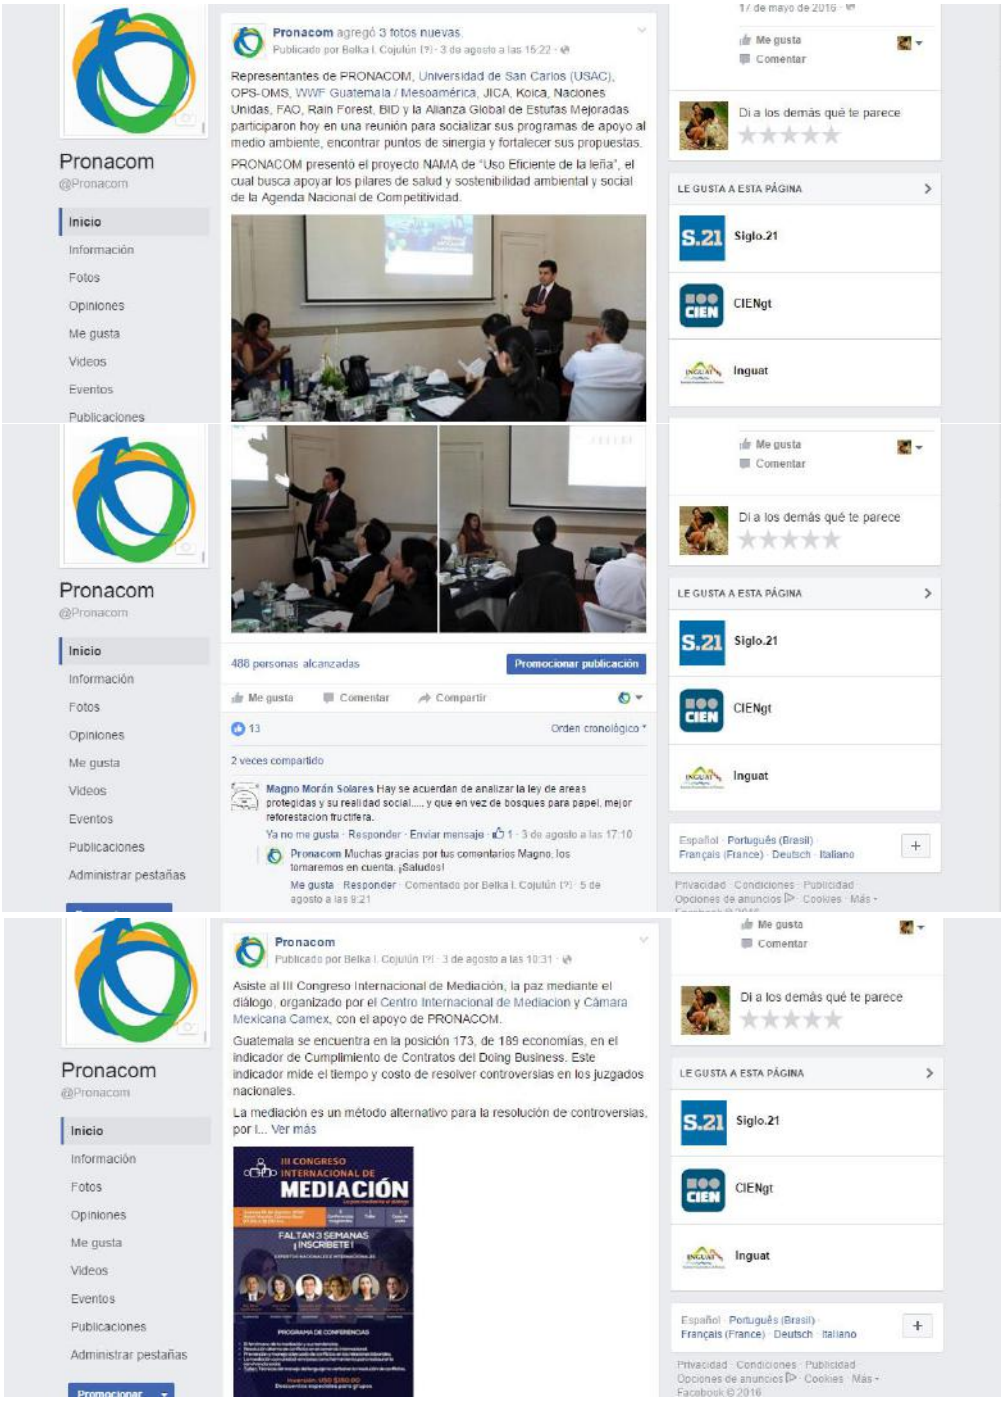
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Pronacom agregó 3 fotos nuevas.
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 3 de agosto a las 15:22 ·
Representantes de PRONACOM, Universidad de San Carlos (USAC), OPS-OMS, WWF Guatemala / Mesoamérica, JICA, Koica, Naciones Unidas, FAO, Rain Forest, BID y la Alianza Global de Estufas Mejoradas participaron hoy en una reunión para socializar sus programas de apoyo al medio ambiente, encontrar puntos de sinergia y fortalecer sus propuestas.
PRONACOM presentó el proyecto NAMA de "Uso Eficiente de la leña", el cual busca apoyar los pilares de salud y sostenibilidad ambiental y social de la Agenda Nacional de Competitividad.
486 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Me gusta
Comentar
Compartir
13
Orden cronológico
2 veces compartido
Magno Morán Solares Hay se acuerdan de analizar la ley de areas protegidas y su realidad social..... y que en vez de bosques para papel, mejor reforestacion fructifera.
Ya no me gusta · Responder · Enviar mensaje · 1 · 3 de agosto a las 17:10
Pronacom Muchas gracias por tus comentarios Magno, los tomaremos en cuenta. ¡Saludos!
Me gusta · Responder · Comentado por Belka I. Cojulún [?] · 5 de agosto a las 9:21
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
Siglo.21
CIENgt
Inguat
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opciones de anuncios · Cookies · Más ·
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 3 de agosto a las 10:31 ·
Asiste al III Congreso Internacional de Mediación, la paz mediante el diálogo, organizado por el Centro Internacional de Mediacion y Cámara Mexicana Camex, con el apoyo de PRONACOM.
Guatemala se encuentra en la posición 173, de 189 economías, en el indicador de Cumplimiento de Contratos del Doing Business. Este indicador mide el tiempo y costo de resolver controversias en los juzgados nacionales.
La mediación es un método alternativo para la resolución de controversias, por l... Ver más
III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN
FALTAN 3 SEMANAS ¡INSCRÍBETE!
PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Facebook © 2016

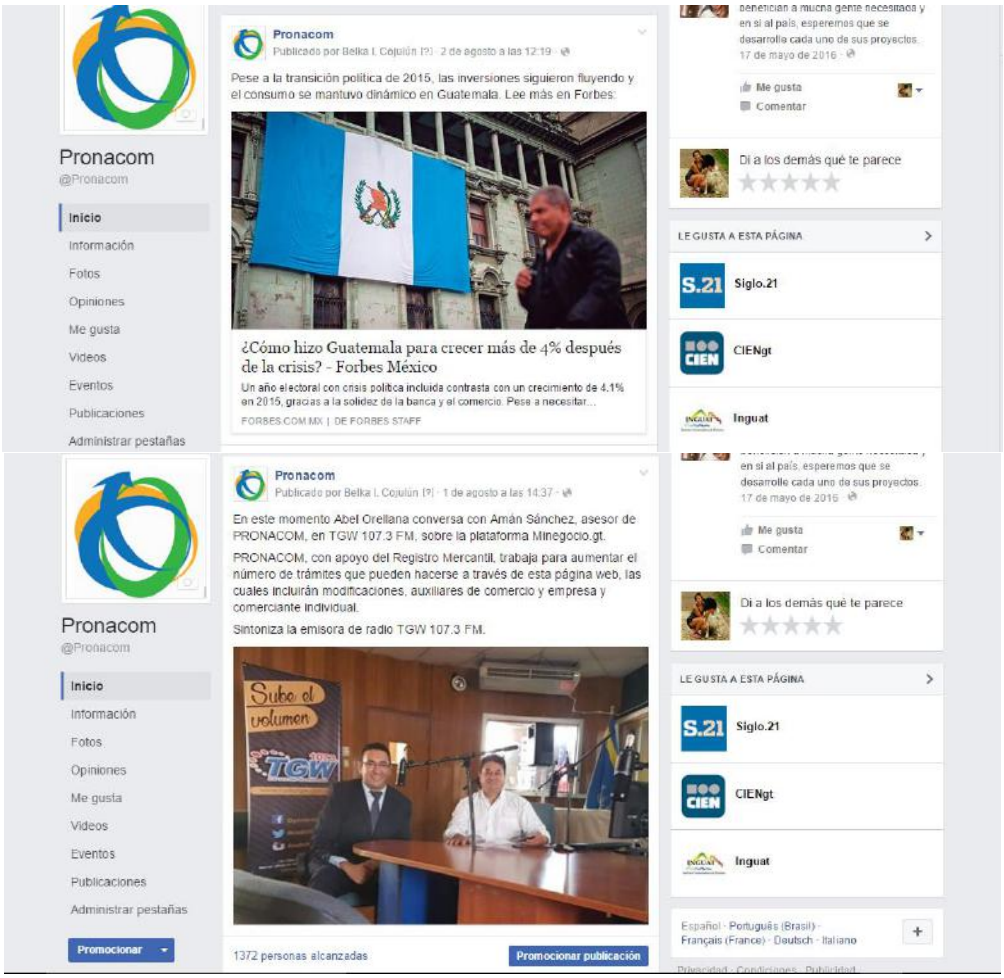
Pronacom
@Pronacom
Inicio
Información
Fotos
Opiniones
Me gusta
Videos
Eventos
Publicaciones
Administrar pestañas
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 2 de agosto a las 12:19 ·
Pese a la transición política de 2015, las inversiones siguieron fluyendo y el consumo se mantuvo dinámico en Guatemala. Lee más en Forbes:
¿Cómo hizo Guatemala para crecer más de 4% después de la crisis? - Forbes México
Un año electoral con crisis política incluida contrasta con un crecimiento de 4.1% en 2015, gracias a la solidez de la banca y el comercio. Pese a necesitar...
FORBES.COM.MX | DE FORBES STAFF
benefician a mucha gente necesitada y en si al país, esperemos que se desarrolle cada uno de sus proyectos.
17 de mayo de 2016 ·
Me gusta
Comentar
Di a los demás qué te parece
LE GUSTA A ESTA PÁGINA
S.21
Siglo.21
CIEN
CIENgt
Inguat
Pronacom
Publicado por Belka I. Cojulún [?] · 1 de agosto a las 14:37 ·
En este momento Abel Orellana conversa con Amán Sánchez, asesor de PRONACOM, en TGW 107.3 FM, sobre la plataforma Minegocio.gt.
PRONACOM, con apoyo del Registro Mercantil, trabaja para aumentar el número de trámites que pueden hacerse a través de esta página web, las cuales incluirán modificaciones, auxiliares de comercio y empresa y comerciante individual.
Sintoniza la emisora de radio TGW 107.3 FM.
Sube el volumen
TGW
1372 personas alcanzadas
Promocionar publicación
Promocionar
Español · Português (Brasil) · Français (France) · Deutsch · Italiano
Privacidad · Condiciones · Publicidad ·

**Twitter**

Inicio
Notificaciones
Mensajes
Buscar en Twitter
Twittear
PRONACOM
Mejorando para Competir
"El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que lo forman".
Camilo Cruz
TWEETS 2.044
SIGUIENDO 493
SEGUIDORES 1.002
ME GUSTA 231
Editar perfil
Pronacom Guatemala
@PRONACOMGT
Programa Nacional de Competitividad. Trabajamos y coordinamos esfuerzos para una Guatemala más próspera.
Guatemala, Guatemala
facebook.com/Pronacom
Se unió en abril de 2013
786 fotos y videos
Tweets
Tweets y respuestas
Medios
Pronacom Guatemala @PRONACOMGT · 6 h
Representantes del sector público y privado se comprometen a implementar el Plan Nacional de #GobiernoAbiertoGt.
Retwitteaste
Ministerio Economía @GUATEMINECO · 8 h
En Petén, Ministro @RMoralesMonroy con Alcalde de Flores, Carlos René Caal, trabajando en la Estrategia #DEL
Retwitteaste
Ministerio Economía @GUATEMINECO · 7 h
Flores, Petén se suma a Estrategia de Dinamización de Economía Local #DEL impulsada por Ministro @RMoralesMonroy
Tú, Canal de Gobierno, Brenda Jiguan y otros 5
A quién seguir · Actualizar · Ver todos
Rodrigo Argueta @rodXL7
Seguir
Dualey Baldizón @DualeyO
Seguir
Oscar Rodas @osrodas007
Seguir
Encontrar amigos
Tendencias · Cambiar
#NiCementoNiGasolina
@CEES_gt, @libertopolis y 3 más están twitteando sobre esto
Kevin Cordón
#RecuperaciónCapacidadFiscal
@DiariodeCA, @NuevoMundoGT y 17 más están twitteando sobre esto
#ReformasJusticiaGT
@EmisorasUnidas está twitteando sobre esto
#ImpuestosGT
@EmisorasUnidas, @CarlaCaballeros y 2 más están twitteando sobre esto
#ManerasDeDecirGordo
3.462 Tweets
#SiPudieraPedirUnDeseo
#CiclismoDePista
#TiroConArco
@Telemundo está twitteando sobre esto
#PorqueMexicoNoGanaMedallas
@CNNEE está twitteando sobre esto

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 7 h
La aplicación de #GobiernoAbiertoGt aumenta la confianza en las instituciones y mejora la competitividad del país.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 7 h
El Plan de #GobiernoAbiertoGt incluye 22 compromisos basados en la transparencia, colaboración y participación.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 7 h
Mesa técnica de alto nivel de Gobierno Abierto validará y aprobará el Plan Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 8 h

¿Pensando en emprender? El 95 % de los negocios que se abren bajo el formato de franquicias tienen éxito.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 1 día

¡Llegamos a 1,000 seguidores! Gracias a todos por su preferencia, ¡sigamos trabajando por una Guatemala más competitiva!

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.

Con apoyo del sector público y privado, Tejiendo Alimentos ha desarrollado colecciones con altos estándares de diseño y calidad.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.

Tejiendo Alimentos es una iniciativa de @GUATEMINECO y PRONACOM. Apoya a poblaciones artesanales de 43 municipios.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.
El equipo de Tejiendo Alimentos se reunió con la Primera Dama para presentar los proyectos de este Programa.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.
El Índice de Progreso Social permitirá enfocar esfuerzos que mejoren el desarrollo social de los guatemaltecos.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.
Guatemala está en la posición 87 de 133 países analizados en el Índice de Progreso Social, presentado por el IPS.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 10 ago.
Como consumidores tenemos derechos, y debemos exigirlos. Para más información consulta diaco.gob.gt/diaco/

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 9 ago.

Como consumidor, tienes derecho a que te brinden información clara y verdadera cuando realices una compra.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 8 ago.

¿Sabías que...? Nadie puede obligarte a firmar un contrato por un bien o servicio.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 5 ago.

¿Sabías que...? Tienes derecho a la libertad de escoger qué bien o servicio adquirir.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.

Este proyecto busca impactar los pilares de Sostenibilidad ambiental y Salud de la Agenda Nacional de Competitividad

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.
PRONACOM dio a conocer el proyecto NAMA de Uso Eficiente de la Leña en Comunidades Indígenas y Rurales en Guatemala.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.
Esta información servirá para implementar acciones que tengan mayor impacto en los proyectos de esas instituciones.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.
Participaron PRONACOM, Clúster de Estufas Mejoradas y Combustibles Limpios y Alianza Global de Estufas Mejoradas.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.
Empresa Conjunto presentó los resultados del estudio de cambio de comportamiento sobre el uso de estufas mejoradas.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 4 ago.
¿Conoces tus derechos como consumidor? Entérate:

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 3 ago.
Asiste al III Congreso Internacional de Mediación, jueves 18 de agosto, hotel Camino Real, de 7:30 a 18:00 horas.

**Pronacom Guatemala** @PRONACOMGT · 2 ago.
Pese a la transición política de 2015, la inversión siguió fluyendo y el consumo se mantuvo dinámico en Guatemala: bit.ly/2ayH4mx

## CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORME

Por este medio hago **CONSTAR** que he recibido y leído el informe abajo indicado de los servicios prestados dentro de la contratación titulada:

***Asesor de Relaciones Públicas e Imagen***
Nombre o título de los servicios de asesoría

Que realizó:

***Dina Alejandra Alburez Marquez***
Nombre de la persona contratada

Como parte de los servicios de asesoría prestados al Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el cual recibo a entera conformidad porque cumplen con los Términos de Referencia del Contrato No.: ***BID 1734/OC-GU-AI-018-2016***

Por lo que se solicita trasladar a donde corresponda para continuar con el proceso respectivo de pago, por la cantidad de: ***Q. 14,000.00***

Se adjunta el Informe No. **5**

Titulado:

***"Informe de avance del plan de trabajo de la asesoría y seguimiento a las acciones de comunicación y divulgación de PRONACOM y el Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva durante el mes de agosto. Acciones de colaboración con medios de comunicación, agencias y otras instituciones relacionadas con competitividad, programas de difusión u otras actividades que formen parte de la estrategia de comunicación, así como en la elaboración y diseño de los materiales necesarios para las presentaciones requeridas por el equipo".***

Impreso en: ***43 hojas***
Cantidad en hojas

**SI**
Indicar si se adjunta en CD

Fecha de entrega del informe: ***31 de agosto de 2016***

**Aprobación del Informe:**

**Firma y sello:**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

No. 87150

ARQUITECTURA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA

**EL INFRASCRITO PROSECRETARIO**
**EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA**
**DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA**

# CERTIFICA

**Que según consta en los registros de los Profesionales Colegiados,**

*LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO, DINA ALEJANDRA ALBUREZ MARQUEZ*

**aparace inscrito con el No.** *G-336* **y goza de los derechos y obligaciones que la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria confiere a los miembros activos de este Colegio.**

**Esta certificación tiene vigencia hasta** *30 DE JUNIO DEL 2017*

**Y para los usos legales que al interesado convenga, se extiende la presente certificación, en la ciudad de Guatemala, el** *6 DE ABRIL DEL 2016*

**Arq. Carlos Mauricio García Arango**
**Colegiado Activo No. 2278**
**Prosecretario Junta Directiva 2011-2013**

**El Colegiado indicado en la presente certificación, firma y sella en constancia de su autenticidad y de la responsabilidad que asume por el uso que pueda dársele.**


0 CALLE 15-70, COLONIA EL MAESTRO, ZONA 15. GUATEMALA, C.A. (01015)
PBX: (502) 2245-2424
administracion@colegiodearquitectosdeguatemala.com
www.colegiodearquitectosdeguatemala.com

**PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

# INFORME AGOSTO 2016

Para: José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo

De: Dina Alejandra Alburez Marquez

Nombre de Asesoría: Asesor de Relaciones Públicas e Imagen

Asunto: INFORME 5

Fecha: 31 de agosto de 2016

**Señor Director:**

De manera atenta y respetuosa, describo las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2016 y los logros obtenidos.

## INFORME 5

Informe de avance del plan de trabajo de la asesoría y seguimiento a las acciones de comunicación y divulgación de PRONACOM y el Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva durante el mes de agosto. Acciones de colaboración con medios de comunicación, agencias y otras instituciones relacionadas con competitividad, programas de difusión u otras actividades que formen parte de la estrategia de comunicación, así como en la elaboración y diseño de los materiales necesarios para las presentaciones requeridas por el equipo.

## ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se colaboró con la redacción y diseño de cinco boletines informativos digitales, con noticias sobre el trabajo semanal del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-. Estos boletines fueron enviados a la base de datos de la institución.

   Esto servirá para dar a conocer los proyectos en los que trabaja actualmente PRONACOM y el Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, así como para reafirmar el compromiso de la institución con la competitividad de Guatemala. (Ver Anexos I)

2. Se trabajó en la elaboración de materiales gráficos para publicar en la fanpage de Facebook y en el Twitter de PRONACOM.

   Los materiales diseñados se enfocaron en datos sobre competitividad de Guatemala, actividades de PRONACOM, competitividad regional y un diseño especial para destacar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

   Esto servirá para atraer la atención de seguidores y fans, de manera que reciban los mensajes más eficientemente. (Ver Anexos II)

3. Se diseñaron materiales de comunicación interna para dar a conocer distintos temas a los colaboradores de PRONACOM.

   Para una mejor convivencia en la oficina, se diseñaron artes para reforzar reglas de convivencia, los cuales se enviaron por correo electrónico a todo el personal. Uno de los mensajes diseñados fue sobre el uso de los sanitarios, para hacer conciencia de mantener la limpieza en esta área.

   Se diseñó el arte para PRONACOMPARTAMOS, actividad realizada para que los colaboradores de PRONACOM compartieran y conocieran al recientemente nombrado Coordinador del Sector Empresarial del Comité Ejecutivo de PRONACOM. Esto sirvió para que el equipo de PRONACOM se integrara.

   Además, se diseñaron notas de duelo, para varios colaboradores de PRONACOM que sufrieron la pérdida de algún familiar durante este mes.

   Esto servirá para mantener al tanto al personal de PRONACOM sobre diferentes temas de interés. (Ver Anexos III)

4. Se adaptaron las propuestas de banners representativos de cada área de trabajo de PRONACOM, los cuales son parte de la animación introductoria del rediseño del sitio web, en la versión para móviles.

   Con esta acción se quiere mantener la imagen de PRONACOM en el sitio web de la institución, visto desde cualquier dispositivo, en base a la nueva imagen aprobada.

   Con esto se continuará con la actualización de la imagen del sitio web, manteniendo una misma línea de diseño. (Ver Anexos IV)

5. Se colaboró con el monitoreo diario de noticias de economía y competitividad, para lo cual se buscaron y destacaron notas relevantes para PRONACOM, y se enviaron por correo electrónico a los colaboradores.

   Entre los medios consultados estuvieron:
   www.soy502.com,
   www.plazapublica.com.gt,
   www.nomada.gt,
   www.republicagt.com,
   www.diariodigital.gt,
   www.dca.gob.gt.

   Esto sirvió para que todos los que trabajan en PRONACOM estén al tanto de las noticias sobre economía y competitividad. (Ver Anexos V)

6. Se rediseñaron varias presentaciones de Power Point, como la de "Criterio de Fijación del Salario Mínimo", y una de PRONACOM, la cual incluyó los distintos proyectos de PRONACOM –Gobernanza, ANC, territorios, Préstamo 1734 BID, adquisiciones y contrataciones-, las cuales fueron utilizadas en diferentes reuniones que ofrecen los asesores de PRONACOM.

   Esto sirvió para estandarizar la línea gráfica del material utilizado, haciendo que sean visualmente más atractivas y con presencia institucional. (Ver Anexos VI)

7. Se colaboró con la toma de fotografías de distintas reuniones en las que participaron asesores de PRONACOM, para darles cobertura en las redes sociales de la institución.

   Esto servirá para dar a conocer las distintas actividades en las que participan miembros de PRONACOM, principalmente dentro del Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva. (Ver Anexos VII)

8. Se rediseñaron las firmas electrónicas para todos los integrantes del equipo de PRONACOM.

   Esto servirá para unificar los correos y material digital de cada una de las personas que forman parte del equipo de PRONACOM.

9. Se realizaron diseños para felicitar a los cumpleañeros periodistas del mes.

Esto servirá para estrechar los lazos de PRONACOM con los medios de comunicación. (Ver Anexos VIII)

10. Se realizaron materiales gráficos para la Segunda Reunión de Consejo Asesor 2016, entre los que estuvieron el *Save the Date*, la invitación y la agenda.

    Durante este evento se dio a conocer la actualización de la Agenda Nacional de Competitividad (ANC), la Política Económica 2016-2021 y la nueva imagen del sitio web.

    Con el apoyo brindado se logró que los invitados a esta reunión reservaran la fecha en sus agendas, y que asistieran al evento. Además, sirvió para unificar la imagen de PRONACOM. (Ver Anexos IX)

## LOGROS OBTENIDOS

1. Con la elaboración y difusión del boletín semanal de PRONACOM se logró dar a conocer el trabajo que realiza la organización, sus avances y las alianzas estratégicas de la institución. Estas publicaciones resaltaron el mensaje que PRONACOM busca impulsar acciones y políticas que mejoren las condiciones para la inversión productiva en el país.

2. El diseño de materiales para las publicaciones de redes sociales y página web de PRONACOM logró informar a los fans, seguidores y visitantes sobre el trabajo que realiza la institución. Estos diseños resaltaron que PRONACOM impulsa acciones y políticas que mejoran la competitividad del país, lo cual forma parte del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.

3. Con la toma de fotografías y su difusión en redes sociales, se logró dar a conocer el trabajo que realiza PRONACOM, sus avances y las alianzas estratégicas. Estas publicaciones resaltaron el mensaje que PRONACOM busca impulsar acciones y políticas que mejoran las condiciones para la inversión productiva en el país.

4. Con el monitoreo diario de medios de comunicación digital se logró dar a conocer a los asesores de PRONACOM las noticias sobre economía y competitividad de Guatemala. De esta manera se logró que los asesores de PRONACOM estuvieran siempre informados de la cobertura noticiosa de temas de interés para la institución.

**Dina Alejandra Alburez Marquez**

**Aprobado por:**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

# ANEXOS I

## (boletines de agosto)

Semana del 1 al 7 de agosto de 2016

View this email in your browser

GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

PRONACOM
Mejorando para Competir

# GUATE+ COMPETITIVA

## Delegación de MCC visita Guatemala

La semana pasada el **Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-** recibió a una delegación de la **Millennium Challenge Corporation -MCC-**, encabezada por la Vicepresidenta del Departamento de Políticas y Evaluación de esta agencia, Beth Tritter.

El objetivo de esta visita fue presentar al Presidente de la República, Jimmy Morales, Ministros de la cartera de Educación, Finanzas, Trabajo y otros socios clave, los alcances del ***Programa Umbral*** y los avances realizados para el inicio de su implementación.

## OTRAS NOTICIAS

## Gira de trabajo a Ixcán y Cobán

El 28 de julio el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Acisclo Valladares Urruela, presentó el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte a los alcaldes del departamento de Quiché, en el salón municipal de Ixcán.

Posteriormente, el Comisionado participó en

realizados para el inicio de su implementación.

El ***Programa Umbral Guatemala*** busca apoyar las reformas impulsadas por el Gobierno para mejorar la calidad del nivel de educación media y formación para el trabajo, e incrementar los ingresos fiscales que permitan al Gobierno abordar las restricciones al crecimiento económico.

Las instituciones involucradas son el **Ministerio de Educación**, la **Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-**, la **Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-** y el **Ministerio de Finanzas Públicas**.

*Información: Belka Cojulún / PRONACOM*

## Convenio para inspecciones conjuntas

El 26 de julio se firmó el Convenio para las Inspecciones Conjuntas, entre la **Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-**, el **Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-** y el **Ministerio de Gobernación Guatemala**.

*"Para el sistema portuario, aeroportuario, terrestre y logístico de Guatemala, la suscripción de este Convenio significa un paso más en la agilización y eficiencia de los procesos de inspección para las mercancías"*, comentó Enrique Godoy, Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, en su

Posteriormente, el Comisionado participó en el III Encuentro de Gobernadores, en Cobán, Alta Verapaz, donde también expuso el objetivo de este Plan, el cual es generar oportunidades económicas para los ciudadanos, con el fin de mitigar el fenómeno migratorio.

*Información: Rodrigo Méndez / PRONACOM*

## Asesoran diseños para Fashion Week de Vancouver

El equipo de trabajo del **Programa Tejiendo Alimentos**, del **Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa**, viajó el pasado 26 de julio a San Juan Comalapa, Chimaltenango, con las diseñadoras Patti Carpenter, de Nueva York, y Emma Gutiérrez, de Guatemala, para asesorar la colección de accesorios de moda que las artesanas de este Programa presentarán en la ***Fashion Week de Vancouver***, Canadá, en septiembre de este año.

El ***Fashion Week de Vancouver*** es uno de los shows de moda más grandes y con mayor crecimiento de Norte América, además cuenta con una reputación global donde se celebra la creatividad y talento, proveniente de todas partes del mundo.

Competitividad Local e Infraestructura Crítica, en su intervención durante el evento.

Este Convenio contribuirá a la transparencia y a la reducción de tiempos y costos, por lo que tendrá un impacto positivo en la facilitación al comercio y en la mejora de la competitividad. Impactará el indicador de ***Comercio Transfronterizo del Doing Business***, en el que Guatemala ha subido tres posiciones en la última edición (del puesto 81 pasó al 78).

*Información: Belka Cojulún / PRONACOM*

## Ministerio de Economía presenta resultados

El miércoles pasado el Ministro de Economía, Rubén Morales Monroy, presentó los principales logros de la actual administración del Ministerio de Economía, junto a los Viceministros de esa cartera y al Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Quique Godoy.

Los resultados publicados son producto de acciones definidas en la propuesta de ***Política Económica 2016-2021***, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico incluyente y sostenible, mediante la generación de una economía territorial, innovadora y global.

Una de esas acciones ha sido el trabajo de **PRONACOM** para coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados para actualizar e implementar la ***Agenda Nacional de***

proveniente de todas partes del mundo.

*Información: Silvia Moreira / Tejiendo Alimentos*

### Foro Innovacción Guatemala 2016

Esta semana se llevará a cabo la **5ª Edición del Foro Innovación**, que busca reforzar la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, (RED I+D+i), de la cual PRONACOM es miembro, para ampliar la alianza entre la academia y la industria, con el fin de mejorar la capacidad de competir en mercados internacionales, así como asegurar empleos de calidad.

**FECHA:** 3 y 4 de agosto de 2016

**LUGAR:** Hotel Westin Camino Real,
Centro de Convenciones
14 calle 0-20 zona 10

**COSTO:** FULL ACCESS PASS Q.600.00

**PARA MAYOR INFORMACIÓN:**

## Ministerio de Economía presenta resultados

El miércoles pasado el Ministro de Economía, Rubén Morales Monroy, presentó los principales logros de la actual administración del Ministerio de Economía, junto a los Viceministros de esa cartera y al Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Quique Godoy.

Los resultados publicados son producto de acciones definidas en la propuesta de ***Política Económica 2016-2021***, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico incluyente y sostenible, mediante la generación de una economía territorial, innovadora y global.

Una de esas acciones ha sido el trabajo de **PRONACOM** para coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados para actualizar e implementar la ***Agenda Nacional de Competitividad***, explicó Godoy.

Por otra parte, el Comisionado también resaltó que la agencia internacional Moody's elevó la perspectiva de Guatemala, de Ba1 negativa a Ba1 estable, gracias al trabajo de las instituciones que conforman la Mesa Calificación País.

*Información: Belka Cojulún / PRONACOM*

### Foro Innovacción Guatemala 2016

Esta semana se llevará a cabo la **5ª Edición del Foro Innovación**, que busca reforzar la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, (RED I+D+i), de la cual PRONACOM es miembro, para ampliar la alianza entre la academia y la industria, con el fin de mejorar la capacidad de competir en mercados internacionales, así como asegurar empleos de calidad.

**FECHA:** 3 y 4 de agosto de 2016

**LUGAR:** Hotel Westin Camino Real,
Centro de Convenciones
14 calle 0-20 zona 10

**COSTO:** FULL ACCESS PASS Q.600.00

**PARA MAYOR INFORMACIÓN:**
Alicia Joge

**Teléfono:**
2422-3624

**Correo Electrónico:**
comisiondealimentos@agexport.org.gt

**Facebook** **Twitter** **E-mail**

**Programa Nacional de Competitividad**
**-PRONACOM-**

desinscribirse de esta lista

**Guatemala, Guatemala**
**Boletín 71 - Año 3 - Agosto 2016**

Semana del 8 al 14 de agosto de 2016

View this email in your browser

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

PRONACOM
Mejorando para Competir

# GUATE+ COMPETITIVA

## Festival Héroes Fest se realizará en Guatemala

El miércoles pasado, el Comisionado Presidencial para Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, y el Director Ejecutivo de PRONACOM, Fernando Suriano, se reunieron con representantes de *INNpulsa Colombia*, una unidad de gestión de crecimiento empresarial del Gobierno colombiano.

*INNpulsa Colombia* promueve la organización del festival ***"Héroes Fest"***, el cual se realizará por primera vez en Guatemala con el apoyo del Ministerio de

OTRAS NOTICIAS

## Visita de USAID

Este lunes el Director de *USAID Guatemala*, Thomas Delaney, y la Subdirectora, Tanya Urquieta, visitaron las oficinas de PRONACOM para presentarse con los Coordinadores del Comité Ejecutivo de PRONACOM, Acisclo Valladares Urruela y Enrique Godoy, así como con el Director Ejecutivo, Fernando Suriano.

*INNpulsa Colombia* promueve la organización del festival ***"Héroes Fest"***, el cual se realizará por primera vez en Guatemala con el apoyo del Ministerio de Economía, PRONACOM y actores del ecosistema de emprendimiento e innovación del país, cuyo objetivo es desarrollar la mentalidad y cultura emprendedora de los guatemaltecos.

*Información: Andrés Carranza / PRONACOM*

## Uso eficiente de la leña en Guatemala

La empresa *Conjunto* presentó la semana pasada los resultados del estudio del cambio de comportamiento sobre el uso de estufas mejoradas, a representantes de PRONACOM, del *Clúster de Estufas Mejoradas y Combustibles Limpios*, así como a miembros de la *Alianza Global de Estufas Mejoradas*.

Esta información servirá para implementar acciones que tengan un mayor impacto en los proyectos que desarrollan estas instituciones.

Durante el encuentro, PRONACOM dio a conocer el proyecto *NAMA de "Uso Eficiente de la Leña en Comunidades Indígenas y Rurales en Guatemala"*, el cual busca impactar la *Agenda Nacional de Competitividad*, específicamente en los pilares de Sostenibilidad ambiental y Salud.

*Información: Luis Carlos Orellana / PRONACOM*



PRONACOM, Acisclo Valladares Urruela y Enrique Godoy, así como con el Director Ejecutivo, Fernando Suriano.

Durante este encuentro, las autoridades de PRONACOM compartieron los proyectos que trabajan para mejorar la educación y el acceso a trabajo, como la *Agenda Nacional de Competitividad*, el *Plan de la Alianza para la Prosperidad* y el *Programa Umbral de la Millennium Challenge Corporation*.

*Información: Fernando Suriano / PRONACOM*

**Congreso Internacional de Mediación**
***"La paz mediante el diálogo"***

Asista al *III Congreso Internacional de Mediación*, la paz mediante el diálogo, organizado por el

*Información: Luis Carlos Orellana / PRONACOM*

## Simplificación del registro sanitario de alimentos

El pasado 5 de agosto asesores de PRONACOM, junto con integrantes de la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- y de la Asociación del Desarrollo Lácteo -ASODEL-, dieron seguimiento a la mesa de trabajo que busca la simplificación del proceso de registro sanitario de alimentos.

En dicha reunión se unificaron las propuestas de AGEXPORT y PRONACOM, para presentarlas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y de esta manera empezar la implementación de la misma.

*Información: Juan Andrés Valladares / PRONACOM*

## Congreso Internacional de Mediación
***"La paz mediante el diálogo"***

Asista al *III Congreso Internacional de Mediación*, la paz mediante el diálogo, organizado por el Centro Internacional de Mediación y Cámara Mexicana Camex, con apoyo de PRONACOM.

Guatemala se encuentra actualmente en la posición 173, de 189 economías, en el indicador de *Cumplimiento de Contratos* del *Doing Business*. Este indicador mide el tiempo y costo de resolver controversias en los juzgados nacionales.

La mediación es un método alternativo para la resolución de controversias, por lo que su uso puede evitar que los conflictos lleguen al sistema judicial, lo cual reduce tiempo y costo a las partes involucradas.

**Fecha:** Jueves 18 de agosto de 2016

**Lugar:** Hotel Westin Camino Real,
14 calle 0-20 zona 10

**Hora:** 7:30 A 18:00 horas

**Costo:** $150.00

**Para mayor información, consulte:**
www.cim.org.gt

**Teléfonos:**
(502) 2363-6574, 2363-6175, 2366-9463

**Correo Electrónico:**
programasacademicos@facinter.com.gt

Facebook Twitter E-mail

**Programa Nacional de Competitividad**
**-PRONACOM-**

desinscribirse de esta lista

# ANEXOS II

## (redes PRONACOM)

## - facebook / twitter -

PRONACOM
Mejorando para Competir
"Debes realizar por lo menos
un movimiento diario, que te acerque un
poco más a tu meta."
Bruce Lee

PRONACOM
Mejorando para Competir
"El éxito de una empresa
es simplemente el reflejo de la actitud,
grado de motivación y compromiso
de las personas que lo forman".
Camilo Cruz

**Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-018-2016**
**Renglón de contratación 081 Fuente 52**

# ANEXOS III

## (comunicación interna)

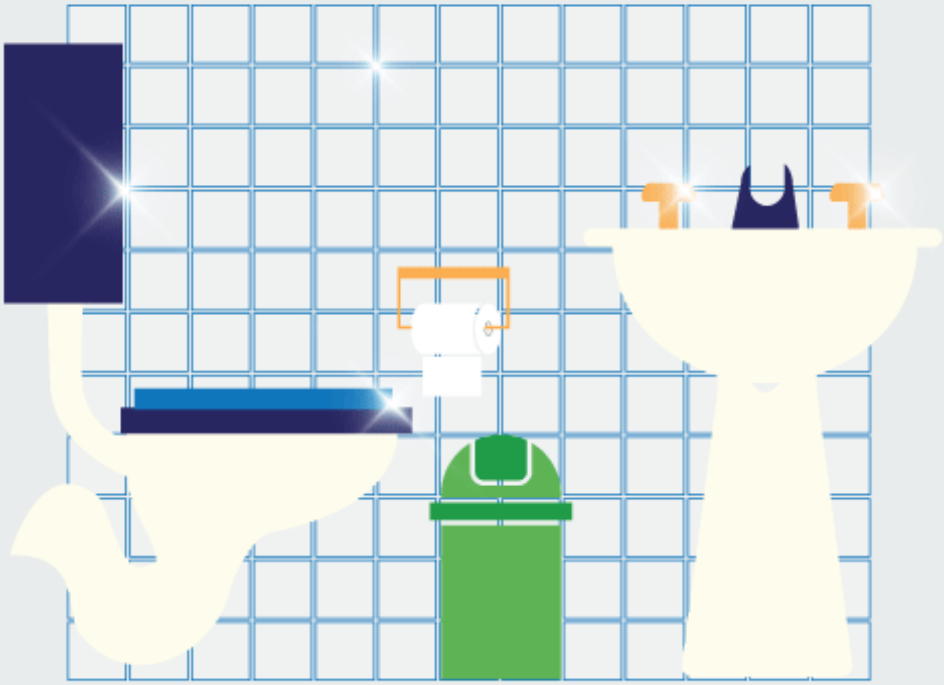

# UN BAÑO LIMPIO
## HABLA BIEN
## DE QUIEN LO USA.

**Por favor déjelo como**
**le gustaría encontrarlo.**

Las oficinas de PRONACOM e INVEST IN GUATEMALA permanecerán abiertas de 7:00 a 17:00 horas (con servicio de cafetería, únicamente para reuniones). Las salas de reuniones deberán ser solicitadas con anticipación, vía correo electrónico a la recepción, según reglamento de uso de salas. El aire acondicionado cuenta con una programación de temperatura y tiempo, actualmente funciona de 8:30 a 17:30 horas. Para dudas o ampliación de información referirse a ADMINISTRACIÓN.

Invest In Guatemala
BUSINESS CENTRAL AMERICA

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

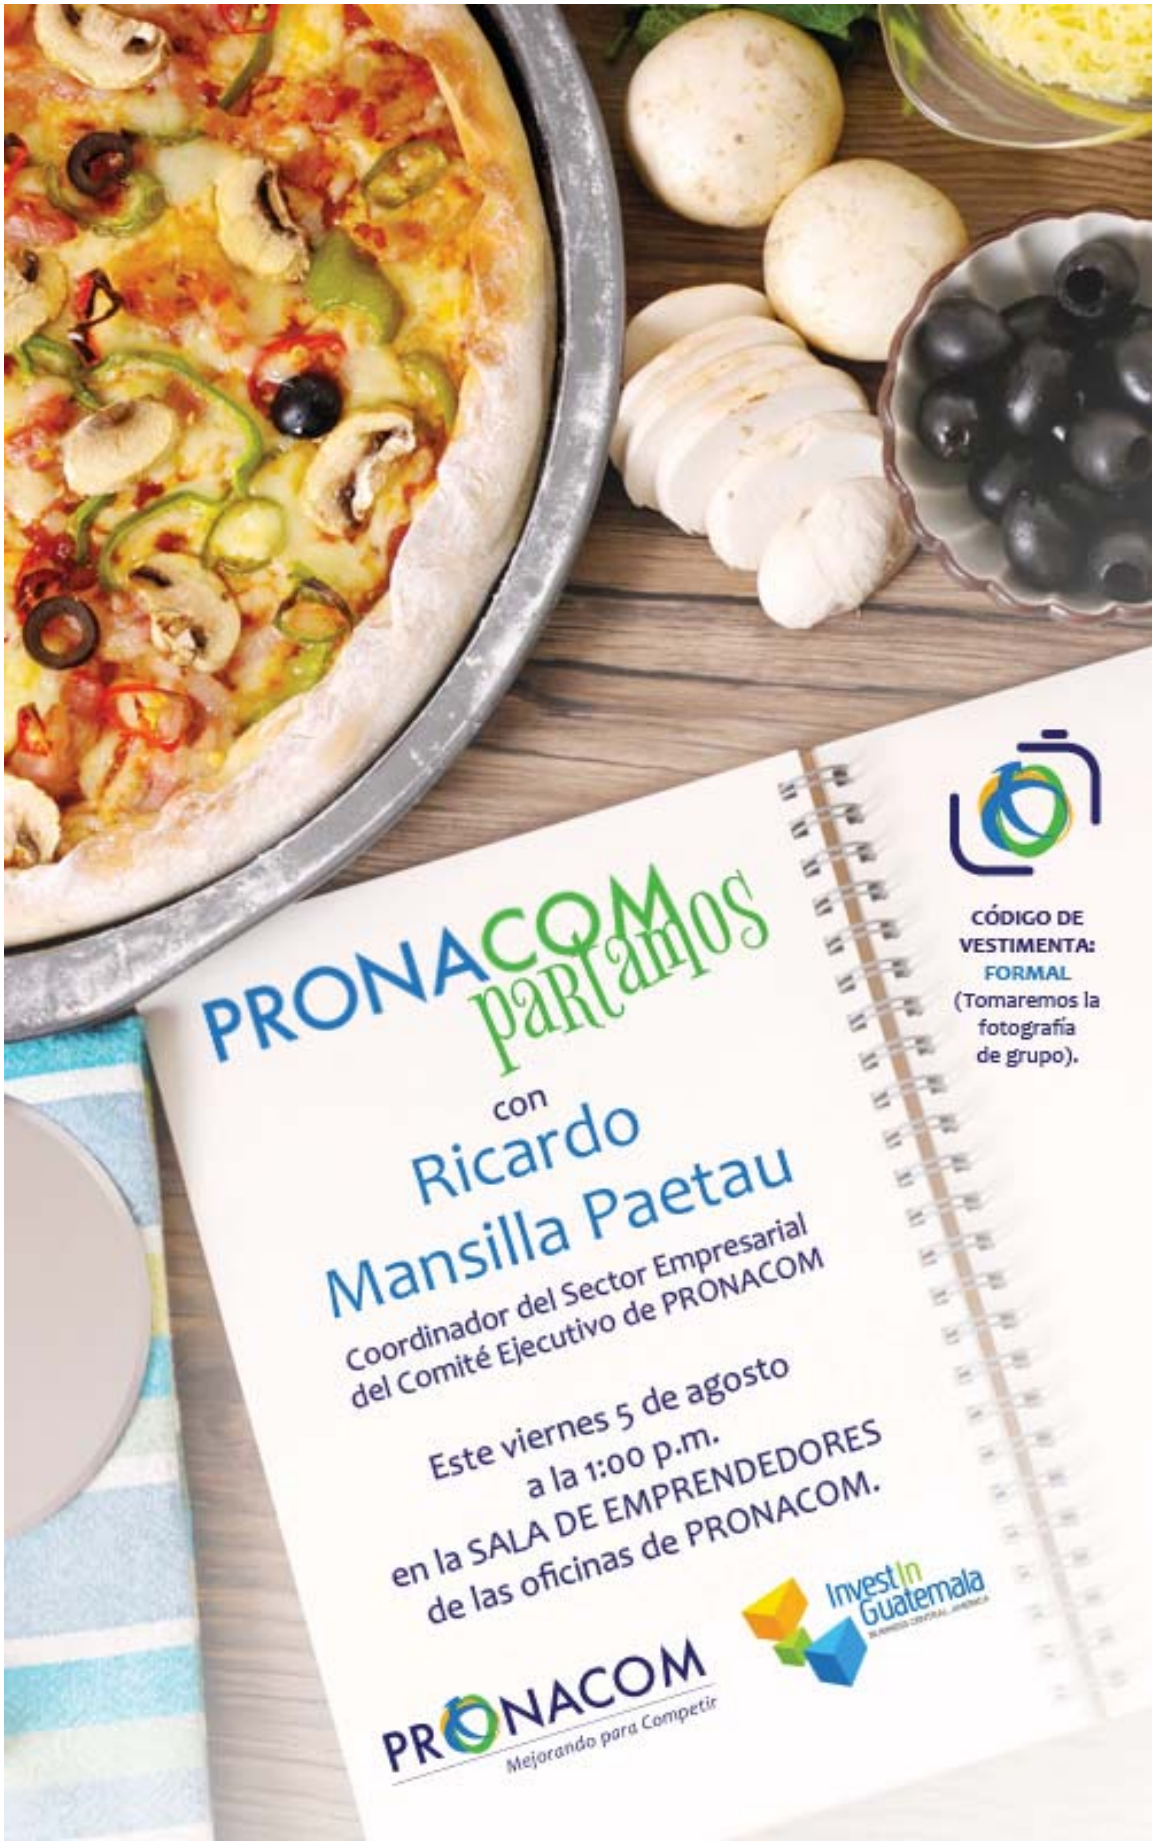
PRONACOM
Parlamos
con
Ricardo
Mansilla Paetau
Coordinador del Sector Empresarial
del Comité Ejecutivo de PRONACOM
Este viernes 5 de agosto
a la 1:00 p.m.
en la SALA DE EMPRENDEDORES
de las oficinas de PRONACOM.
CÓDIGO DE VESTIMENTA:
FORMAL
(Tomaremos la fotografía de grupo).
PRONACOM
Mejorando para Competir
InvestIn Guatemala

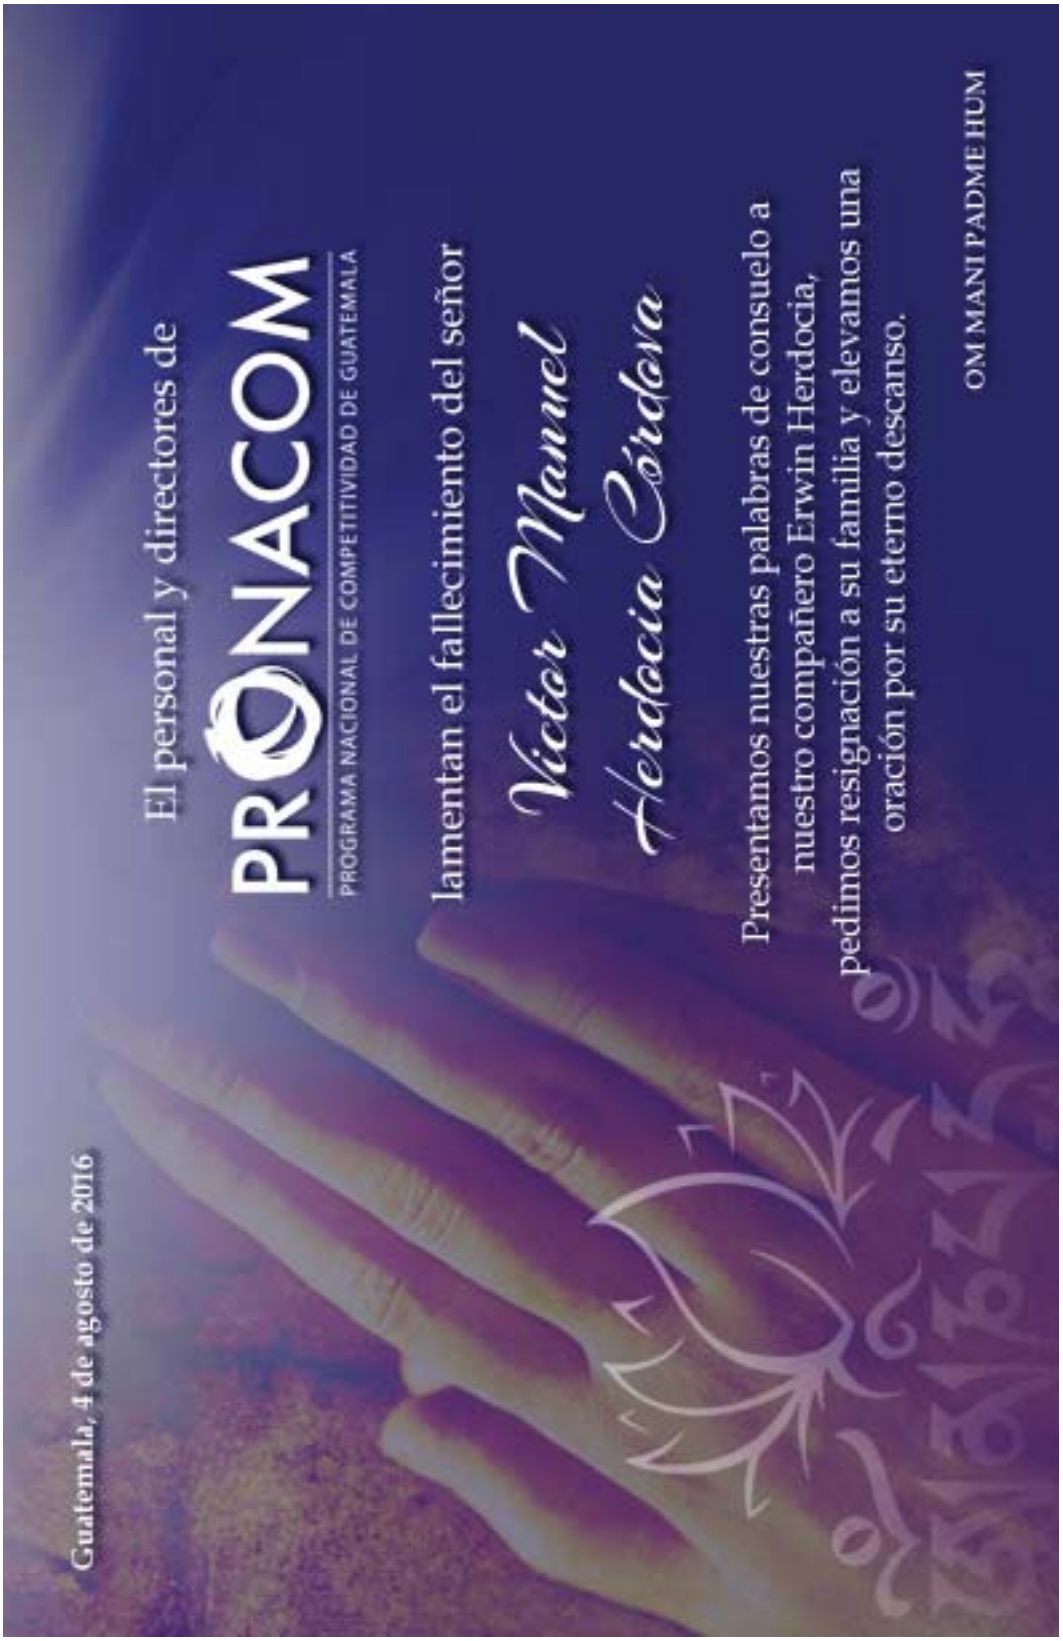
El personal y directores de
PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA
lamentan el fallecimiento del señor
Víctor Manuel
Herdocia Córdova
Presentamos nuestras palabras de consuelo a
nuestro compañero Erwin Herdocia,
pedimos resignación a su familia y elevamos una
oración por su eterno descanso.
OM MANI PADME HUM
Guatemala, 4 de agosto de 2016

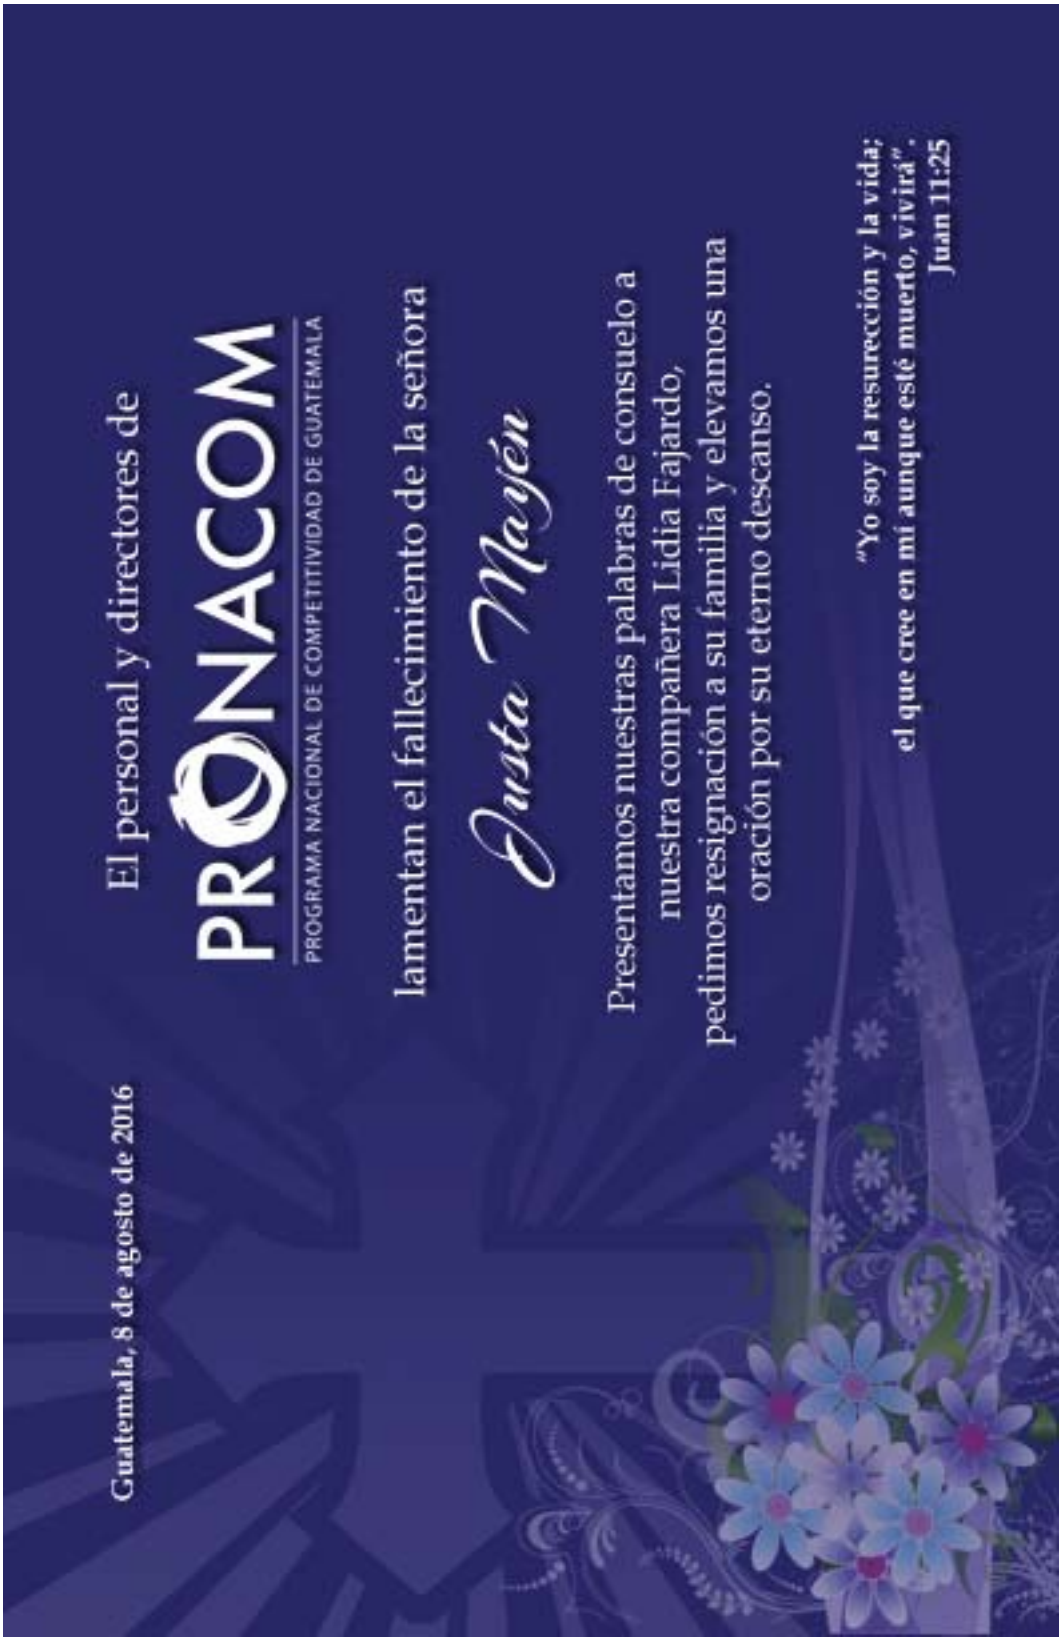
El personal y directores de
PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA
lamentan el fallecimiento de la señora
Oxata Mayén
Presentamos nuestras palabras de consuelo a nuestra compañera Lidia Fajardo, pedimos resignación a su familia y elevamos una oración por su eterno descanso.
"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá".
Juan 11:25
Guatemala, 8 de agosto de 2016

# ANEXOS IV

## (adaptación de banners)

## PRONACOM

*Mejorando para Competir*

Programa nacional participativo facilitador de los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre el sector público, privado, sociedad civil y academia, para hacer de Guatemala un país competitivo.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

## POSICIONAMIENTOS DE PAÍS

Cuatro posicionamientos estratégicos: ser un Centro Logístico Internacional, un Destino Turístico Internacional, un Centro Energético Mesoamericano y una Plataforma Exportadora de Bienes y Servicios.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

## AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

Es una política de país que busca generar desarrollo, calidad de vida, propiciar crecimiento económico y equitativo. Está enmarcada en los cuatro posicionamientos de país, bajo cinco sectores priorizados.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

## PROGRAMA DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Busca apoyar los esfuerzos del Gobierno por continuar los niveles de productividad de la economía, en general, y de las empresas, especialmente los de las micro, pequeña y medianas.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

## PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, a través de la creación de oportunidades económicas que mitiguen la migración.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA

## MCC

Busca apoyar las reformas impulsadas por el Gobierno para mejorar la calidad y relevancia del nivel de educación media, así como incrementar los ingresos fiscales.

VER MÁS INFORMACIÓN >>

MESAS DE COMPETITIVIDAD
Instancias de coordinación público - privadas para coordinar, promocionar e impulsar la competitividad, el desarrollo económico y las políticas económico - productivas de un territorio determinado.
VER MÁS INFORMACIÓN >>

TEJIENDO ALIMENTOS
A través de servicios de apoyo en producción y comercialización artesanal, busca generar empleos que incrementen los ingresos familiares a sus beneficiarios.
VER MÁS INFORMACIÓN >>

# ANEXOS V

## (monitoreo diario de noticias)

PRONACOM
Mejorando para Competir

Correo ▾ | Más ▾ | 1 de 1.332

REDACTAR

Recibidos
Destacados
Enviados
Borradores
Más ▾

Buscar contactos...
Belka Cojulun
Adepalma Palma
Adepalma Palma
Luis Gonzalez
Luis Gonzalez
Sofia Medina
Todos
Vlad
Vladimir Orellana
Wicho Tokoyami

## MONITOREO JUEVES 11 DE AGOSTO

Recibidos x

**Dina Alburez** <dalburez@pronacom.org> 9:33 (hace 1 hora)
para Todos

Usuarios (2)

Belka Cojulun
bcojulun@pronacom.org
Mostrar detalles

Buenos días, espero que estén bien.

Les comparto el monitoreo de hoy realizado para el CACIF.

Además, les comparto estos links que podrían ser de su interés:

**ECONOMÍA**
http://www.republicagt.com/economia/guatemala-se-encuentra-estancada-en-el-progreso-social/

**LEY DE COMPETENCIA**
http://diariodigital.gt/2016/08/paraprincipiantes-la-competencia-mercado/

**ÁMBITO EMPRESARIAL**
http://www.dca.gob.gt/index.php/categoryblog-2/item/47206-fortalecen-red-global-de-empresarios-ind%C3%ADgenas

¡Espero que les sea de utilidad!

Saludos

--

**Dina Alejandra Alburez Marquez**
Asesor de Relaciones Públicas e Imagen
Tel. +502 2421-2464 Ext. 114
dalburez@pronacom.org
13 Calle 3-40 Zona 10 Edificio Atlantis
Tercer Nivel, Guatemala, Guatemala
PRONACOM

**Guatemala, 11 de agosto de 2016**

### TITULARES

**Prensa Libre:** **Empieza pulso por reforma tributaria**
**Siglo Veintiuno:** **Julio, el más violento**
**El Periódico:** **Diputado impulsa rebaja de condenas**
**Diario de CA:** **Combaten crisis alimentaria**

### EDITORIALES

**Prensa Libre:** **Mal comienzo de nueva reforma**
**Siglo Veintiuno:** **Indicadores matemáticamente correctos, pero mentirosos**
**El Periódico:** **¡Otra vez más impuestos!**
**Diario de CA:** **Llamado a respetar la dignidad**

### PRENSA LIBRE

Partidos Políticos rechazan plan empresarial. Los secretarios generales de los partidos políticos representados en el Congreso rechazaron ayer la propuesta de los empresarios para que la discusión de política fiscal se realizara afuera del Legislativo, por medio de una mesa técnica que incluyera a diferentes sectores para que se pronuncien sobre la reforma que plantea el Ejecutivo. Para el presidente del Cacif, José González-Campo, la importancia de una reforma fiscal debe radicar en un punto de reactivación económica y asegurar que el país crezca para que existan los recursos para pagar impuestos.

Dudan de proyecto que reduce penas. La iniciativa de ley que busca la reducción de penas de hasta el 50 por ciento para los sindicados que se declaren culpables, ha generado dudas y temor de que pueda beneficiar a procesados en casos de alto impacto por corrupción.

Buscan desintegrar banda dedicada al lavado de dinero. El informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) detalla que la agrupación delictiva era investigada desde el 2011 luego de una denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.

Justicia: eficiencia global es de 12.6%. Un análisis de procesos reveló que la eficiencia global del sistema de justicia guatemalteco en 2015 fue de 12.6%. Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo, señaló que lo que se mide se puede mejorar, y por eso era importante el diagnóstico.

guatemalteco en 2015 fue de 12.6%. Felipe Bosch, presidente de la Fundación para el Desarrollo, señaló que lo que se mide se puede mejorar, y por eso era importante el diagnóstico.

**ECONÓMICAS**

Juicio privado genera intervención a CHN. Un caso que comenzó en 1957 por un fideicomiso privado se convirtió, 59 años después, en motivo de una "intervención judicial" para el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). La jueza Dora Leticia Monroy Hernández, del juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Coatepeque, Quetzaltenango, emitió la orden con fecha 5 de julio que fue ejecutada ayer.

Pro y contras de la reforma. Los escenarios de la reforma tributaria estarían enfocados en la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA), debilitado desde el 2012 por el desinterés en el uso de la planilla de ese tributo por parte de los contribuyentes debido a las modificaciones a la Ley del ISR.

**SIGLO VEINTIUNO**

Más de tres mil muertes violentas en siete meses. Hasta el mes de julio se reportan 3,198 muertes violentas en el país. O sea, un promedio de 457 mensuales y entre 15 y 16 diarias. De este total, el mes pasado registra la mayor cantidad con 485, según un informe dado a conocer por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

**Extinguen Q2.3 millones a *Eco*.** El Ministerio Público logró ayer que, con base en las pruebas presentadas en materia de extinción, pasen al Estado Q2.352,989.30 por medio de la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed). (Pág. 5)

**Notifican fin de relación laboral a 274 empleados.** Los 274 trabajadores del Congreso que tienen parentesco con otros empleados del Legislativo o con diputados, comenzaron a ser notificados que le da por terminado su contrato laboral, por orden del juez Marco Pérez, del juzgado de Trabajo. (Pág. 4)

**Detienen bus que llevaba a 56 guatemaltecos.** En Hermosillo, México, transportaban además a personas de Ecuador, El Salvador y Honduras. (Pág. 6)

**ECONÓMICAS**

CACIF busca participar en el diálogo de la reforma fiscal. El presidente del Cacif, José González Campo, informó que debido a la importancia de esta ley se debe efectuar un diálogo integral para abordar temas más allá de las tasas.

**elPeriódico**

Comisión de Finanzas llevaría discusión de la reforma fiscal. El tema se conocerá junto con la propuesta de Presupuesto del Estado para 2017 para establecer prioridades y candados al gasto. El acceso a la información del contenido de la reforma ha sido escaso. José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), agregó que la integralidad que esperan es incluir normas de transparencia, prioridades de gasto y los ingresos, no solo limitarse al tema de tasas. El presidente del CACIF dijo que desconocen la propuesta que lleva el Ejecutivo, pero que buscarán asegurar que se cumplan las prioridades de educación, salud, seguridad y justicia e infraestructura; y que se garantice la reactivación de la economía.

"Blindar una reforma fiscal no se puede, pero sí minimizar los riesgos" Antonieta de Bonilla, exministra de Finanzas e integrante del G40. Finanzas e integrante del G40

La exministra de Finanzas y expresidenta del Banco de Guatemala indica que regresar a la planilla del IVA no sería lo más apropiado para reducir el impuesto a pagar, enfatiza en la necesidad de una propuesta integral.

MP ampliará imputación contra "Guayo Cano". El Ministerio Público (MP), por medio de la unidad especial que investiga el caso de los ocho policías asesinados en Salcajá, Quetzaltenango, en 2013, presentará una ampliación de la imputación contra el supuesto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano.

**ECONÓMICAS**

Guatemala sufre un nuevo retroceso en el Índice de Progreso Social. Guatemala sufrió una caída de siete puestos en la edición de 2016 del Índice de Progreso Social (IPS), pasando del puesto 79 al 87 de entre 133 países. La puntuación obtenida por Guatemala es de 61.68, mientras el promedio general es de 62.8.

**DIARIO DE CENTRO AMÉRICA**

Proyecto de reforma llega al Congreso. Después del compromiso asumido el martes por los jefes de bloque, para agilizar el trámite de la propuesta de reforma fiscal, el Ejecutivo remitirá hoy al Congreso esa iniciativa. Los legisladores manifestaron su apoyo al proyecto, mediante el cual se pretende elevar la recaudación, pues este aspecto es trascendental para mejorar la calidad de los servicios públicos.

**Notifican fin de relación laboral a 274 empleados.** Los 274 trabajadores del Congreso que tienen parentesco con otros empleados del Legislativo o con diputados, comenzaron a ser notificados que le da por terminado su contrato laboral, por orden del juez Marco Pérez, del juzgado de Trabajo. (Pág. 4)

**Detienen bus que llevaba a 56 guatemaltecos.** En Hermosillo, México, transportaban además a personas de Ecuador, El Salvador y Honduras. (Pág. 6)

**ECONÓMICAS**

CACIF busca participar en el diálogo de la reforma fiscal. El presidente del Cacif, José González Campo, informó que debido a la importancia de esta ley se debe efectuar un diálogo integral para abordar temas más allá de las tasas.

**elPeriódico**

Comisión de Finanzas llevaría discusión de la reforma fiscal. El tema se conocerá junto con la propuesta de Presupuesto del Estado para 2017 para establecer prioridades y candados al gasto. El acceso a la información del contenido de la reforma ha sido escaso. José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), agregó que la integralidad que esperan es incluir normas de transparencia, prioridades de gasto y los ingresos, no solo limitarse al tema de tasas. El presidente del CACIF dijo que desconocen la propuesta que lleva el Ejecutivo, pero que buscarán asegurar que se cumplan las prioridades de educación, salud, seguridad y justicia e infraestructura; y que se garantice la reactivación de la economía.

"Blindar una reforma fiscal no se puede, pero sí minimizar los riesgos" Antonieta de Bonilla, exministra de Finanzas e integrante del G40. Finanzas e integrante del G40

La exministra de Finanzas y expresidenta del Banco de Guatemala indica que regresar a la planilla del IVA no sería lo más apropiado para reducir el impuesto a pagar, enfatiza en la necesidad de una propuesta integral.

MP ampliará imputación contra "Guayo Cano". El Ministerio Público (MP), por medio de la unidad especial que investiga el caso de los ocho policías asesinados en Salcajá, Quetzaltenango, en 2013, presentará una ampliación de la imputación contra el supuesto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano.

**ECONÓMICAS**

Guatemala sufre un nuevo retroceso en el Índice de Progreso Social. Guatemala sufrió una caída de siete puestos en la edición de 2016 del Índice de Progreso Social (IPS), pasando del puesto 79 al 87 de entre 133 países. La puntuación obtenida por Guatemala es de 61.68, mientras el promedio general es de 62.8.

**DIARIO DE CENTRO AMÉRICA**

Proyecto de reforma llega al Congreso. Después del compromiso asumido el martes por los jefes de bloque, para agilizar el trámite de la propuesta de reforma fiscal, el Ejecutivo remitirá hoy al Congreso esa iniciativa. Los legisladores manifestaron su apoyo al proyecto, mediante el cual se pretende elevar la recaudación, pues este aspecto es trascendental para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Gobierno combate crisis en el Corredor Seco. Un total de 5 mil familias (30 mil personas) de 15 municipios de Zacapa, Jalapa y Chiquimula serán beneficiadas con el plan piloto del proyecto Superando la crisis alimentaria en el oriente de Guatemala, que consiste en la entrega mensual de vales electrónicos por un valor de Q600 que podrán canjearse por alimentos.

Avanza agenda de Política Exterior. Atender el tema migratorio, dar seguimiento a las consultas populares sobre el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, avanzar en la integración centroamericana y vigorizar la presencia externa del país, forman parte de los ejes de la Política Exterior, que el Gobierno ejecuta actualmente.

USAC no debería participar. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, manifestó que, desde su punto de vista, no es aconsejable que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) designe a uno de los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad.

**ECONÓMICAS**

Reforma fiscal, a debate. Calidad en el gasto público, transparencia y reactivación económica son los temas que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) pretenden incluir en la discusión que la Comisión de Finanzas del Congreso comenzará cuando reciba el proyecto de Reforma Fiscal que elaboró el Ejecutivo. "Nos parece que ese esfuerzo debe ser integral y que no debe limitarse a un asunto de ingresos, porque si en un momento se pedirá pagar más, también es necesario que se conozca en dónde se invertirá y para qué servirá", expresó José González Campo, presidente del Cacif, al concluir ayer una reunión que sostuvo la Junta Directiva de ese gremio con secretarios de los partidos políticos.

# ANEXOS VI

## (presentaciones PPT)

# PROCESO DE CONTRATACIÓN
# FIRMA CONSULTORAS
## MÉTODO DE SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO

GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

Proceso de Contratación de Firmas Consultoras - SBCC
La Unidad ejecutora Presenta:
•Solicitud
•TDR
•Presupuesto
•Criterios Evaluación
•Borrador Aviso
Envío al BID
BID revisa y emite No Objeción
Se hace una publicación en Diarios Digitales Internacionales y Nacionales (UNDB / Guatecompras / Redes Sociales / Web Pronacom)
Se reciben manifestaciones de interés
GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

Proceso de Contratación de Firmas Consultoras - SBCC
Se elabora el documento de "Solicitud de Propuesta"
El BID revisa y emite la No Objeción
Se envía el documento de solicitud de propuesta a las firmas de la lista corta
Se reciben Propuestas técnicas y de Precio
GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

Criterio de Fijación del Salario Mínimo
COMISIÓN NACIONAL DEL SALARIO
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
PRONACOM
Mejorando para Competir

Salario Mínimo vrs PIB
SALARIO MÍNIMO
PIB
GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

## Mecanismo de Fijación del Salario Mínimo

GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

## Mecanismo de Fijación del Salario Mínimo

GUATEMALA
PRONACOM
Mejorando para Competir

## Calculo de Ajuste Salarial

**Ajuste porcentual anual al salario mínimo actual**

**Ajuste por productividad:** Crecimiento real del PIB en el año 2014 reportado por BANGUAT

$$3.85 = 3 + 1/2\,(4.1 - 2.4)$$

**Ajuste por inflación:** Meta inflacionaria inferior vigente por la Política Monetaria del BANGUAT.

**Ajuste por productividad:** Crecimiento de la población, reportado por el INE.

GUATEMALA

PRONACOM
Mejorando para Competir

## Criterio Propuesto vrs Mecanismo Actual

**CON LA REGLA:**

- 4% de aumento promedio en los últimos 10 años.

**SIN LA REGLA:**

- 5% de aumento promedio en los últimos 10 años.
- PERO: años en donde el aumento es 0 (2005 y 2009).
- Mayor varianza, generando incertidumbre, complicando la atracción de inversión.

GUATEMALA

PRONACOM
Mejorando para Competir

# ANEXOS VII

## (publicaciones de notas en redes sociales)

**Pronacom** agregó 3 fotos nuevas.
Publicado por Dina Alejandra Alburez Marquez [?]

Este día representantes de PRONACOM se reunieron con el Subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, Felipe Fernando Fernández, para darle a conocer la plataforma Asisehace.gt y las propuestas de simplificación que se trabajan actualmente con apoyo de AGEXPORT.

PRONACOM trabajará con la Contraloría General de Cuentas para documentar y simplificar los procesos de esta institución, para que sean más competitivos.

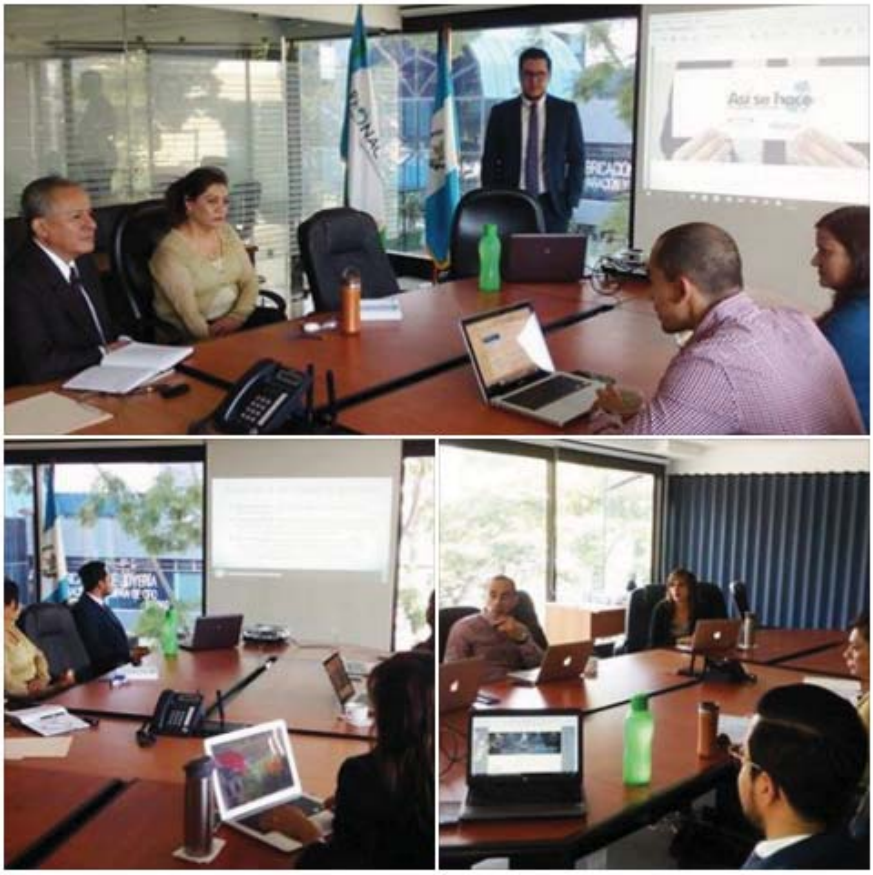

850 personas alcanzadas — Promocionar publicación

Me gusta · Comentar · Compartir

Hector Escobar, Mynor Perez y 12 personas más — Orden cronológico

**Magno Morán Solares** opina: podrian agregar el establecimiento de procesos para despedir gente en el estado? ya ni los funcionarios no saben como lidiar con sus sindicatos y muchos empleados...

Me gusta · Responder · Enviar mensaje · 29 de julio a las 10:56

Escribe un comentario...

**Pronacom** agregó 3 fotos nuevas.
Publicado por Dina Alejandra Alburez Marquez [?]

PRONACOM participó en el lanzamiento de la segunda edición de Guatemala Investment Summit 2016, el evento internacional de inversión más relevante de la región centroamericana, organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, en conjunto con el Ministerio de Economía Guatemala.

Esta actividad se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de noviembre en el Hotel Westin Camino Real, donde se reunirán inversionistas, la cúpula empresarial de diversas partes del mundo y emprendedores en distintas áreas.

Para mayor información puedes visitar www.gis.com.gt

438 personas alcanzadas

Promocionar publicación

Me gusta Comentar Compartir

Ma Andrea Perdomo, Mel Salguero-Valladares y 6 personas más

Escribe un comentario...

# ANEXOS VIII

## (felicitación de cumpleaños a periodistas)

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA
GUATEMALA, 2016
· ¡Deseamos que pase un día lleno de bendiciones y que celebre a lo grande! ·
FELIZ
CUMPLEAÑOS

# ANEXOS IX

## (imagen de actividades de la institución)

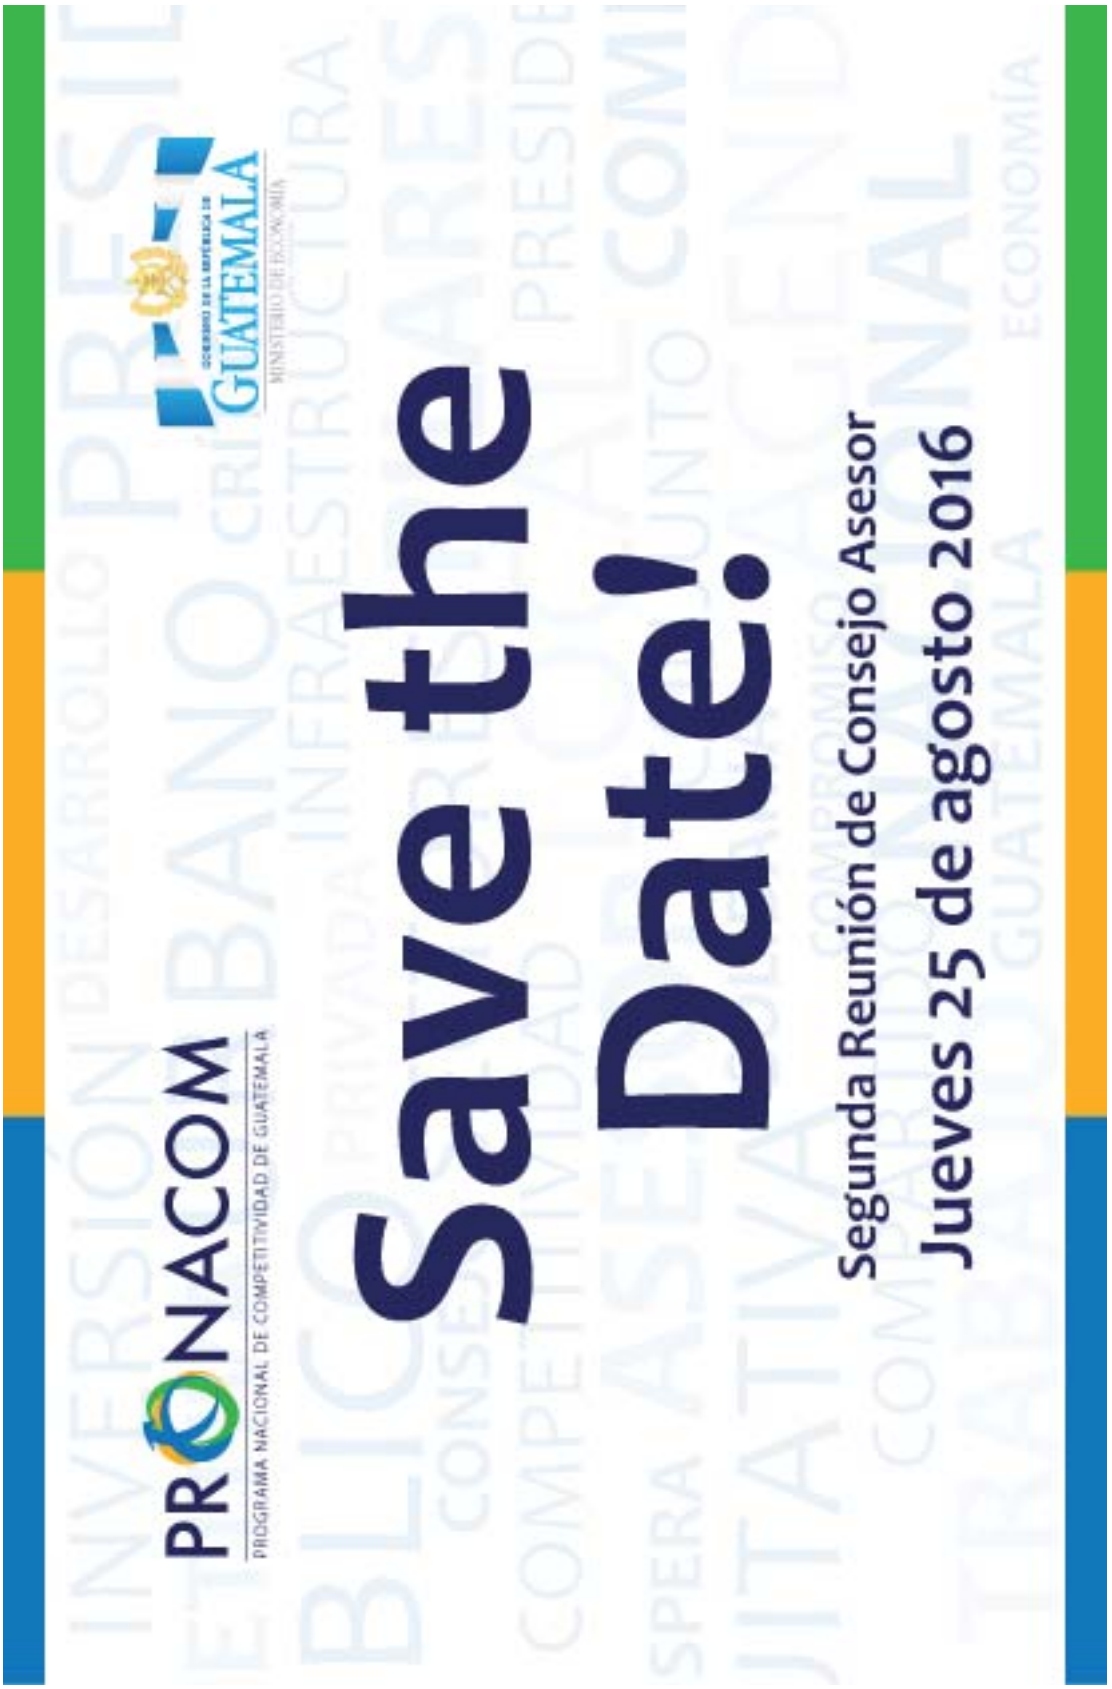
PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA
GUATEMALA
Save the
Date!
Segunda Reunión de Consejo Asesor
Jueves 25 de agosto 2016

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Le invitan a la
Segunda Reunión de Consejo Asesor 2016
Como parte de la agenda se tratarán los siguientes temas:
Política Económica 2016 - 2021
Agenda Nacional de Competitividad (ANC)
"Los esfuerzos de la competitividad no son exclusivos de una institución, por lo que el Consejo Asesor aglutina esfuerzos público privados que surgen del compromiso compartido y trabajo conjunto de diferentes sectores para alcanzar una Guatemala competitiva, próspera, solidaria y equitativa", Agenda Nacional de Competitividad.
FECHA: Jueves 25 de agosto de 2016
LUGAR: Auditorio INTECAP (Calle del Estadio Mateo Flores 7-51 zona 5)
HORA: 9:00 a. m.
R.S.V.P. Brenda García
recepcion@pronacom.org / 2421-2464

## CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMES

Por este medio hago **CONSTAR** que he recibido y leído el informe abajo indicado de los servicios prestados dentro de la contratación titulada:

***Asesor técnico en automatización de trámites***
Nombre o título de los servicios de asesoría

Que realizó:

***Amán José Rafael Sánchez Melgar***
Nombre de la persona contratada

Como parte de los servicios de asesoría prestados al Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el cual recibo a entera conformidad porque cumplen con los Términos de Referencia del Contrato No.: ***BID 1734/OC-GU-AI-020-2016***

Por lo que se solicita trasladar a donde corresponda para continuar con el proceso respectivo de pago, por la cantidad de: ***Q. 18,000.00***

Se adjunta el informe No. **5**
Titulado:
***"Informe sobre la implementación de la herramienta electrónica minegocio.gt v2 en el registro, mercantil en relación al funcionamiento de las pantallas de procesamiento de edicto, razón de nombramiento, patente de empresa, patente de sociedad, diario de Centroamérica, IGSS y MINTRAB, estableciendo los cambios requeridos y determinando mejoras que podrían beneficiar a los operadores dentro de la herramienta."***

Impreso en: ***45 hojas***
Cantidad en hojas

**SI**
Indicar si se adjunta en CD

Fecha de entrega del informe: ***31 de Agosto de 2016***

Aprobación del informe:

José Fernando Suriano Juárez
Director Ejecutivo

No. 24111

*Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala*

## CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO

El infrascrito secretario (a) de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, HACE CONSTAR: Que en los registros de este Colegio Profesional aparece inscrito (a) el (la) Licenciado (a): [illegible] Colegiado (a): [illegible]

Con el Título de: [illegible]

desde 28/03/2013 Con cuotas canceladas al 31/12/2016 con Calidad de Colegiado ACTIVO al 31/03/2017

Revisó: [illegible] Secretario (a) de la Junta Directiva

Confrontó: [illegible] Fecha: 06/01/2016

Gerente General
Augusto Eleazar López Rodríguez

**Válido en Original**

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

**PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**INFORME AGOSTO 2016**

Para: Señor Director, José Fernando Suriano Buezo, Programa Nacional de Competitividad

De: **Amán José Rafael Sánchez Melgar**

Nombre de Asesoría: **Asesor Técnico en Automatización de Trámites**

Asunto: Informe de Actividades #5

Fecha: 31 de agosto de 2016

Señor Director:

De manera atenta y respetuosa, describo las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2016 y logros obtenidos.

**Informe # 5**

Informe sobre la implementación de la herramienta electrónica minegocio.gt v2 en el registro, mercantil en relación al funcionamiento de las pantallas de procesamiento de edicto, razón de nombramiento, patente de empresa, patente de sociedad, diario de Centroamérica, IGSS y MINTRAB, estableciendo los cambios requeridos y determinando mejoras que podrían beneficiar a los operadores dentro de la herramienta.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**
**(Los logros obtenidos en cada actividad se presentan en el siguiente título)**

1. Se continuó con la implementación de la herramienta minegocio.gt en el Registro Mercantil y se analizaron los roles de Edicto, Nombramiento, Patentes, Diario de Centroamérica, IGSS y MINTRAB.

2. Se brindó apoyo al departamento de sociedades del Registro Mercantil y a diferentes notarios y usuarios que tuvieron inconvenientes con la herramienta. Se encontraron y documentaron errores en el sistema, así como requerimientos de cambios realizados

por el departamento de sociedades del registro mercantil, tanto los errores como los requerimientos fueron enviados a los informáticos para su corrección.

3. Se promocionó la herramienta minegocio.gt en la radio TGW, 107.3 fm, en el show denominado "Fortalezcamos a nuestras mipymes" con el conductor Abel Orellana.

4. Se mantuvo seguimiento en la Dirección General de Migración, sobre temas de documentación de trámites y procesos administrativos de inversionistas o trabajadores extranjeros. Para ello se contactó a la licenciada Olga Alfaro y personal de extranjería.

5. Se continuó participando en reuniones de diseño y formulación de nuevas herramientas electrónicas en el Registro Mercantil en preparación para el contrato de la segunda fase de la herramienta minegocio.gt.

6. Se sostuvo reuniones con autoridades del Ministerio de ambiente, Municipalidad de Guatemala, Cámara de construcción y Ministerio de relaciones exteriores como apoyo al diseño de la herramienta de licencias de construcción.

7. Se solicitó un dictamen por parte de la dirección de tecnologías de la información del Ministerio de Economía para llevar a cabo la contratación de UNCTAD en la segunda fase del contrato de desarrollo de sistemas.

8. Se elaboraron términos de referencia para la contratación de jóvenes que pudiesen apoyar al ministerio de salud para el procesamiento de expedientes de licencias de construcción que solicitan dictamen de aguas.

9. Se elaboraron términos de referencia para la contratación de un asesor en facilitación de comercio e inversión.

10. Se elaboraron términos de referencia para la contratación de un asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley.

11. Se participó en reunión con Silvia Rivera y personeros de FUNDESA (Jorge Benavides y Fernando Spross) para mostrar el plan de acción para lograr un impacto en el Doing Business.

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

**LOGROS OBTENIDOS:**

1. Se realizó un análisis y revisión de los roles de Edicto, Nombramiento, Patentes, IGSS, MINTRAB y Diario de Centroamérica, se hizo una reseña de su funcionamiento, mejoras realizadas y observaciones de cada rol. Ver anexo #1.

2. Se continuó con el apoyo al departamento de sociedades del Registro Mercantil y a usuarios que encontraron errores o bugs en el sistema. Se reportaron errores concernientes a la selección de notarios autorizantes, acciones nominativas y preferentes, pago de multas y se solicitó un espacio para colocar un aviso en la página principal, entre otros. Ver anexo #2.

3. Se participó en la emisora 107.3 FM por un lapso de 30 minutos, en este espacio se promocionó y explicó la herramienta minegocio.gt así como el PRONACOM. Ver anexo #3.

4. Se le remitió a la licenciada Alfaro un documento con un listado actualizado de trámites pendientes ante la dirección general de migración.

5. Se sostuvieron reuniones con los jefes de los departamentos de modificaciones e inscripción de comerciante individual y empresa para delimitar los datos que debe llevar cada formulario, los requisitos que se deben adjuntar y los costos de los procedimientos. Ver anexo #4.

6. Se logró un acercamiento con cámara de construcción para lograr el apoyo del sector privado en el diseño de la herramienta de licencias de construcción. Se sostuvo reuniones con MARN y Municipalidad para permitir el ingreso del consultor y la recopilación de información y con MINEX para lograr el traspaso de información sobre una herramienta de licencias ambientales desarrollada en el año 2015.

7. Se obtuvo respuesta de la Dirección de tecnologías de la información y el dictamen se añadió al expediente de contratación respectivo. Ver anexo#5.

8. Se enviaron los términos de referencia ante los funcionarios del programa de empleo juvenil, estos se encargarán de evaluar a los candidatos y de realizar las contrataciones como apoyo al sector construcción de Guatemala. Ver anexo#6.

9. El asesor en facilitación de comercio e inversión vendrá a gestionar los primeros pasos para la realización de la planeación y gestión de la ventanilla única de inversión, proyecto a realizarse en el año 2017. Ver anexo #7.

**10.** El asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley tendrá a su cargo la promoción y procuración de las leyes de agenda legislativa del Pronacom, así como su difusión y análisis. Ver anexo #8.

**11.** Los representantes de FUNDESA se enteraron del plan de acción y brindaron recomendaciones para llevar a cabo dicho plan y las reformas del Doing Business que se enviarán al Banco Mundial durante el 2017, para ofrecer su apoyo consideraron que este debe solicitarse al comité ejecutivo del PRONACOM.

**Amán José Rafael Sánchez Melgar**

**Aprobado por:**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

## ANEXO #1
## Informe sobre los roles de Edicto, Nombramiento, Patentes, IGSS, MINTRAB y Diario de Centroamérica

### Rol de edicto:

El rol de generación de edicto sirve para la emisión de dicho documento, el operador observa en su pantalla las sociedades pendientes de procesamiento:

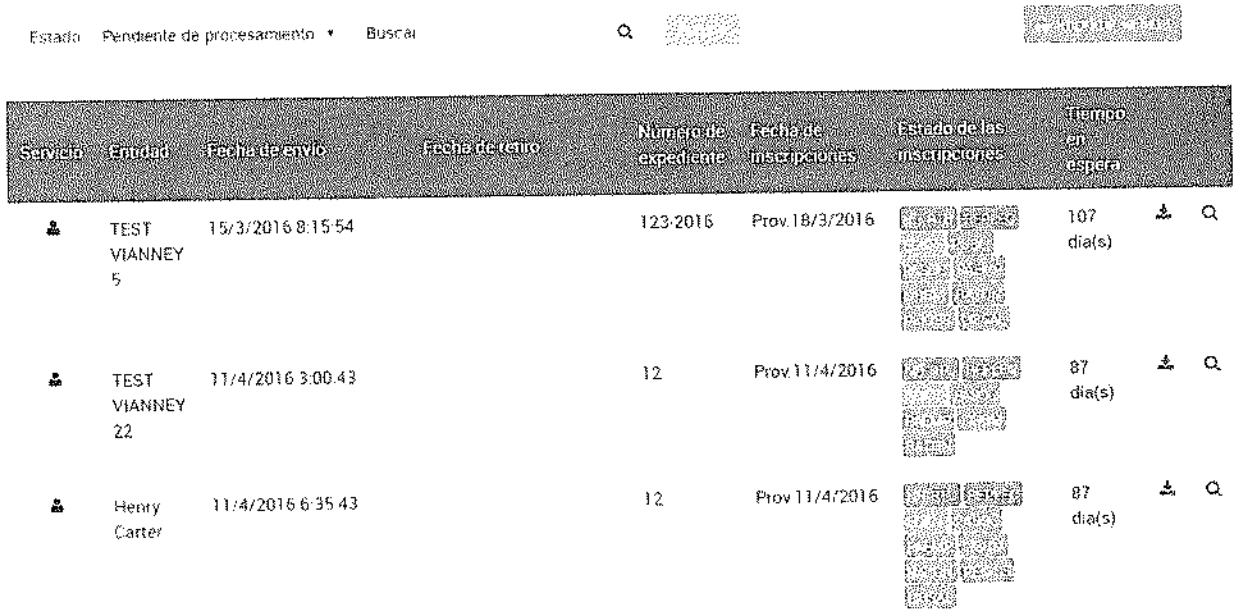


El operador también puede observar las sociedades que ya ha procesado con anterioridad.

Se notará que la casilla "EDICT" tiene un color amarillo, esto significa que el expediente está en el rol de edicto y no ha sido procesado.

Al ingresar al expediente el operador puede ver el historial del mismo:

Historial del expediente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Corrección de documentos** | 9/8/2016 15:16:31 | Documentos corregidos enviados para su revision | |
| **Calificación** | 9/8/2016 15:20:25 | Revisión legal procesada | Aman Jose Sanchez Melgar |
| **Revisión** | 9/8/2016 15:51:22 | Revision aprobada | Aman Jose Sanchez Melgar |
| **Revision de SAT** | 11/8/2016 11:15:10 | Revisión aprobada | Aman Jose Sanchez Melgar |

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

Al abrir un expediente de sociedad, el operador podrá ver las pestañas que contienen la totalidad de los documentos e información ingresada por el usuario y por los operadores previos. Luego en la pestaña de procesamiento escribirá los números de expediente, registro, folio y libro generados por el webservice de la aplicación en un paso anterior:

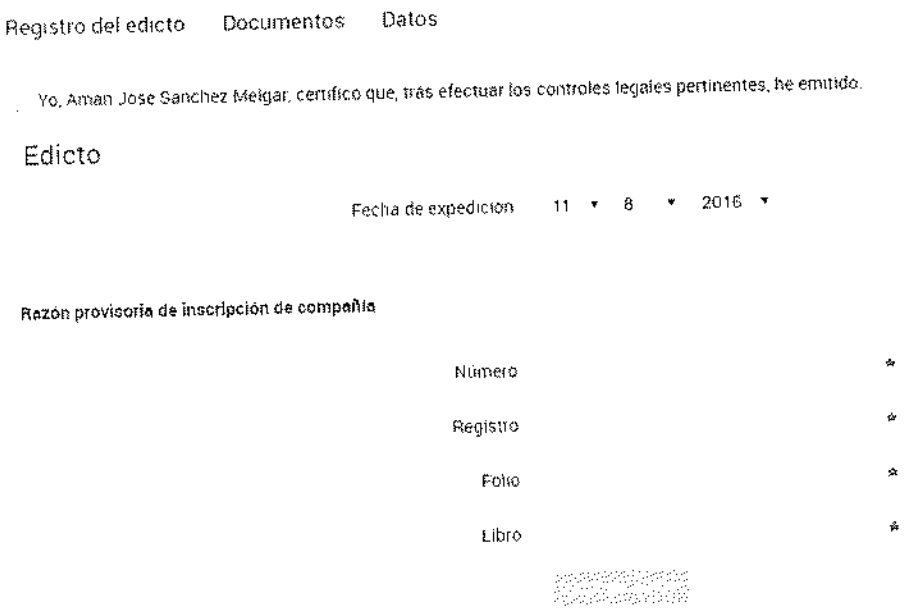


A partir del ingreso de estos datos el sistema generará el edicto de manera automática:

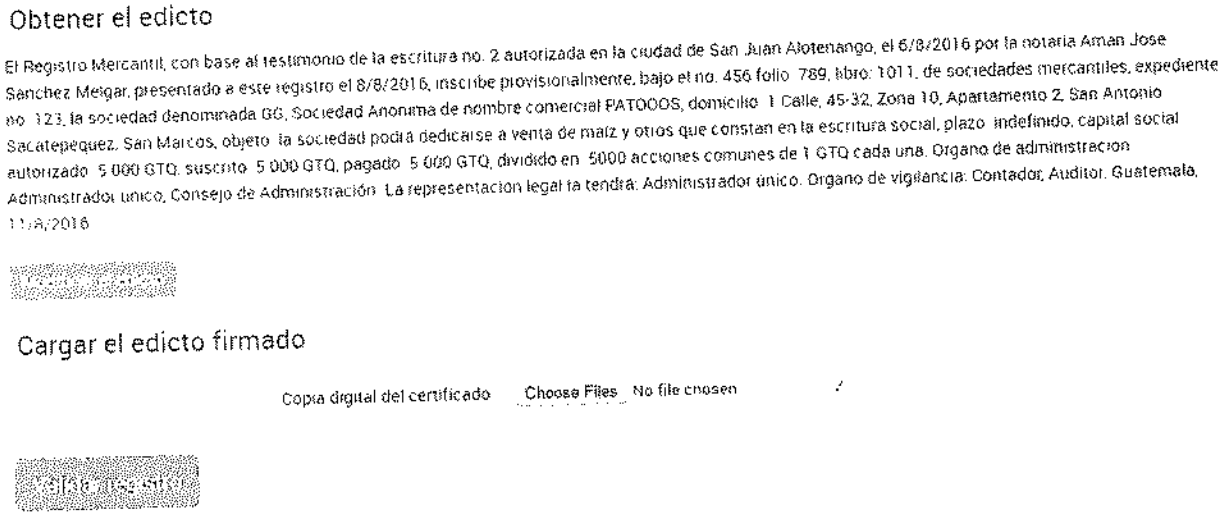


Por último el operador puede hacer cualquier modificación que considere necesaria en dicho edicto y validar el registro, con lo que concluye el procesamiento. (Los edictos se firman electrónicamente por el registrador mercantil).

## Rol de nombramiento:

El rol de nombramiento sirve para la emisión de la razón que se adjunta al acta de nombramiento de un representante legal de una sociedad, el operador observa en su pantalla las sociedades pendientes de procesamiento:




El operador también puede observar las sociedades que ya ha procesado con anterioridad.

Se notará que la casilla "REPLEG" tiene un color amarillo, esto significa que el expediente está en el rol de edicto y no ha sido procesado. Aquí también puede notarse que la casilla de "EDICT" tiene un color verde, esto significa que el expediente ya fue procesado por el operador de edictos.

Al ingresar al expediente el operador podrá ver el historial del expediente:




En el expediente de sociedad, el operador podrá ver las pestañas que contienen la totalidad de los documentos e información ingresada por el usuario y por los operadores previos.

La emisión de la razón del nombramiento se hace en el sistema del registro mercantil a partir de la inserción de datos realizada automáticamente por el webservice que funciona después de la aprobación de SAT, por lo que el operador únicamente ingresa la fecha de emisión del documento.

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

El sistema muestra automáticamente la fecha del día, para reducir el tiempo de procesamiento del expediente:




Al finalizar el operador Valida el registro y finaliza el procesamiento:

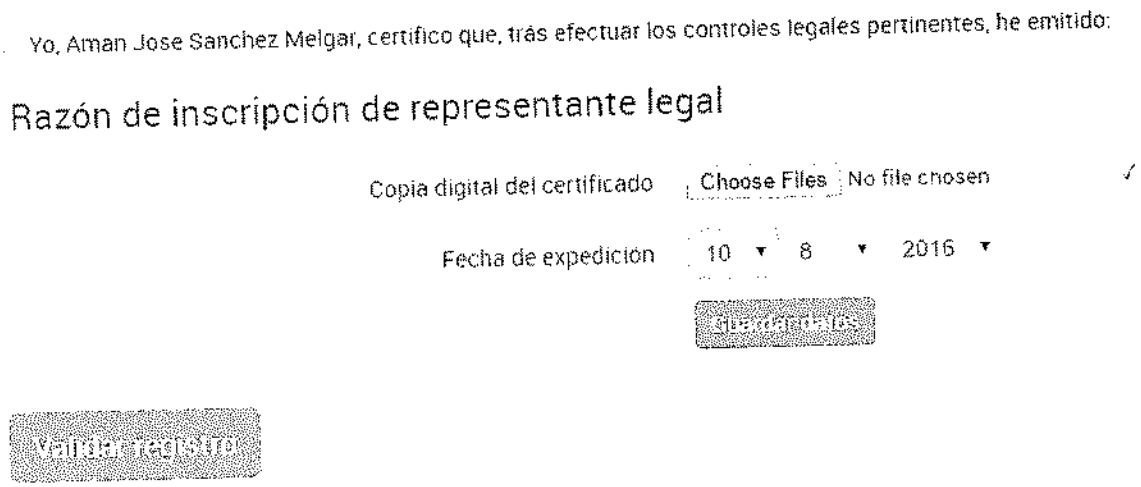

## Rol de patentes:

En el rol de patente, al igual que en los otros roles del sistema, el operador ve la lista de expedientes pendientes de procesamiento:

| Servicio | Entidad | Fecha de envio | Fecha de retiro | Número de expediente | Fecha de inscripciones | Fecha de la oposición | Estado de las inscripciones | Tiempo en espera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tralalla | 9/3/2016 11.35 26 | | 121 | Prov 1/2/2015 | 17/5/2016 | | 111 dia(s) | |
| | Firstone | 11/5/2016 10:49 47 | | 5564-2016 | Prov.16/5/2016 | | | 66 dia(s) | |

Este operador puede suspender un expediente si el usuario no envía el documento correcto para solicitar la inscripción definitiva de la sociedad, por lo que puede ver los siguientes expedientes: Pendientes, enviados a correcciones y los ya procesados.

Al ingresar verá el historial del expediente:

Historial del expediente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Press | 16/2/2016 3 28 59 | Edict posted | partB user |
| Solicitud | 7/3/2016 10 14 41 | Solicitud recibida | |
| Edict Registration | 7/3/2016 11 24 39 | Edict approved | partB user |
| Solicitud | 9/3/2016 11 35 23 | Solicitud recibida | |
| PASOC | 9/3/2016 11 43 28 | Correciones necesarias en el expediente | partB user |

Asimismo verá el documento enviado por el usuario:

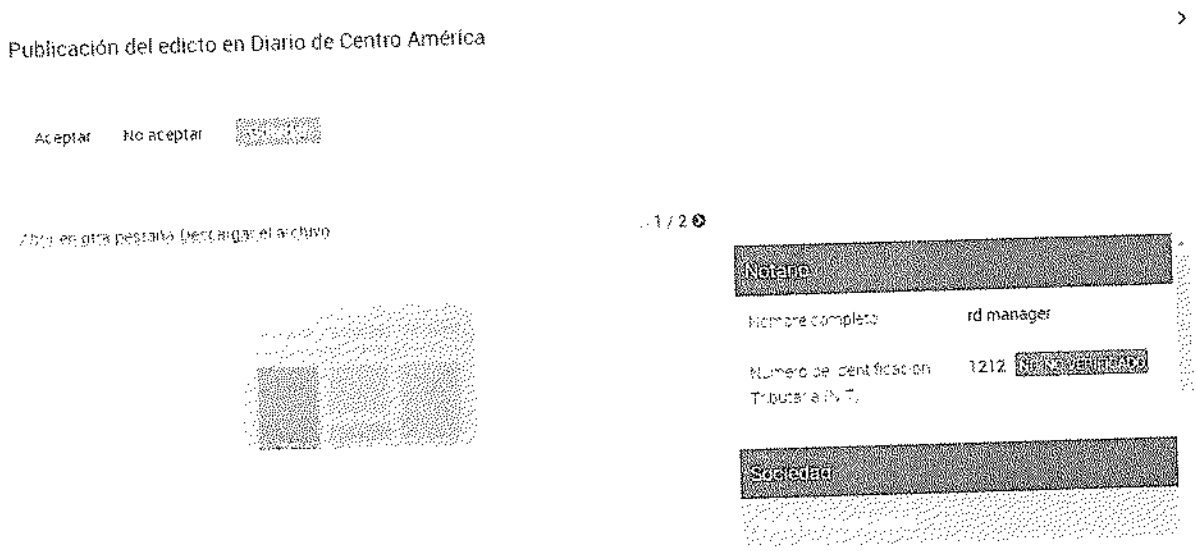


Si todo está correcto, el operador validará que el periodo de oposición ha terminado y si hay alguna oposición en contra de la inscripción definitiva de dicha sociedad. Si todo está correcto, el operador podrá procesar el expediente:



# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

Para procesar el expediente, únicamente se consignarán las fechas de las patentes, las cuáles se imprimen en el sistema del registro mercantil a partir de los datos ingresados a la base de datos por el webservice del sistema:

Yo, Aman Jose Sanchez Melgar, certifico que, tras efectuar los controles legales pertinentes, he emitido:

La emision de certificados esta suspendida durante el periodo de oposición

Patente de sociedad

Copia digital del certificado: Choose Files [illegible]

Fecha de expedición: 11 ▾ 8 ▾ 2016 ▾

Patente de empresa

Copia digital del certificado: Choose Files | No file chosen ✓

Fecha de expedición: 11 ▾ 8 ▾ 2016 ▾

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

## Roles de IGSS y MINTRAB

Los roles de IGSS y MINTRAB son exclusivos para sociedades que manifiestan contar con empleados. Cuando una sociedad tenga más de 3 empleados o tenga únicamente 1 pero se dedique al transporte debe registrarse como patrono en el sistema de planilla electrónica del IGSS. Cuando una sociedad tenga más de 10 trabajadores debe solicitar la autorización de libros de salarios ante el MINTRAB.

Ambos roles tienen un listado de expedientes pendientes de procesamiento:

| Servicio | Entidad | Fecha de envío | Fecha de retiro | Número de expediente | Fecha de inscripciones | Estado de las inscripciones | Tiempo en espera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Colegio Los Olivares | 4/4/2016 18:16:44 | | 21154-16 | Prov 18/4/2016 Def 6/6/2016 | | 45 día(s) | |
| | J119 | 1/5/2016 17:19:49 | | 27356-16 | Prov.13/5/2016 Def.13/6/2016 | | 30 día(s) | |
| | Que Padre | 16/5/2016 17:24:23 | | 29986-2016 | Prov.25/5/2016 Def.14/6/2016 | | 21 día(s) | |

De igual forma, estos roles pueden ver el historial del expediente:

Historial del expediente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revisión de SAT** | 14/4/2016 9:18:11 | Revisión aprobada | Elder Rolando Orellana |
| **Registro del edicto** | 18/4/2016 11:05:25 | Expediente aprobado por la RM - Sociedades | Ivonne Col |
| **Inscripción del representante legal** | 19/4/2016 8:31:41 | Representante legal aprobabdo | Manola Ponce Solis |
| **Patente de Sociedad actualizada** | 6/6/2016 15:04:39 | Expediente aprobado por el RM | Manola Ponce Solis |
| **Patente de Empresa actualizada** | 7/6/2016 1:15:07 | Expediente aprobado por la RM - Empresa | Ivonne Col |

Por último, los roles pueden escanear y cargar un certificado digital, consignar la fecha de emisión del mismo y finalizar el procesamiento del expediente electrónico:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  Documentos  Datos

Yo, Users Admin, certifico que, trás efectuar los controles legales pertinentes, he emitido:

Razón de autorización de libros ante el Ministerio de Trabajo

Copia digital del certificado  Choose Files  No file chosen  *

Fecha de expedición  11 ▾ 8 ▾ 2016 ▾

Derivado de este análisis se determinó que, como apoyo a los operadores, revisores y técnicos que trabajan en la aplicación, es necesario un módulo estadístico. Este módulo fue implementado en agosto de 2016 y en él se muestran datos de rapidez del procesamiento de expedientes:

| Expedientes procesados | Tiempo mínimo | Tiempo máximo | Tiempo promedio | Tiempo promedio de todas las personas de su rol |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 d 0 h | 10 d 20 h | 5 d 16 h | 3 d 15 h |

# Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
# Renglón de contratación 081 Fuente 52

## ANEXO #2
## Reportes y requerimientos de cambios enviados

1. Reporte y solicitud de corrección que versa sobre el movimiento errático de la página web cuando se está accediendo a un expediente electrónico:

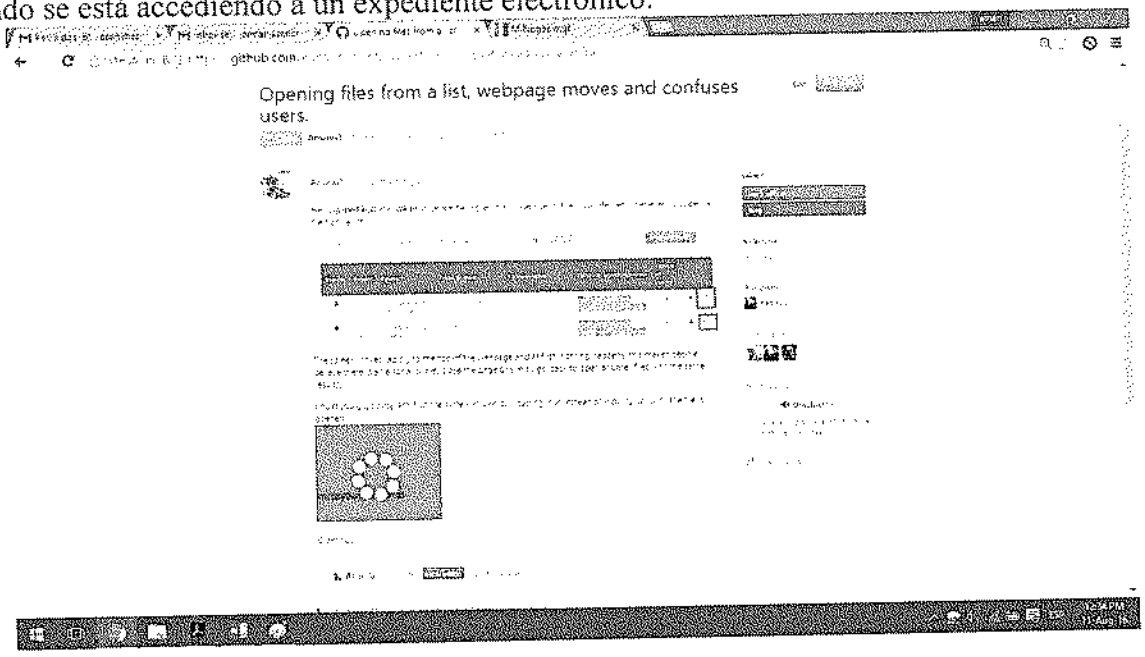


2. Solicitud de acceso a los expedientes electrónicos de los usuarios desde el rol de administración de usuarios:

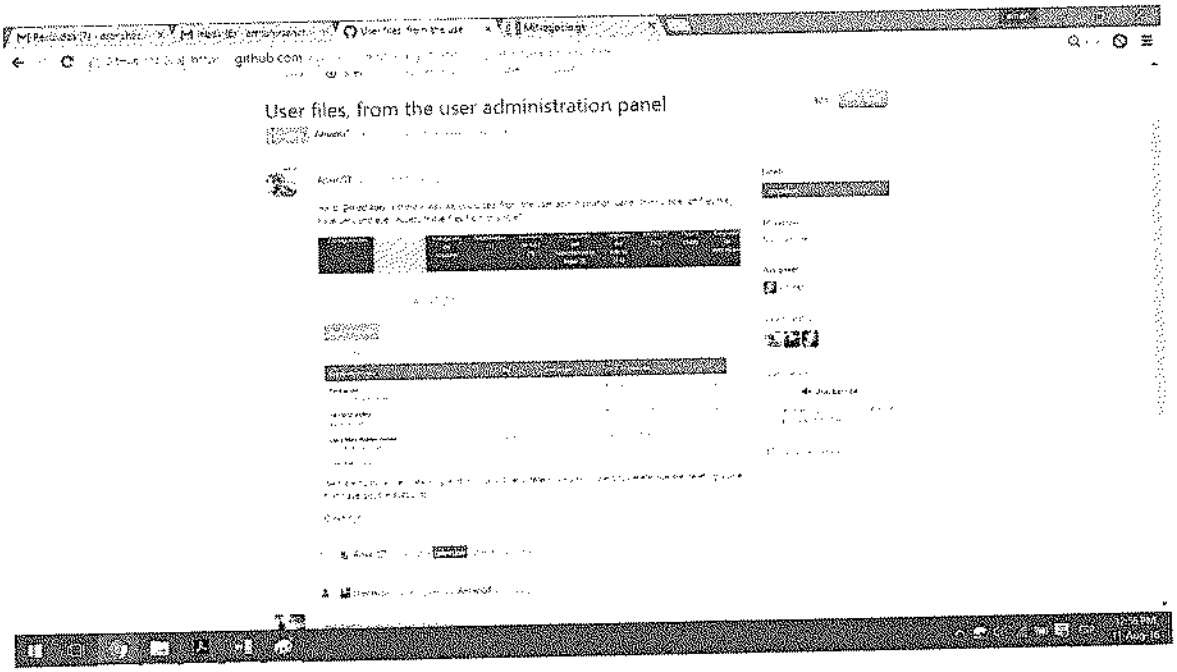

3. Solicitud de habilitación de un módulo de noticias en la página principal:

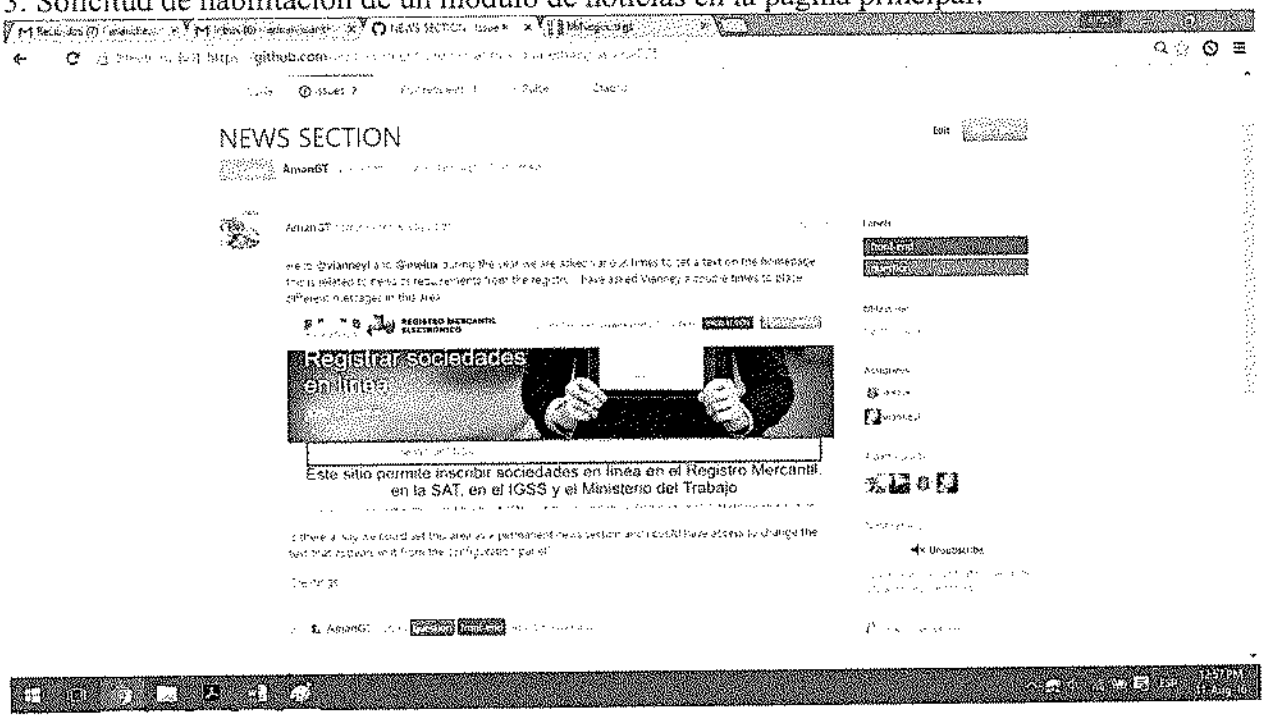


4. Solicitud de corrección en el funcionamiento del cobro de multas cuando hay más de una multa:

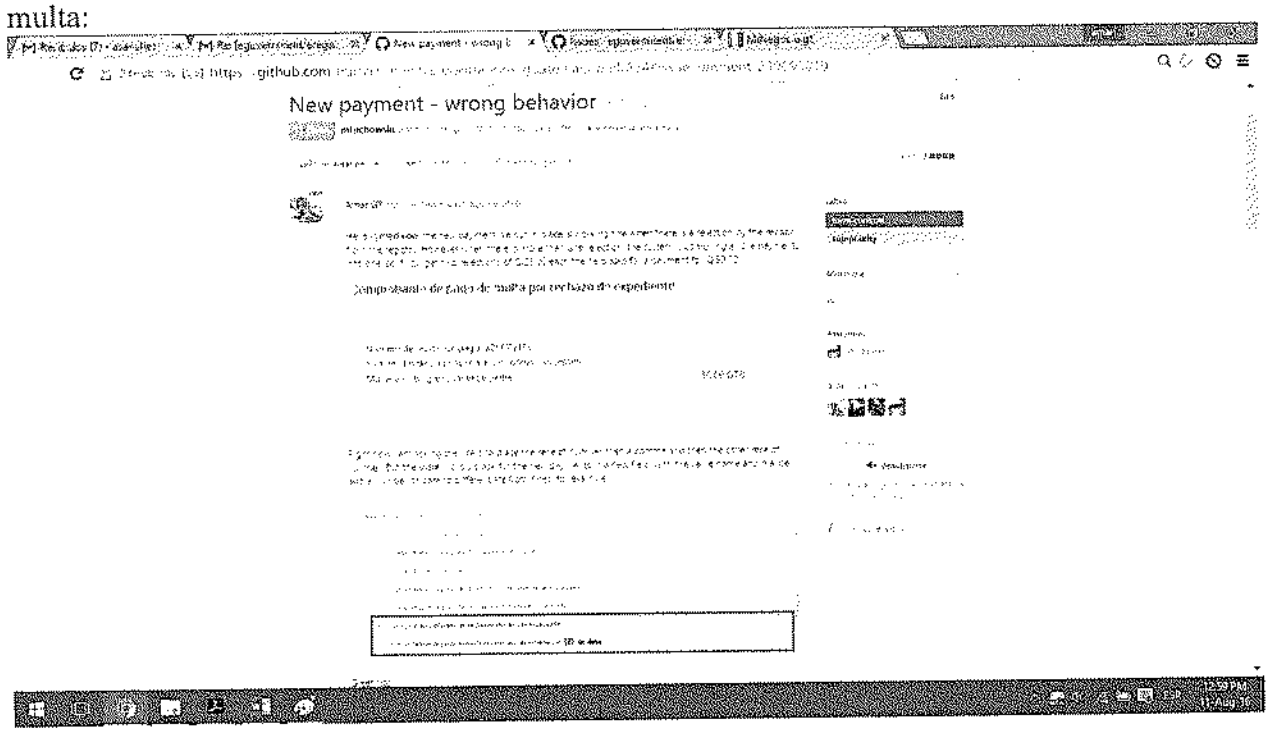

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

**ANEXO #3**
**Participación en radio TGW**

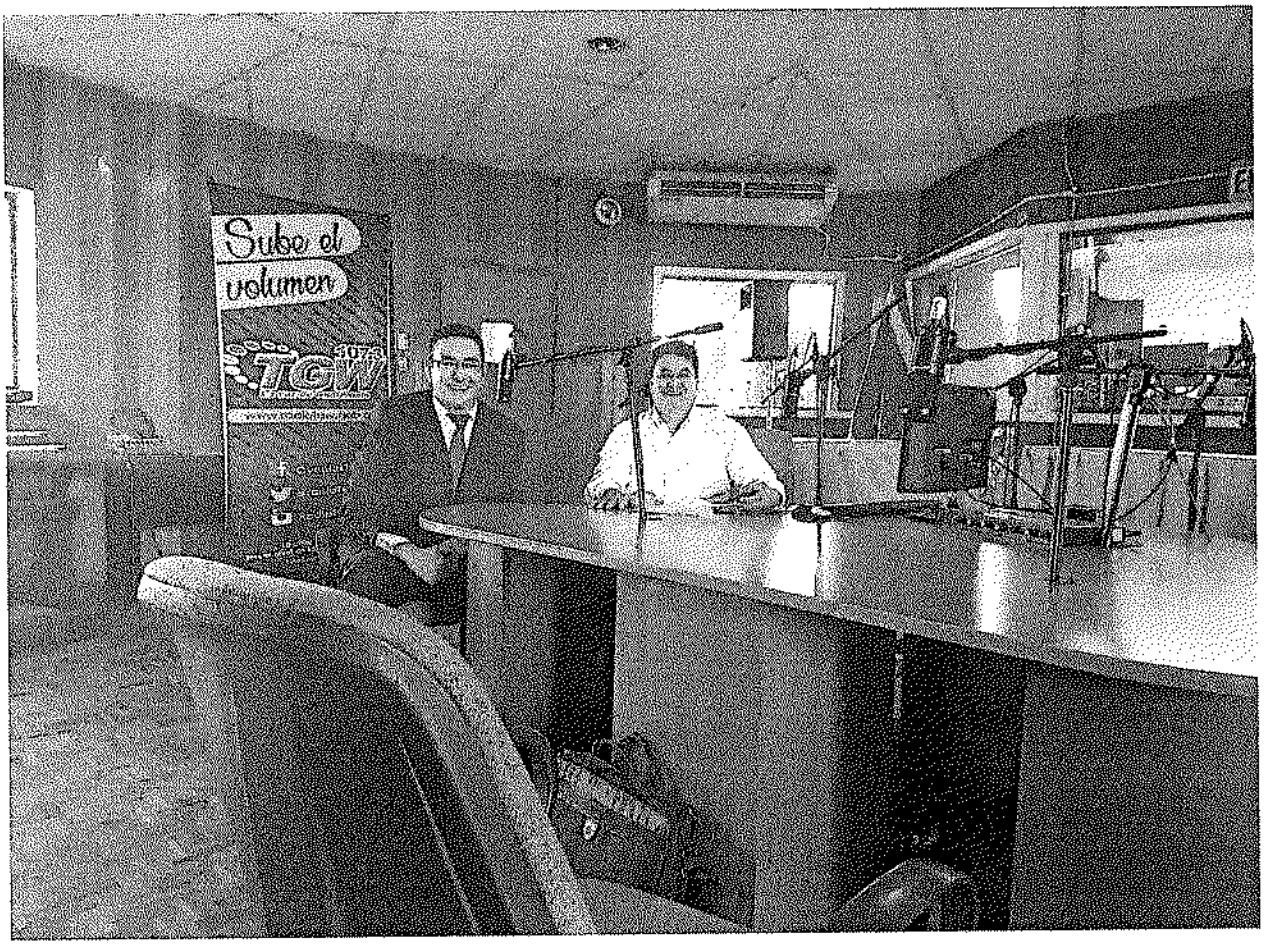

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

# ANEXO #4

## Presentación sobre requerimientos, proceso y datos de los nuevos sistemas de empresa y comerciante individual y de modificaciones

REGISTRO MERCANTIL

# Nuevos sistemas

## Registro Mercantil Electrónico

PRONACOM
PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA

MiNegocio.gt

# MODIFICACIONES

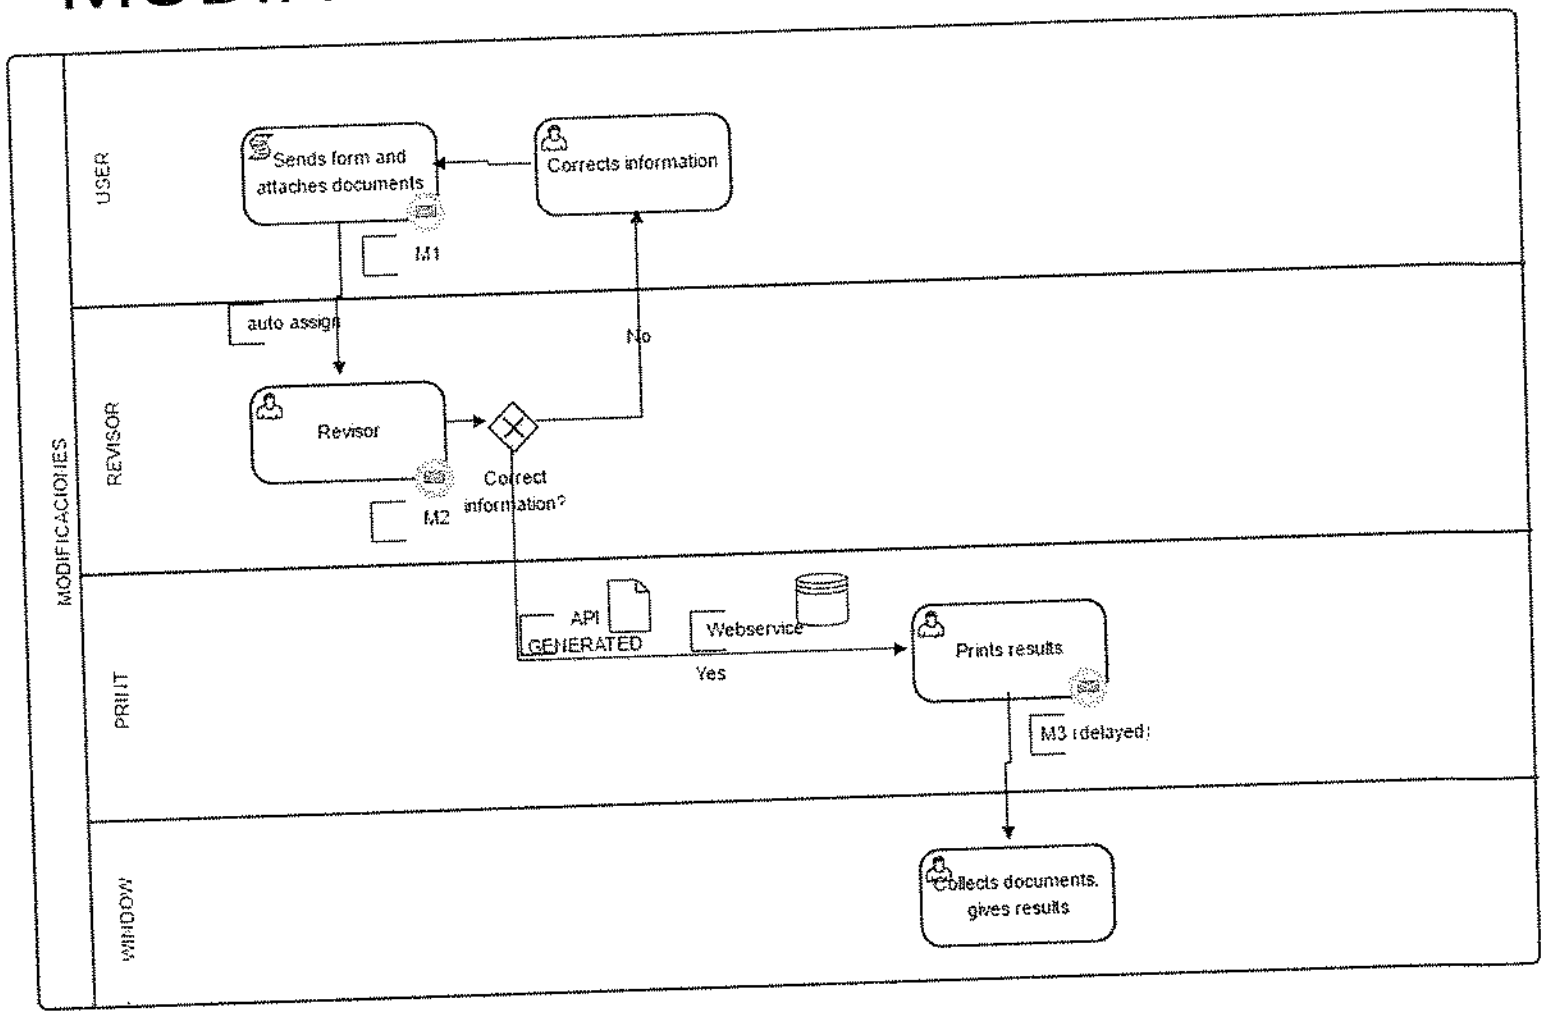

# Solicitud

A. Seleccionar proceso:

1. Nombre comercial
2. Dirección comercial
3. Dirección fiscal
4. Reposición de patente
5. Ampliación de objeto
6. Cambio de objeto
7. Cierre de empresa

# Solicitud – Datos comunes

B. Seleccionar Calidad de actuación

1. Propietario
2. Mandatario (añadir mandato)
3. Representante legal
4. Notario (que ha intervenido en el proceso)

C. Datos comunes:

1. Primer nombre
2. Segundo nombre
3. Primer apellido
4. Segundo apellido
5. Apellido de casada
6. Email adicional
7. Teléfono
8. Identificación de la entidad, Registro, Folio, Libro, de:

# Solicitud – Datos específicos

D. Datos específicos

d.1Nombre comercial: Antiguo nombre comercial, nuevo nombre comercial

d.2Dirección comercial: Antigua dirección comercial, nueva dirección comercial

d.3Dirección fiscal: Antigua dirección fiscal, nueva dirección fiscal

d.4Reposición de patente: Delimitar la patente que se requiere, 3 opciones: Empresa Individual, Empresa de sociedad y De sociedad.

d.5Ampliación de objeto: Se agrega lo escrito

d.6Cambio de objeto: Se borra lo anterior y se agrega lo escrito

d.7Cierre de empresa:

# DOCUMENTOS - COMUNES

E. Se deben adjuntar los siguientes documentos comunes:

1. Formulario autenticado – legalización automática

# DOCUMENTOS - ESPECÍFICOS

F. Adjuntar los siguientes documentos específicos:

1. Nombre comercial: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada
2. Dirección comercial: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada
3. Dirección fiscal: patente original
4. Reposición de patente: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada
5. Ampliación de objeto: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada
6. Cambio de objeto: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada
7. Cierre de empresa: patente original o denuncia al mp o policía o declaración jurada

# PAGOS

G. Costos:

1. Nombre comercial – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
2. Dirección comercial – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
3. Dirección fiscal – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
4. Reposición de patente – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
5. Ampliación de objeto – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
6. Cambio de objeto – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto
7. Cierre de empresa – Q.125.00 y Q.15.00 de edicto

# EMPRESA Y COMERCIANTE INDIVIDUAL

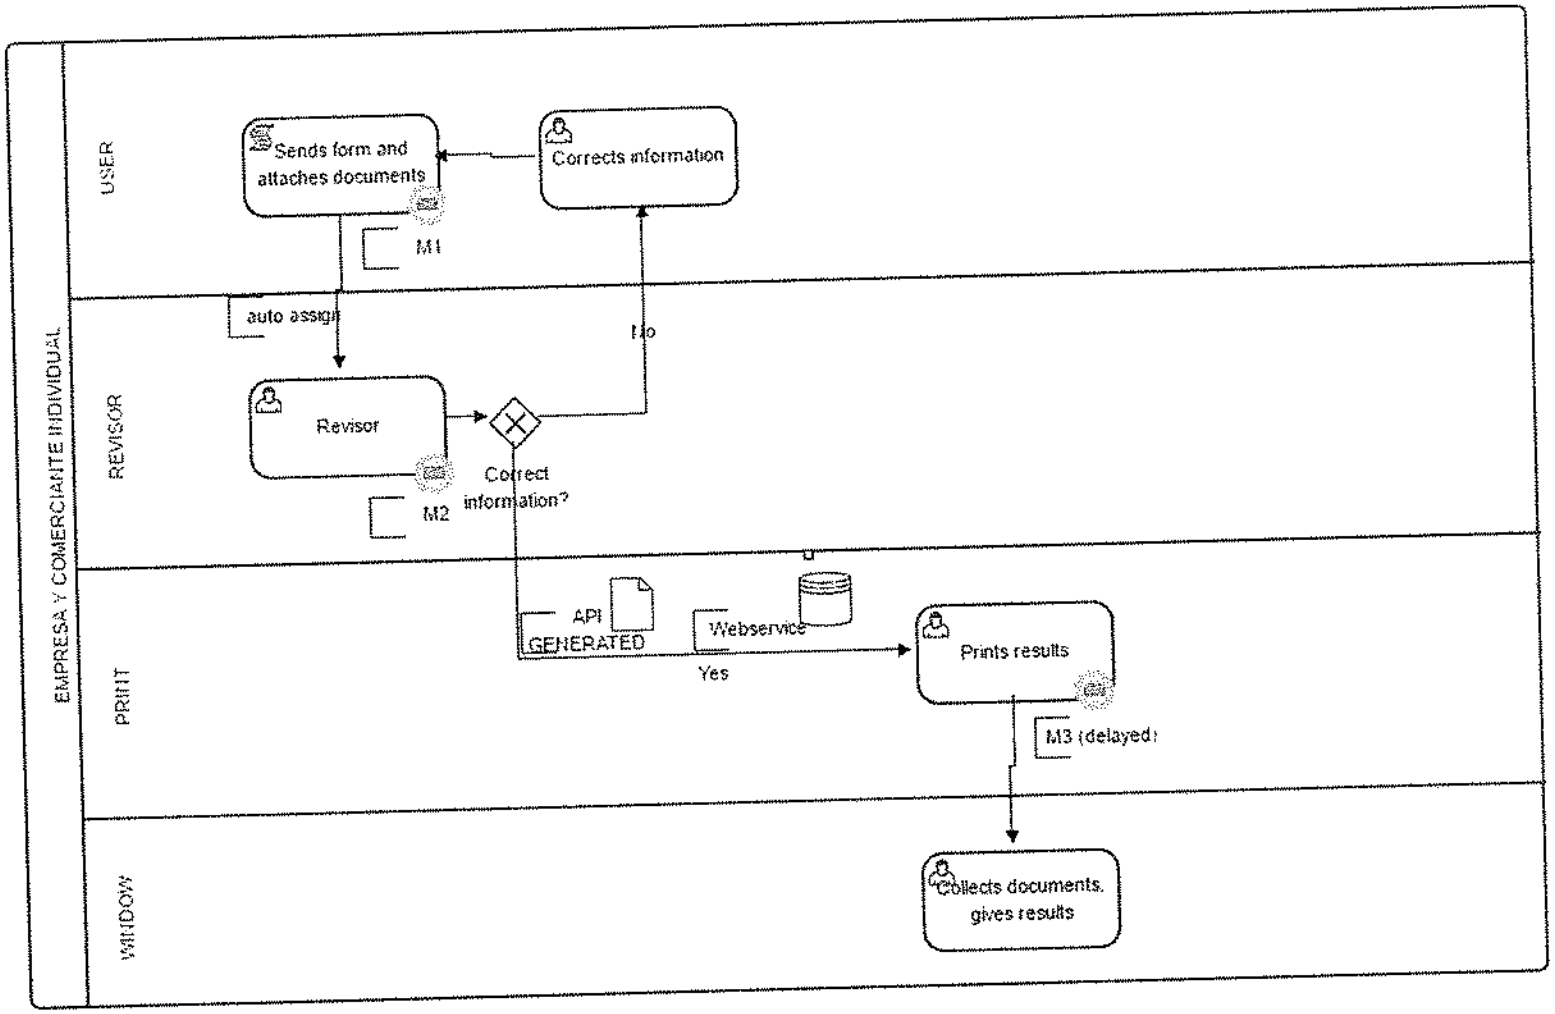

# Solicitud

A. Seleccionar proceso:

1. Comerciante individual y empresa
2. Empresa de sociedad mercantil

B. Comerciante individual y empresa:

1. Número de propietarios
2. Primer nombre
3. Segundo nombre
4. Primer apellido
5. Segundo apellido
6. Apellido de casada
7. Documento de identificación
8. Número de teléfono adicional
9. Correo electrónico adicional

# Solicitud – Datos

C. Empresa de sociedad:

1. Calidad con la que actúa: Mandatario (añadir mandato),Representante legal, Notario (que ha intervenido en el proceso)
2. Primer nombre
3. Segundo nombre
4. Primer apellido
5. Segundo apellido
6. Apellido de casada
7. Correo electrónico adicional
8. Número de teléfono adicional
9. Identificación de la entidad, Registro, Folio, Libro

# Solicitud – Datos específicos

D. Datos específicos

d.1Nombre comercial

d.2Dirección comercial

d.3Objeto

d.4 Capital

d.5 Categoría: única o sucursal

d.6 Si es casado, indique régimen matrimonial

d.7 Si ya está inscrito como comerciante, indique
No._____Folio:_____Libro:_____

d.8 Número de Empleados a contratar

# DOCUMENTOS - COMUNES

E. Se deben adjuntar los siguientes documentos comunes:

1. Formulario autenticado – legalización automática
2. Fotocopia del DPI del solicitante

# DOCUMENTOS - ESPECÍFICOS

F. Adjuntar los siguientes documentos específicos:

1. Representación legal – Hoja de la razón
2. Mandato – Hoja de la razón
3. Extranjero – Residencia – Fotocopia del pasaporte o constancia de migración

# PAGOS

G. Costos:

- Comerciante individual y empresa:
- Q.75 por inscripción de comerciante individual
- Q.100 por inscripción de empresa

- Empresa de sociedad:
- Q.100 por inscripción de empresa

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

**ANEXO #5**

**Carta enviada a la dirección de tecnologías de la información**

GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

RECIBIDO
FECHA 3 8 2016
HORA 9:08
P. Morales

PRONACOM
*Mejorando para Competir*

Guatemala 02 de Agosto de 2016
**PRONACOM-500-2016/AJRSM**

Ingeniero
Edy Cortés
**Dirección de Tecnologías de la Información**
**Ministerio de Economía**
Presente

Estimado Ingeniero Cortes:

Le deseo éxitos en sus actividades diarias y le extiendo un cordial saludo, por este medio solicito que la Dirección de Tecnologías de la Información, analice los términos de referencia de la contratación denominada "Servicios técnicos y estratégicos para la documentación, simplificación y automatización de trámites", requiriendo la emisión de un dictamen para llevar a cabo la contratación de la segunda fase del proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de sistemas para el Registro Mercantil y que abarcará lo relativo a los sistemas de:

1. Inscripción de empresa individual: Inscripción de empresa y comerciante individual o inscripción de empresas para sociedades mercantiles ya existentes.
2. Modificaciones de: a. nombre comercial, b. dirección comercial, c. dirección fiscal, d. reposición de patentes, e. ampliación de objeto, f. cambio de objeto, g. inscripción de sociedades extranjeras.
3. Inscripción de sociedades mercantiles de otros países que desean realizar actividades comerciales en Guatemala.
4. Cierre de empresas: Cierre de empresa individual.

El desarrollo facilitará la interacción del registro con sus usuarios y la solicitud de inscripción en línea de la misma forma que minegocio.gt funciona hoy en día en el proceso de inscripción de sociedades mercantiles. Como PRONACOM, nos aseguraremos de que se lleve a cabo la capacitación de por lo menos un informático, tal y como lo establece el contrato y estamos a su disposición para cualquier información que sea necesario recopilar durante la ejecución del proyecto.

La contratación directa de UNCTAD y el desarrollo de las herramientas electrónicas a través del sistema eRegistrations se aprobó en el año 2014 cumpliendo las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que dio la no objeción a esta contratación a través del oficio número CID/CGU-1544/2014. En esta segunda fase, con el fin de lograr la compatibilidad con el sistema desarrollado en el año 2015, la programación se hará en lenguaje Node.js y la base de datos a utilizar será mongoDB.

Adjunto los términos de referencia de la contratación, cuya primera fase fue culminada en el año 2015 y expongo que las fechas contenidas en dichos términos son fechas tentativas, que emergieron de la planificación del año 2015, pero que, por motivos de presupuesto, fueron retrasadas. Los términos no pueden modificarse dado que ya están aprobados por el BID, entidad que dio la no objeción según las políticas de ejecución del préstamo BID1734/OC-GU.

Agradezco su amabilidad y quedo en espera de su gestión y lineamientos,

José Fernando Santano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

13 calle 3-40 Zona 10
Edificio Atlantis tercer nivel
Guatemala, Guatemala
Tel. +502 2421-2464

www.pronacom.gt

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

# ANEXO #6
# TDR, PROGRAMA DE EMPLEO JUVENIL

GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

# TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Asesoría**
**Servicios Técnicos**

Actividad que realiza: **Auxiliar administrativo del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, DCI/ALA2011/023-514**
Renglón Presupuestario: 081 Fuente de Financiamiento: 11
Unidad Ejecutora: **105 Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales**
Partida Presupuestaria: **2016-11130011-105-00-12-00-000-005-081-0101-11-409-0039**
Lugar donde presta sus servicios: **Ministerio de salud pública y asistencia social**

## I. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:

"El Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala" DCI/ALA/2011/023-514, fue gestionado bajo la modalidad de operación descentralizada a través de un Administrador de anticipos y un contable de anticipos dentro de la Unidad de Gestión y constituida dentro de la estructura del Ministerio de Economía a través del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa.

El Gobierno de Guatemala con el apoyo de la Unión Europea, ha diseñado el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala en el marco de las políticas nacionales relacionadas a generación de empleo seguro, decente y de calidad, entre las que destacan la Política nacional de la juventud, La Política Nacional de Empleo, la Agenda de competitividad.

El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales, actúa como contraparte de varios Programas y Proyectos de apoyo, dentro de los cuales se encuentra el **"Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala"**, el cual busca mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes, a través de su incorporación al empleo formal de calidad; dicho empleo dignifica al ser humano al permitirle ofrecer a su familia un mejor nivel de vida, superando el umbral de la pobreza. Adicionalmente este programa apoya la implementación de la Política Nacional de Empleo "Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad 2012-2021 del Gobierno de Guatemala", la cual es una prioridad para el país.

Dentro del Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República de Guatemala, el Gobierno central se comprometió a otorgar una contrapartida al Programa de Generación de Empleo, la cual se encuentra contenida en el Artículo 3. FINANCIACIÓN DEL BENEFICIARIO, inciso 3.1: el beneficiario se compromete a cofinanciar el programa hasta un máximo de 2 millones de Euros, y recientemente este Programa está comenzando a funcionar y como contra parte se encuentra la partida presupuestaria para el pago de honorarios Técnicos y Profesionales.

En este sentido se ha determinado que, como apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, se requerirá de servicios técnicos de apoyo que se deben prestar en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia social para la debida operación de dictámenes de salud relacionados con las solicitudes de construcción que abarquen el tema del manejo de agua.

## II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Brindar un apoyo técnico en el procesamiento de expedientes de solicitud de dictamen del Ministerio de Salud en relación al sector construcción del país.

### A) ALCANCES DE LOS SERVICIOS

De acuerdo a lo expresado en estos Términos de Referencia, desarrollará sus actividades en función del cumplimiento del objetivo de la contratación, cumpliendo las siguientes condiciones:

**a).** Cumplir con los reglamentos, procedimientos y otras disposiciones internas y legales establecidas por las autoridades administrativas y financieras en relación a cualquier tipo de procedimiento que se realice o deba realizar dentro del cumplimiento del contrato.

**b).** Presentar informes periódicos de actividades desarrolladas de conformidad con el plan de trabajo y elaborar informes de avance y finales técnico-administrativos del Programa en cumplimiento a los términos de referencia.

**c).** Realizar el procesamiento de expedientes que le sean asignados de la forma en que le sea requerido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

### B) ACTIVIDADES A REALIZAR:

**a).** Apoyo en el procesamiento de expedientes de solicitud de dictamen del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;

**b).** Colaborar técnicamente con el encargado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el trámite de otorgamiento de dictámenes de construcción;

**c).** Colaborar técnicamente con la actualización de las bases de datos y archivo de los dictámenes emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

## III. PERFIL DEL TÉCNICO

### A) Formación Académica

- Estudiante universitario de las carreras de administración de empresas, ciencias jurídicas y sociales o arquitectura con el tercer semestre aprobado.

### B) Habilidades y otros conocimientos

- Conocimientos en el manejo de productos de Microsoft Office.
- Conocimientos básicos sobre sistemas de archivos digitales.
- Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de negociación.
- Experiencia de trabajo en equipo.

### C) Experiencia Laboral

- De preferencia experiencia en labores administrativas

## IV. CONDICIONES CONTRACTUALES

A) **Monto de Honorarios:** El Ministerio de Economía otorgará al Auxiliar Administrativo en concepto de honorarios por servicios técnicos, la cantidad total de **veintidós mil quinientos quetzales (Q. 22,500.00),** monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado –IVA-, y todos los impuestos vigentes y por establecerse.

B) **Forma de Pago:** un primer pago de **dos mil quinientos quetzales (Q.2,500.00)** y cuatro (4) pagos mensuales de **CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,000.00)** cada uno, contra la presentación del informe mensual y la factura contable.

C) **Plazo:** El periodo de contratación será del quince (15) de agosto al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

D) **Supervisión:** La supervisión será realizada por la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales.

E) **Informes a entregar:** Informes mensuales con las actividades realizadas.

Todos los informes que se originen serán propiedad exclusiva de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Ministerio de Economía –MINECO– y no podrán ser utilizados para ninguna otra actividad del técnico, ni cedidos por éste a terceras personas o empresas.

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

# ANEXO #7
# TDR DE ASESOR EN FACILITACIÓN DE COMERCIO E INVERSIÓN

**"ANEXO A"**
**TERMINOS DE REFERENCIA**
**Préstamo BID 1734/OC-GU**
**Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva**

**"Asesor en facilitación de comercio e inversión"**

## I. ANTECEDENTES:

El Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el 24 de Agosto de 2012, firmaron el Contrato de Préstamo No. 1734/OC-GU, para cooperar en la ejecución del Programa De Inversiones Estratégicas Y Transformación Productiva, con el objetivo general de apoyar los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando los niveles de productividad de la economía en general y de las empresas en particular. Su propósito es contribuir a levantar barreras que limitan el desarrollo empresarial, la creación de empleo, la inversión, y apuntalar los niveles de productividad de empresas pertenecientes a sectores y regiones o territorios considerados como prioritarios para el país.

Los objetivos específicos son:

i. Crear las condiciones propicias para fomentar las inversiones en sectores productivos del país y territorios priorizados con potencial de generar empleo;
ii. Mejorar el clima de inversión y de negocios en el entorno productivo privado
iii. Apoyar la estructuración de proyectos de inversión estratégica;
iv. Mejorar las capacidades de los actores departamentales o locales, públicos y privados, que les permitan liderar el proceso de transformación productiva hacia una mayor competitividad, y participar en la priorización, diseño e implementación de programas de desarrollo productivo y mejoramiento del entorno que contribuyan a promover la productividad de las empresas en el territorio, mejorar la equidad y profundizar la inclusión social.
v. Fortalecer la institucionalidad para brindar apoyos a empresas y encadenamientos productivos priorizados.

El PRONACOM, que se establece formalmente por medio del Acuerdo Gubernativo 306-2004, tiene la misión de liderar y posicionar una visión de país en el largo plazo, por medio de la articulación y confluencia de esfuerzos entre los gobiernos de distintos niveles, los empresarios, la academia y los trabajadores con el fin de alcanzar esa visión acordada.

El PRONACOM, por lo tanto, define en su estrategia de trabajo 2012-2021 un nuevo enfoque de esfuerzos que serán canalizados a través de acciones conjuntas de factores, políticas e instituciones con el fin de incrementar el nivel de productividad del país.

Como primer paso hacia el logro de los objetivos de PRONACOM, se toman como base los lineamientos establecidos en la Agenda Nacional de Competitividad Guatemala 2012-2021, la cual posiciona a Guatemala bajo los siguientes elementos como principios para la su ejecución:

- Como plataforma turística
- Como plataforma exportadora
- Como plataforma de logística y servicios
- Como centro energético y minero

Con acciones puntuales canalizadas dentro de estas áreas estratégicas se pretende impactar directamente a las plataformas de país por medio de la mejora del entorno productivo; de la creación de una cultura de gestión de proyectos en territorios con potencial competitivo, sectores de alto

crecimiento e inversiones estratégicas; y fortaleciendo el sistema marco de competitividad y Productividad.

La ventanilla Única de Inversión (VUI) es un proyecto del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Dependencia del Ministerio de Economía, que funcionará con fondos del Préstamo No. BID 1734/OG, el cual procurará la integración e interconexión de las diferentes instituciones públicas brindándole al inversionista un punto centralizado donde solicitar y tramitar los diferentes permisos y/o certificaciones requeridas para concretizar un proyecto de inversión en el país.

## II. OBJETIVO:

Documentar todo tipo de información y proponer cualquier acción destinada a la realización de la ventanilla única de inversión.

## III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

a. Asesorar y apoyar en la elaboración documentos técnicos y documentos legales para el proyecto de ventanilla única de inversión del componente 1 del Programa Nacional de Competitividad.
b. Analizar cualquier documento e información que sea necesaria para la realización del proyecto de ventanilla única de inversión.
c. Apoyar y asesorar en el seguimiento a las necesidades de desarrollos informáticos requeridos para el diseño, desarrollo e implementación de la ventanilla única de inversión.
d. Identificar y contactar a los actores principales que deban unirse al proyecto de ventanilla única de inversión.
e. Coordinar y participar en reuniones con los actores principales que deban unirse al proyecto de ventanilla única de inversión.
f. Determinar la información necesaria para la promoción del país y la información que sirva para solventar las demandas de información de los inversionistas en Guatemala.
g. Apoyo en la elaboración y realización de presentaciones sobre los proyectos y actividades del componente 1.
h. Realizar cualquier otra tarea relacionada al Programa Nacional de Competitividad según sea requerido.

## IV. PERFIL DEL ASESOR:

**Requisitos de Calificación y Experiencia:**

El Asesor seleccionado deberá cumplir con las siguientes calificaciones:

- **Formación Académica:** Profesional graduado en las carreras de ciencias jurídicas y sociales, administración de empresas, economía, relaciones internacionales, auditoría o ingeniería industrial.
- **Experiencia General:** Se ponderará la experiencia profesional en General por cada año de trabajo.
- **Experiencia Específica:**
  - ✓ Experiencia mínima de 1 año en formación de consensos, negociación o ventas.
  - ✓ Experiencia mínima de 1 año de trabajo en el sector empresarial o industrial.
  - ✓ Experiencia mínima de 1 año en atracción de inversión, desarrollo de emprendimientos o alianzas comerciales.
  - ✓ Experiencia mínima de 2 años en planificación, ejecución o diseño de: proyectos, páginas web o manuales empresariales.
  - ✓ Dominio del idioma inglés, escrito y hablado.
  - ✓ Capacidad de liderazgo y manejo de equipo, gran capacidad comunicativa, y para relacionarse con distintos sectores, y equipos multidisciplinarios.

- ✓ Buena capacidad de redacción de informes, manejo de Microsoft Windows, Microsoft Office, navegadores web, y otros.

## V. RESULTADOS E INFORMES ESPERADOS

El Asesor queda obligado a presentar los informes siguientes:

1. Informe sobre el diseño del proyecto de la ventanilla única de inversión en cuanto a los actores principales y benchmark del proyecto.
2. Informe sobre el diseño del proyecto de la ventanilla única de inversión en cuanto a la información requerida para los posibles inversionistas de cada sector productivo priorizado incluyendo el sector empresarial, industrial, médico, bancario y cualquier otro determinado por el coordinador del componente 1 del Pronacom y determinación de ventajas competitivas de cada departamento de Guatemala.
3. Informe sobre el diseño del proyecto de la ventanilla única de inversión en cuánto a la información requerida de cada inversionista extranjero y/o nacional que se registre en la ventanilla única de inversión.

## VI. CONDICIONES CONTRACTUALES:

a) **Monto del contrato:**
El monto total del contrato es de ***cincuenta y un mil quetzales (Q.51,000.00),*** el cual incluye todos los impuestos aplicables.

b) **Forma de Pago:**
Los pagos relacionados con la asesoria se harán de la siguiente manera: tres pagos mensuales de **diecisiete mil quetzales exactos (Q17,000.00) cada uno.** Los pagos se harán contra entrega de los informes antes indicados en el numeral V de estos términos de referencia.

c) **Plazo:**
El plazo de la Asesoría será del 1 de abril al 31 de diciembre de 2016.

d) **Aprobación de los Informes:**
La aprobación de los Informes, avances y facturas, contemplados en este contrato estará a cargo del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, previa revisión del área técnica.

e) **De la presentación de los informes: Para cada pago deberá presentarse lo siguiente:**
- Informes para cada uno de los pagos
- Certificación de Recepción a satisfacción

La información debe presentarse Impresa, en original en folder con gancho y una copia en digital (CD o DVD Editable).

Los costos o gastos adicionales en concepto de viáticos, boletos aéreos y gastos conexos que pudieran derivarse de la prestación de los servicios bajo la observancia de los Términos de Referencia, serán cubiertos con recursos del Programa, en términos previamente acordados con el Banco u otra fuente de financiamiento que el Ministerio de Economía asigne.

Términos de Referencia aprobados por:

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-020-2016
Renglón de contratación 081 Fuente 52

# ANEXO #8
# TDR DE ASESOR EN ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE INICIATIVAS Y PROYECTOS DE LEY

GUATEMALA
MINISTERIO DE ECONOMÍA

PRONACOM
Mejorando para Competir

**"ANEXO A"**
**TERMINOS DE REFERENCIA**
**Préstamo BID 1734/OC-GU**
**Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva**

**"Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley"**

## I. ANTECEDENTES:

El Gobierno de la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el 24 de Agosto de 2012, firmaron el Contrato de Préstamo No. 1734/OC-GU, para cooperar en la ejecución del Programa De Inversiones Estratégicas Y Transformación Productiva, con el objetivo general de apoyar los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando los niveles de productividad de la economía en general y de las empresas en particular. Su propósito es contribuir a levantar barreras que limitan el desarrollo empresarial, la creación de empleo, la inversión, y apuntalar los niveles de productividad de empresas pertenecientes a sectores y regiones o territorios considerados como prioritarios para el país.

Los objetivos específicos son:

i. Crear las condiciones propicias para fomentar las inversiones en sectores productivos del país y territorios priorizados con potencial de generar empleo;
ii. Mejorar el clima de inversión y de negocios en el entorno productivo privado
iii. Apoyar la estructuración de proyectos de inversión estratégica;
iv. Mejorar las capacidades de los actores departamentales o locales, públicos y privados, que les permitan liderar el proceso de transformación productiva hacia una mayor competitividad, y participar en la priorización, diseño e implementación de programas de desarrollo productivo y mejoramiento del entorno que contribuyan a promover la productividad de las empresas en el territorio, mejorar la equidad y profundizar la inclusión social.
v. Fortalecer la institucionalidad para brindar apoyos a empresas y encadenamientos productivos priorizados.

El PRONACOM, que se establece formalmente por medio del Acuerdo Gubernativo 306-2004, tiene la misión de liderar y posicionar una visión de país en el largo plazo, por medio de la articulación y confluencia de esfuerzos entre los gobiernos de distintos niveles, los empresarios, la academia y los trabajadores con el fin de alcanzar esa visión acordada.

El PRONACOM, por lo tanto, define en su estrategia de trabajo 2012-2021 un nuevo enfoque de esfuerzos que serán canalizados a través de acciones conjuntas de factores, políticas e instituciones con el fin de incrementar el nivel de productividad del país.

Como primer paso hacia el logro de los objetivos de PRONACOM, se toman como base los lineamientos establecidos en la Agenda Nacional de Competitividad Guatemala 2012-2021, la cual posiciona a Guatemala bajo los siguientes elementos como principios para la su ejecución:

- Como plataforma turística
- Como plataforma exportadora
- Como plataforma de logística y servicios
- Como centro energético y minero

Con acciones puntuales canalizadas dentro de estas áreas estratégicas se pretende impactar directamente a las plataformas de país por medio de la mejora del entorno productivo; de la creación de una cultura de gestión de proyectos en territorios con potencial competitivo, sectores de alto crecimiento e inversiones estratégicas; y fortaleciendo el sistema marco de competitividad y Productividad.

## II. OBJETIVO DE LA ASESORÍA:

Realizar acciones de análisis y difusión de los proyectos de reforma o iniciativa de ley, que impacten el Doing Business y que han sido establecidos por el Programa Nacional de Competitividad. Desarrollando estrategias y brindando recomendaciones que tengan como fin la promulgación de dichas normas.

## III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

a. Analizar los proyectos de reforma o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM y cualquier otro documento legal o técnico requerido para la realización de los productos.
b. Realizar presentaciones a las personas, instituciones y actores claves seleccionadas a criterio del asesor o por el PRONACOM con el fin de promover la promulgación de los proyectos o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM.
c. Generar material de difusión y coordinar la transmisión del mismo hacia actores claves que pueden incidir en la promulgación de los proyectos o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM.
d. Asesorar técnica y estratégicamente a las autoridades del PRONACOM sobre temas relacionados al estatus y progreso de los proyectos de reforma o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM.
e. Comunicar al asesor para la mejora de indicadores internacionales sobre el avance de los proyectos o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM. Toda comunicación deberá hacerse en concordancia con los fines del componente 1 del PRONACOM.
f. Concretar reuniones y coordinar mesas de trabajo que tiendan a impulsar los proyectos de reforma o iniciativa de ley establecidos por el PRONACOM con el fin de que se logré la promulgación de los mismos.

## IV. PERFIL DEL ASESOR:

**Requisitos de Calificación y Experiencia:**
El Asesor seleccionado deberá cumplir con las siguientes calificaciones:

**Formación Académica:**
Profesional graduado en la carrera de Derecho. Se dará punteo extra a los candidatos que tengan concluida una maestría en Negociación Internacional, Mediación, Arbitraje, Administración Pública o temas relacionados.

**Experiencia General:**
- Se ponderará la experiencia profesional en General por cada año de trabajo.

**Experiencia Específica:**
- Experiencia mínima de 5 años en Asesoría legal
- Experiencia mínima de 5 años relacionados con el análisis o elaboración de normativas.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de trabajo, negociación o formación de consensos.

**Deseable pero no indispensable:**
- Poseer o conocimiento relacionado a la gestión, negociación o ejecución de proyectos en el organismo legislativo.
- Experiencia en asesoría en el Organismo Legislativo o Exdiputado.

## V. PRODUCTOS DE LA ASESORÍA:

**PRODUCTO 1**
**Análisis jurídico de normativas y delimitación de la situación actual de las mismas.**
Análisis de los proyectos de reforma o iniciativa de ley, que establezca el Programa Nacional de Competitividad delimitando la situación legal actual de cada proyecto. Desarrollo de una estrategia que tenga como fin la promulgación de cada uno de los proyectos y que incluya: nombre del proyecto, comisión del congreso que debe conocer, importancia legal, puntos políticos favorables, estrategia de negociación con bancadas, partes fundamentales de cada proyecto, propuesta de inclusión de artículos en los proyectos para su fortalecimiento, priorización de los proyectos en torno a su impacto en indicadores y a la posibilidad de su promulgación y pasos a seguir por cada proyecto. Al realizar este producto el asesor deberá tomar en cuenta el producto 1 denominado "Análisis Legal de Normativa y Plan de Impacto Al Doing Business" del Asesor de impacto legislativo en indicadores internacionales del PRONACOM.

**PRODUCTO 2**
**Evaluación de acciones realizadas y recomendaciones finales**
Delimitación de las acciones de difusión realizadas para procurar la promulgación de cada proyecto de reforma o iniciativa de ley, situación final de cada proyecto, las modificaciones en el articulado de cada

**CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMES**

Por este medio hago **CONSTAR** que he recibido y leído el informe abajo indicado de los servicios prestados dentro de la contratación titulada:

***Asesor técnico para la Difusión de Derecho al Consumidor***
Nombre o título de los servicios de asesoría

Que realizó:

***Ana Paulina Boesche Quan***
Nombre de la persona contratada

Como parte de los servicios de asesoría prestados al Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el cual recibo a entera conformidad porque cumplen con los Términos de Referencia del Contrato No.: ***BID 1734/OC-GU-AI-023-2016***

Por lo que se solicita trasladar a donde corresponda para continuar con el proceso respectivo de pago, por la cantidad de: ***Q. 7,500.00***

Se adjunta el informe No. **4**
Titulado:
***"Informe sobre Informe sobre plan de trabajo y estrategia para lograr los objetivos de capacitación, en cumplimiento con la estrategia de etiquetado y publicidad engañosa."***

Impreso en: ***8 hojas*** (Cantidad en hojas) **SI** (Indicar si se adjunta en CD)

Fecha de entrega del informe: ***31 de agosto de 2016***

Aprobación del informe:

Jose Fernando Suriano Suarez
Director Ejecutivo
PRONACOM

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-023-2016
Renglón de contratación 081

**LOGROS OBTENIDOS:**

1. Se obtuvieron evidencias de la capacitación al ejército (Brigada Mariscal Zavala, Brigada de la Guardia de Honor y Segunda Brigada de San Juan Sacatepéquez), estudiantes universitarios (USAC), estudiantes de nivel secundario (Instituto Tecún Uman e Instituto Nacional de Educación Básica Miller Rock) y algunos colaboradores del Instituto Tecún Uman (fotografías, listados y presentaciones utilizadas). (ver anexo 1)

2. Por medio de la capacitación presencial al ejército (Brigada Mariscal Zavala, Brigada de la Guardia de Honor y Segunda Brigada de San Juan Sacatepéquez), estudiantes universitarios (USAC), estudiantes de nivel secundario (Instituto Tecún Uman e Instituto Nacional de Educación Básica Miller Rock) y algunos colaboradores del Instituto Tecún Uman, se logró la capacitación de **1,592 personas para el mes de Agosto.**

3. Cuadro de detalle sobre instituciones a capacitar y aproximado de personas a capacitar y meses en los que se estarán llevando dichas capacitaciones para alcanzar los objetivos establecidos al inicio del proyecto de difusión de los derechos del consumidor. (Ver anexo 2)

**Ana Paulina Boesche Quan**

**Aprobado por:**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

*Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-023-2016*
*Renglón de contratación 081*

**PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**INFORME AGOSTO DE 2016**

Para: Señor Director, José Fernando Suriano Buezo, Programa Nacional de Competitividad

De: **Ana Paulina Boesche Quan**

Nombre de Asesoría: **Asesor Técnico para la Difusión de Derecho al Consumidor**

Asunto: Informe de Actividades #4

Fecha: 31 de Agosto de 2016

Señor Director:

De manera atenta y respetuosa, describo las actividades realizadas durante el mes de Agosto de 2016 y logros obtenidos.

**Informe # 4**

Informe de seguimiento a la Estrategia Etiquetado y Publicidad Engañosa.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**
**(Los logros obtenidos en cada actividad se presentan en el siguiente título)**

1. Se llevaron a cabo once capacitaciones sobre derechos del consumidor en diversas instituciones a fin de llegar a un público amplio y variado en edades, nivel educativo y socioeconómico.

2. Se estableció el número de personas capacitadas en el tema de derechos del consumidor y labores de DIACO para el mes de Agosto.

3. Se elaboró un cuadro de proyecciones para próximas capacitaciones.

**LOGROS OBTENIDOS:**

1. Se obtuvieron evidencias de la capacitación al ejército (Brigada Mariscal Zavala, Brigada de la Guardia de Honor y Segunda Brigada de San Juan Sacatepéquez), estudiantes universitarios (USAC), estudiantes de nivel secundario (Instituto Tecún Uman e Instituto Nacional de Educación Básica Miller Rock) y algunos colaboradores del Instituto Tecún Uman (fotografías, listados y presentaciones utilizadas). (ver anexo 1)

2. Por medio de la capacitación presencial al ejército (Brigada Mariscal Zavala, Brigada de la Guardia de Honor y Segunda Brigada de San Juan Sacatepéquez), estudiantes universitarios (USAC), estudiantes de nivel secundario (Instituto Tecún Uman e Instituto Nacional de Educación Básica Miller Rock) y algunos colaboradores del Instituto Tecún Uman, se logró la capacitación de **1,592 personas para el mes de Agosto.**

3. Cuadro de detalle sobre instituciones a capacitar y aproximado de personas a capacitar y meses en los que se estarán llevando dichas capacitaciones para alcanzar los objetivos establecidos al inicio del proyecto de difusión de los derechos del consumidor**.** (Ver anexo 2)

**Ana Paulina Boesche Quan**

**Aprobado por:**

## ANEXO 1

# FOTOGRAFÍAS, LISTADOS Y PRESENTACIONES DE CAPACITACIÓN EN UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

1. **Fotografías de capacitaciones realizadas:**
    a. **Ejército de Guatemala (Mariscal Zavala, Guardia de Honor y Segunda Brigada de San Juan Sacatepéquez)**

## b. Universidad de San Carlos de Guatemala

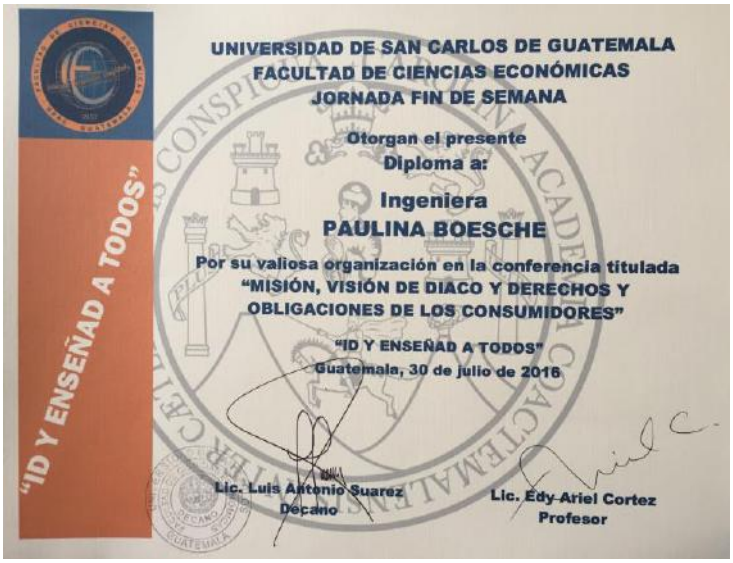
"ID Y ENSEÑAD A TODOS"
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
JORNADA FIN DE SEMANA
Otorgan el presente
Diploma a:
Ingeniera
PAULINA BOESCHE
Por su valiosa organización en la conferencia titulada
"MISIÓN, VISIÓN DE DIACO Y DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES"
"ID Y ENSEÑAD A TODOS"
Guatemala, 30 de julio de 2016
Lic. Luis Antonio Suarez
Decano
Lic. Edy Ariel Cortez
Profesor

## c. Instituto Tecun Uman y Miller Rock

**2. Listado de participantes en capacitaciones. (Adjunto)**

***a. NOTA: en el caso de los institutos y escuelas, debido a que los participantes son menores de edad y por la cantidad de personas capacitadas, la institucion proveyó listados impresos de los participantes y una constancia que avala la realización de los talleres.***

3. **Oficios que hacen constar que las capacitaciones se llevaron a cabo en los centros educativos de menores de edad. (Adjunto)**

4. **Presentación utilizada en las capacitaciones. (Adjunta en formato .pptx en CD de informe)**

## a. Derechos del consumidor

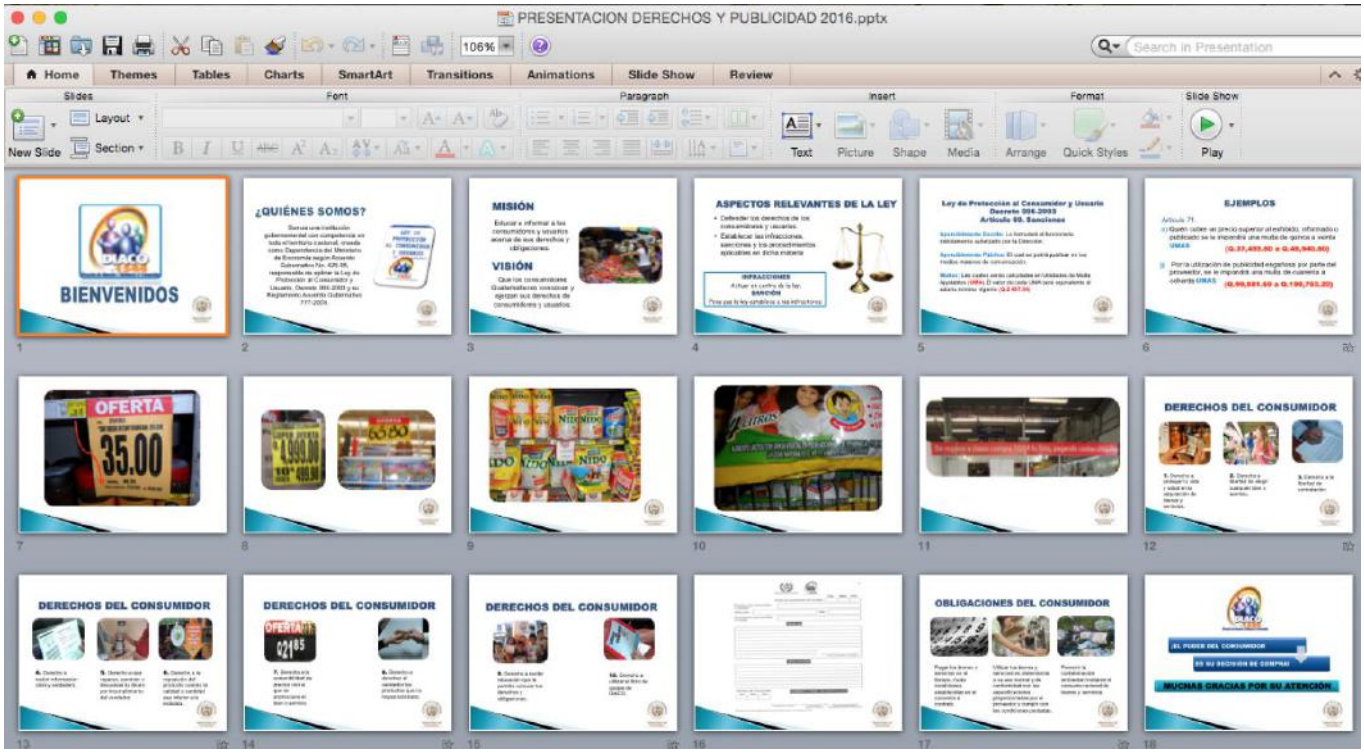


## ANEXO 2
## PROYECCIONES DE PRÓXIMAS CAPACITACIONES

| Institución | Proyección de cantidad de personas a capacitar | Meses en los que se estarán llevando a cabo las capacitaciones |
|---|---|---|
| Escuela Nacional Central de Formación Secretarial | 246 | Agosto |
| Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales | 1,100 | Agosto y Septiembre |
| Instituto Nacional Central de Mercadotecnia y Publicidad | 629 | Agosto |

| | | |
|---|---|---|
| Escuela Oficial Urbana Mixta Francisco Morazán | 235 | Agosto |
| Total de proyecciones | | 2,210 personas |
| Capacitados de Junio y Julio | | 60 personas |
| Capacitados de Agosto | | 1,592 personas |
| **Proyeccion de acumulado de capacitaciones al finalizar el proyecto de capacitaciones** | | **3,862 personas** |

## Impresiones:

- **Conclusiones:**
  - Por medio de la capacitación presencial en la Universidad del Valle de Guatemala, se logró la capacitación de 1,592 personas en temas de derechos del consumidor y labores de DIACO para el mes de Agosto.
  - Se cumplió con el derecho al consumidor No. 9 sobre la difusión y conocimiento de la información de los derechos del consumidor.
- **Recomendaciones:** Seguir el programa de difusión dirigido a jóvenes, ya que en ellos se pudo encontrar un interés creciente sobre la información difundida en las capacitaciones dadas.
- **Detalle del apoyo proporcionado a las actividades definidas en la estrategia:** conforme se determinó en la estrategia, se buscó el apoyo de medios de comunicación para la difusión de los derechos del consumidor. Además se fortaleció con capacitaciones presenciales a modo de cumplir los objetivos planteados.

## CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMES

Por este medio hago **CONSTAR** que he recibido y leído el informe abajo indicado de los servicios prestados dentro de la contratación titulada:

***Asesor en Monitoreo y Evaluación***
Nombre o título de los servicios de asesoría

Que realizó:

***Devora Emperatris Meza Orellana***
Nombre de la persona contratada

Como parte de los servicios de asesoría prestados al Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el cual recibo a entera conformidad porque cumplen con los Términos de Referencia del Contrato No.:

***BID1734/OC-GU-AI-035-2016***

Por lo que se solicita trasladar a donde corresponda para continuar con el proceso respectivo de pago, por la cantidad de: ***Q 17,000.00***

Se adjunta el producto ***No. 1***
Titulado:
***Informe correspondiente al mes de agosto de 2016***

- Impreso en: ***25*** (Cantidad en hojas) ***SI*** (Indicar si se adjunta en CD)

Fecha de entrega del producto: ***31 de Agosto de 2016***

Aprobación del Producto:

José Fernando Soriano Báez
Director Ejecutivo
PRONACOM

MULTISERVICIOS INFORMÁTICOS DMG

**DEVORA EMPERATRIS MEZA ORELLANA**

7A. Calle 34-61 Zona 7, Tikal 2, Guatemala,Guatemala.

E-Mail.: devorameza@gmail.com

**NIT.: 3124465-3**

**FACTURA SERIE D**

**Nº 0022**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 08 | 2016 |

NOMBRE: Programa Nacional de Competitividad

DIRECCION: 13 c. 3-40 Zona 10, Edif. Atlantis 3er niv. Guatemala Guatemala NIT.: 8361469-9

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| | Por servicios profesionales prestados al Ministerio de Economía, Programa Nacional de Competitividad, según Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-035-2016 del préstamo BID1734/OC-GU correspondiente al mes de Agosto de 2016 | 17,000- |
| | CANCELADA | |

SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

Total en Letras: Diecisiete mil exactos

TOTAL Q 17,000-

AUT SEG RES 2015-5-20149-21555 DEL 10-02-2015 DEL 001 AL 025 02-2015/ IMPRENTA Y SERVICIOS RUIZ MJ.

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO: CONTABILIDAD

**COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA**
7.ª avenida 39-60, zona 8, PBX: (502) 2218-2600
e-mail: juntadirectiva@cig.org.gt / Guatemala, C.A.
www.cig.org.gt

*SERIE 2015 - 2017*

No. 0533116

# *CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO*

Colegio de Ingeniero
Caja
Elías Gutiérrez

***La infrascrita, Secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Guatemala, hace constar que***

Ingeniero(a) en Ciencias y Sistemas
Maestro en Formulación y Evaluación de Proyectos

**DEVORA EMPERATRIS MEZA ORELLANA**

***Colegiado(a)*** 8469 ***se encuentra activo(a) de conformidad con el Artículo 5, Decreto 72-2001 del Congreso de la República, Ley de Colegiación Profesional obligatoria, hasta el día*** 30/11/2016 ***Con fecha de colegiación*** 25/06/2007

***Guatemala,*** 4 de Agosto de 2016

Devora Emperatris Meza Orellana
Colegiado No. 8469
Ingeniera en Ciencias y Sistemas

(f): _____
***Murphy Olympo Paiz Recinos***
*Ingeniero Civil*
*Presidente*
*Junta Directiva 2015-2017*

(f): _____
***Sonia Aparicia García Pérez***
*Ingeniera Industrial*
*Secretaria*
*Junta Directiva 2015-2017*

(f): _____
***Firma y sello del colegiado***

El(la) colegiado(a) firma y sella la presente como constancia de su autenticidad y de la responsabilidad que asume por el uso que pueda dársele. Esta constancia es válida únicamente si está firmada y sellada por el receptor autorizado por el Colegio de Ingenieros de Guatemala.

Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-035-2016
Renglón 081 Fuente 52

**PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD**
**MINISTERIO DE ECONOMÍA**

**INFORME DEL MES DE AGOSTO 2016**

**Para:** Lic. José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Competitividad

**De:** Ing. Devora Emperatris Meza Orellana

**Nombre de Asesoría:** Asesora en Monitoreo y Evaluación

**Asunto:** Informe mensual

**Fecha:** 31 de Agosto de 2016

**Estimado Director:**

De manera atenta y respetuosa, describo a continuación las actividades realizadas durante el mes de AGOSTO 2016 y logros obtenidos.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**a)** Se actualizó el Plan de Ejecución del Programa (PEP+) el cual diariamente sufre cambios según la planificación inicial, específicamente de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 (Ver Anexo 1).

**b)** Se dio seguimiento a las diversas actividades de los componentes del préstamo BID1734/OC-GU, para mantener el control de la ejecución eficiente de los proyectos designados a ejecutarse en el actual ejercicio fiscal.

**c)** Se gestionó usuario y acceso para realizar el reporte del avance físico y financiero en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), específicamente del proyecto 0140102 "Análisis para promover inversiones estratégicas y transformación productiva de Guatemala".

**d)** Se reportó ante el Ministerio de Finanzas, Informe Financiero de Crédito Publico de Trabajo al 31 de Julio 2016 (Ver Anexo 2).

**e)** Se participó en reuniones de trabajo semanalmente con los Coordinadores de cada componente para la actualización de herramienta digital y el monitoreo de los avances en cada producto o adquisiciones que se encuentran en proceso, así como las solicitudes de apoyo que se necesite para su ejecución en el actual ejercicio fiscal.

**f)** Se obtuvo información sobre los procesos y actividades de los diferentes Componentes del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.

**g)** Se brindó asesoría y apoyo en otras actividades requeridas por la Dirección y Subdirección del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM).

**h)** Se dio seguimiento a la entrega de Términos de Referencia (TdR) que darán origen a las contrataciones y recontrataciones de asesores, consultores y/o firmas consultoras, para dar inicio al proceso de contratación de proyectos a ejecutarse dentro del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) en el ejercicio fiscal 2016.

**Principales logros obtenidos**

**a)** Se actualizó diariamente el Plan de Ejecución del Programa (PEP+) el cual contribuye al seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas en el mismo, específicamente del ejercicio fiscal 2016 (Ver Anexo 1).

**b)** Se realizó el Informe de Avance Físico Financiero para Crédito Público de los componentes que integran el préstamo BID1734/OC-GU (Ver Anexo 2).

**Ing. Devora Emperatris Meza Orellana**

**Aprobado por**

José Fernando Suriano Buezo
Director Ejecutivo
PRONACOM

# ANEXO No. 1

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PEP_SMART_1734 | 3426 días? | mié 03/05/06 | vie 30/08/19 | NOD | | $21,605,490 |
| 1 | **Componente 1** | 1341.13 | lun 02/09/1 | lun 17/12/18 | NOD | | $1,558,159 |
| 2 | **Sistemas de trámites para mejorar clima de negocios diagnosticado, pr** | 216 días | mar 23/02/ | jue 22/12/16 | NOD | | $304,141 |
| 3 | **Proceso de Contratación: Experto para análisis informático y** | 214 días | mar | mar | NOD | | $9,351 |
| 4 | **Etapa de Adquisición** | 96 días | mar 23/02/ | vie 01/07/16 | vie 01/07/... | | $0 |
| 5 | TDR Presentados | 3 días | mar 23/02/ | jue 25/02/16 | jue 25/02/16 | | $0 |
| 6 | NOB a la Adjudicación | 6 días | vie 26/02/1 | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | 5 | $0 |
| 7 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 87 días | lun 07/03/1 | vie 01/07/16 | vie 01/07/16 | 6 | $0 |
| 8 | **Etapa de Ejecución de pagos** | 118 días | lun 04/07/1 | mar 20/12/16 | NOD | 4 | $9,351 |
| 9 | (P1) Plan de trabajo de la asesoría | 48 días | lun 04/07/1 | vie 09/09/16 | vie 09/09/16 | 7 | $0 |
| 10 | (P2) Informe de cobertura del proceso | 28 días | lun 12/09/1 | vie 21/10/16 | NOD | 9 | $4,156 |
| 11 | (P3) DERCAS del proceso de licencias de construcción | 42 días | lun 24/10/1 | mar 20/12/16 | NOD | 10 | $5,195 |
| 12 | **Proceso de Contratación: Asesor técnico en Automatización de Trán** | 210.88 d | mar 01/03/ | jue 22/12/16 | NOD | | $11,690 |
| 13 | **Etapa de Adquisición** | 42.88 día | mar 01/03/ | mar 26/04/16 | mar 26/04... | | $0 |
| 14 | TDR Presentados | 12.88 día | mar 01/03/ | mar 15/03/16 | mar 15/03... | | $0 |
| 15 | NOB a la Adjudicación | 6 días | vie 01/04/1 | vie 08/04/16 | vie 08/04/16 | | $0 |
| 16 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 12 días | lun 11/04/1 | mar 26/04/16 | mar 26/04... | 15 | $0 |
| 17 | **Etapa de Ejecución de pagos** | 186 días | vie 01/04/1 | jue 22/12/16 | NOD | 13 | $11,690 |
| 18 | Informe 1 | 21 días | vie 01/04/1 | mar 17/05/16 | mar 17/05... | 16 | $0 |
| 19 | Informe 2 | 22 días | dom 01/05/ | mié 08/06/16 | mié 08/06/... | 18 | $0 |
| 20 | Informe 3 | 21 días | mié 01/06/1 | mié 29/06/16 | mié 29/06/... | 19 | $0 |
| 21 | Informe 4 | 42 días | vie 01/07/1 | mié 31/08/16 | mié 31/08/... | 20 | $0 |
| 22 | Informe 5 | 21 días | jue 01/09/1 | vie 30/09/16 | NOD | 21 | $2,338 |
| 23 | Informe 6 | 21 días | jue 01/09/1 | vie 30/09/16 | NOD | | $2,338 |
| 24 | Informe 7 | 20 días | lun 03/10/1 | lun 31/10/16 | NOD | 23 | $2,338 |
| 25 | Informe 8 | 21 días | mié 02/11/1 | mié 30/11/16 | NOD | 24 | $2,338 |

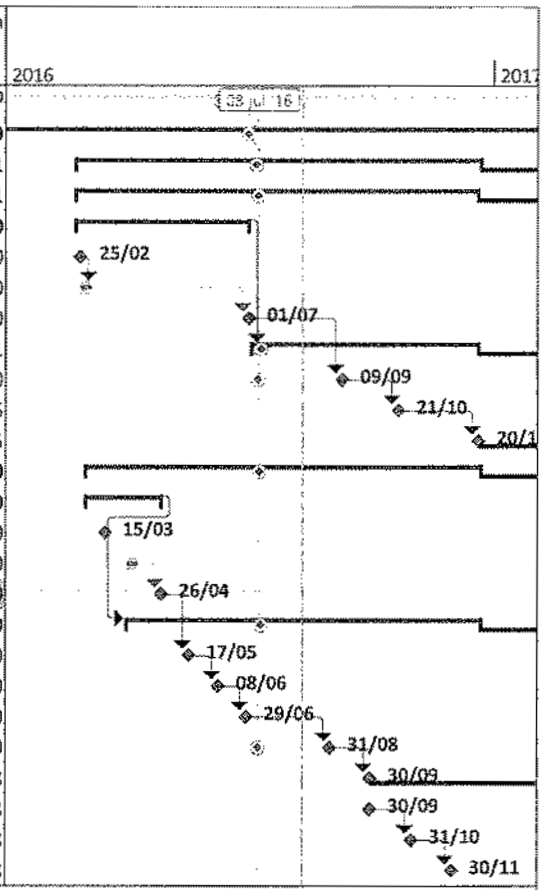


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Task | | External Tasks | | Manual Task | | Finish-only | |
| Split | | External Milestone | | Duration-only | | Deadline | |
| Milestone | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | Progress | |
| Summary | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Progreso manual | |
| Project Summary | | Inactive Summary | | Start-only | | Margen de demora | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Informe 9 | 16 días | jue 01/12/1 | jue 22/12/16 | NOD | 25 | $2,338 |
| 27 | **Proceso de Adquisición: UNCTAD (Fase II - Minegocio.gt)** | **125 días** | **lun 27/06/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **206** | **$283,100** |
| 28 | **Etapa de Adquisición** | **40 días** | **lun 27/06/1** | **mar 23/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 29 | Proceso de Adquisición realizado 2016 | 10 días | lun 27/06/1 | vie 08/07/16 | vie 08/07/16 | | $0 |
| 30 | NOB a la Adjudicaciòn | 10 días | lun 11/07/1 | vie 22/07/16 | vie 22/07/16 | | $0 |
| 31 | Delegación de Firma | 12 días | mié 27/07/1 | vie 12/08/16 | NOD | 30 | $0 |
| 32 | Firma del Contrato | 3 días | mar 16/08/ | jue 18/08/16 | NOD | | $0 |
| 33 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | vie 19/08/1 | mar 23/08/16 | NOD | 32 | $0 |
| 34 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **85 días** | **mié 24/08/** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **28** | **$283,100** |
| 35 | Producto 1 | 9 días | mié 24/08/1 | lun 05/09/16 | NOD | 33 | $0 |
| 36 | Producto 2 | 9 días | mar 06/09/ | lun 19/09/16 | NOD | 35 | $0 |
| 37 | Producto 3 | 9 días | mar 20/09/ | vie 30/09/16 | NOD | 36 | $35,000 |
| 38 | Producto 4 | 9 días | lun 03/10/1 | vie 14/10/16 | NOD | 37 | $98,000 |
| 39 | Producto 5 | 9 días | lun 17/10/1 | jue 27/10/16 | NOD | 38 | $0 |
| 40 | Producto 6 | 9 días | vie 28/10/1 | mié 09/11/16 | NOD | 39 | $0 |
| 41 | Producto 7 | 9 días | jue 10/11/1 | mar 22/11/16 | NOD | 40 | $110,300 |
| 42 | Producto 8 | 9 días | mié 23/11/1 | lun 05/12/16 | NOD | 41 | $0 |
| 43 | Producto 9 | 9 días | mar 06/12/ | vie 16/12/16 | NOD | 42 | $39,800 |
| 44 | Producto 10 | 4 días | lun 19/12/1 | jue 22/12/16 | NOD | 43 | $0 |
| 45 | **Plan Nacional de Logística elaborado e implementado** | **505 días** | **lun 01/08/1** | **vie 10/08/18** | **NOD** | | **$609,416** |
| 46 | Estrategia del plan | 20 días | lun 01/08/1 | lun 29/08/16 | NOD | | $0 |
| 47 | Elaboración de TDRS | 22 días | mar 30/08/ | jue 29/09/16 | NOD | 46 | $0 |
| 48 | **Proceso de Adquisición: Implementación del Plan Nacional de** | **419** | **vie** | **vie 10/08/18** | **NOD** | | **$609,416** |
| 49 | **Contratación 2017** | **298 días** | **vie 02/12/1** | **jue 15/02/18** | **NOD** | | **$284,740** |
| 60 | **Contratación 2018** | **298 días** | **jue 01/06/1** | **vie 10/08/18** | **NOD** | | **$324,675** |
| 71 | **Trámites actualizados y simplificados a través de la Plataforma** | **251.88** | **lun** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$39,200** |

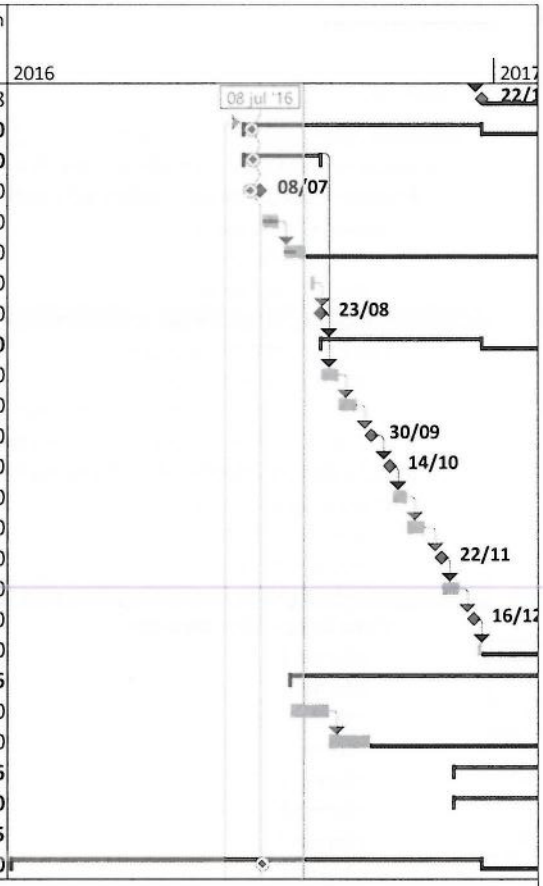


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **Asesor 1 para la documentación y simplificación de trámites** | **251.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$19,601** |
| 73 | **Proceso de Contratación: Asesor 1 (Valladares) para la documenta** | **58.88 día** | **lun 04/01/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | | **$5,185** |
| 74 | **Etapa de Adquisición** | **20 días** | **lun 04/01/1** | **lun 01/02/16** | **lun 01/02/...** | | **$0** |
| 75 | TDR Presentados | 5 días | lun 04/01/1 | lun 11/01/16 | lun 11/01/16 | | $0 |
| 76 | NOB a la Adjudicación | 5 días | lun 11/01/1 | lun 18/01/16 | lun 18/01/16 | 75 | $0 |
| 77 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 10 días | lun 18/01/1 | lun 01/02/16 | lun 01/02/16 | 76 | $0 |
| 78 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **38.88 día** | **lun 01/02/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | **74** | **$5,185** |
| 79 | Producto 1 | 12.88 día | lun 01/02/1 | mié 17/02/16 | mié 17/02/... | 77 | $2,084 |
| 80 | Producto 2 | 26 días | jue 18/02/1 | mar 22/03/16 | mar 22/03... | 79 | $3,101 |
| 81 | **Proceso de Contratación: Asesor 1 (Valladares) para la** | **223 días** | **vie** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$14,416** |
| 82 | **Etapa de Adquisición** | **45 días** | **vie 12/02/1** | **mar 12/04/16** | **mar 12/04...** | | **$0** |
| 83 | TDR Presentados | 7 días | vie 12/02/1 | lun 22/02/16 | lun 22/02/16 | | $0 |
| 84 | NOB a la Adjudicación | 9 días | mar 23/02/: | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | 83 | $0 |
| 85 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 29 días | lun 07/03/1 | mar 12/04/16 | mar 12/04... | 84 | $0 |
| 86 | Etapa de Ejecución de pagos | **178 días** | **mié 13/04/:** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **82** | **$14,416** |
| 87 | (P1) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 10 días | mié 13/04/1 | mar 26/04/16 | mar 26/04... | 85 | $1,948 |
| 88 | (P2) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | mié 27/04/1 | mié 25/05/16 | mié 25/05/... | 87 | $2,208 |
| 89 | (P3) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 26/05/1 | jue 23/06/16 | jue 23/06/16 | 88 | $2,078 |
| 90 | (P4) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | vie 24/06/1 | vie 22/07/16 | vie 22/07/16 | 89 | $0 |
| 91 | (P5) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | mar 26/07/: | mié 24/08/16 | mié 24/08/... | 90 | $0 |
| 92 | (P6) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 25/08/1 | vie 23/09/16 | NOD | 91 | $2,468 |
| 93 | (P7) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | lun 26/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 92 | $1,818 |
| 94 | (P8) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | mié 26/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 93 | $2,078 |
| 95 | (P9) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 94 | $1,818 |
| 96 | **Asesor 2 para la documentación y simplificación de trámites** | **251.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$19,599** |
| 97 | **Proceso de Contratación: Asesor 2 (Oropin) para la documentació** | **58.88 día** | **lun 04/01/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | | **$5,183** |

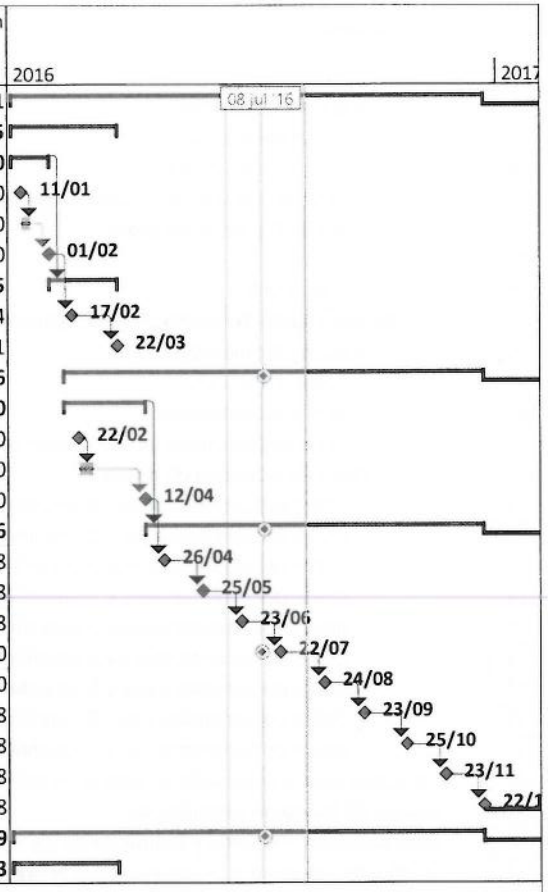


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | **Etapa de Adquisición** | **20 días** | **lun 04/01/1** | **lun 01/02/16** | **lun 01/02/...** | | **$0** |
| 99 | TDR Presentados | 5 días | lun 04/01/1 | lun 11/01/16 | lun 11/01/16 | | $0 |
| 100 | NOB a la Adjudicación | 5 días | lun 11/01/1 | lun 18/01/16 | lun 18/01/16 | 99 | $0 |
| 101 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 10 días | lun 18/01/1 | lun 01/02/16 | lun 01/02/16 | 100 | $0 |
| 102 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **38.88 día** | **lun 01/02/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | **98** | **$5,183** |
| 103 | Producto 1 | 12.88 día | lun 01/02/1 | mié 17/02/16 | mié 17/02/... | 101 | $2,083 |
| 104 | Producto 2 | 18 días | jue 18/02/1 | mar 22/03/16 | mar 22/03... | 103 | $3,101 |
| 105 | **Proceso de Contratación: Asesor 2 (Oropin) para la documentació** | **223 días** | **vie 12/02/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$14,416** |
| 106 | **Etapa de Adquisición** | **45 días** | **vie 12/02/1** | **mar 12/04/16** | **mar 12/04...** | | **$0** |
| 107 | TDR Presentados | 7 días | vie 12/02/1 | lun 22/02/16 | lun 22/02/16 | | $0 |
| 108 | NOB a la Adjudicación | 9 días | mar 23/02/ | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | 107 | $0 |
| 109 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 29 días | lun 07/03/1 | mar 12/04/16 | mar 12/04... | 108 | $0 |
| 110 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **178 días** | **mié 13/04/** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **106** | **$14,416** |
| 111 | (P1) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 10 días | mié 13/04/1 | mar 26/04/16 | mar 26/04... | 109 | $1,948 |
| 112 | (P2) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | mié 27/04/1 | mié 25/05/16 | mié 25/05/... | 111 | $2,208 |
| 113 | (P3) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 26/05/1 | jue 23/06/16 | jue 23/06/16 | 112 | $2,078 |
| 114 | (P4) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | vie 24/06/1 | vie 22/07/16 | vie 22/07/16 | 113 | $0 |
| 115 | (P5) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | mar 26/07/ | mié 24/08/16 | mié 24/08/... | 114 | $0 |
| 116 | (P6) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 25/08/1 | vie 23/09/16 | NOD | 115 | $2,468 |
| 117 | (P7) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | lun 26/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 116 | $1,818 |
| 118 | (P8) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites | 21 días | mié 26/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 117 | $2,078 |
| 119 | (P9) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 118 | $1,818 |
| 120 | Estrategia para la mejora de la calificación país diseñada e implementad | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 121 | Diseño del Banco de segundo piso | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 122 | Buró de crédito diseñado y Propuesta de ley | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 123 | Diseño del mecanismo del observatorio energético implementado | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |

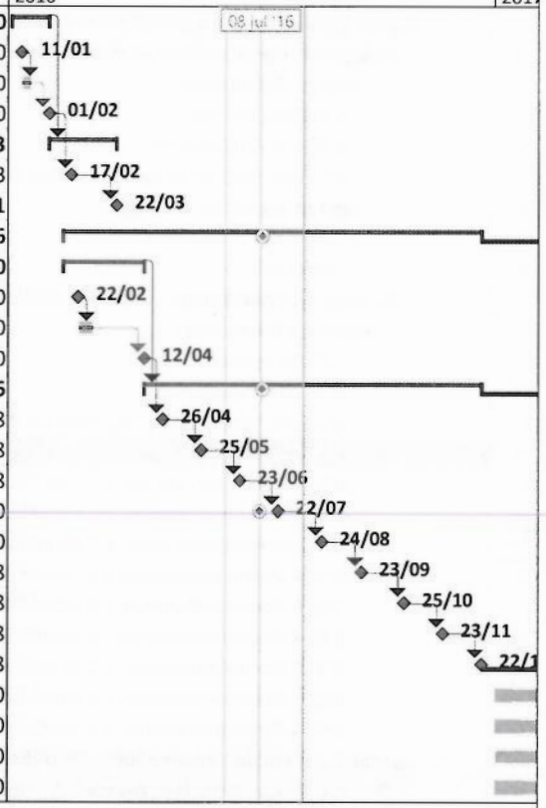


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Política y legislación Nacional de Competencia diseñada | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 125 | **Proceso de Adjudicación: Sistema informático de monitoreo para** | **244 días** | **lun** | **vie 28/07/17** | **NOD** | | **$200,000** |
| 126 | Contratación 2017 | **244 días** | **lun 08/08/1** | **vie 28/07/17** | **NOD** | | **$200,000** |
| 136 | **Consumidores informados sobre los derechos del consumidor** | **157.88 d** | **mar 01/03/** | **vie 07/10/16** | **NOD** | | **$3,052** |
| 137 | **Proceso de Contratación: Asesor técnico para la difusión de** | **157.88** | **mar** | **vie 07/10/16** | **NOD** | | **$3,052** |
| 138 | **Etapa de Adquisición** | **47.88 día** | **mar 01/03/** | **mar 03/05/16** | **mar 03/05...** | | **$0** |
| 139 | TDR Presentados | 20.88 día | mar 01/03/ | vie 25/03/16 | vie 25/03/16 | | $0 |
| 140 | NOB a la Adjudicación | 10 días | lun 28/03/1 | vie 08/04/16 | vie 08/04/16 | 139 | $0 |
| 141 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | lun 11/04/1 | mar 03/05/16 | mar 03/05... | 140 | $0 |
| 142 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **110 días** | **mié 04/05/** | **vie 07/10/16** | **NOD** | **138** | **$3,052** |
| 143 | (P1) Plan de trabajo de la Estrategia y Publicidad Engañosa | 22 días | mié 04/05/1 | jue 02/06/16 | jue 02/06/16 | 141 | $1,688 |
| 144 | (P2) Informe de seguimiento a la estrategia etiquetado y publici | 44 días | vie 03/06/1 | vie 05/08/16 | vie 05/08/16 | 143 | $0 |
| 145 | (P3) Informe final de seguimiento a la estrategia etiquetado y pu | 44 días | lun 08/08/1 | vie 07/10/16 | NOD | 144 | $1,364 |
| 146 | (P4) Tercer Informe de seguimiento a la Estrategia Etiquetado y | 1 día? | mié 04/05/1 | mié 04/05/16 | NOD | | $0 |
| 147 | (P5) Informe final de seguimiento a la Estrategia Etiquetado y Pu | 1 día? | mié 04/05/1 | mié 04/05/16 | NOD | | $0 |
| 148 | Propuesta de Código de Gobierno Corporativo desarrollada | 200 días | jue 02/03/1 | jue 14/12/17 | NOD | | $0 |
| 149 | **Implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI)** | **185 días** | **mié 03/08/** | **mar 02/05/17** | **NOD** | | **$200,000** |
| 150 | Proceso de Adjudicación: Ventanilla Única de Inversión | **185 días** | **mié 03/08/** | **mar 02/05/17** | **NOD** | | **$200,000** |
| 151 | Estrategia Ventanilla Unica | 20 días | mié 03/08/1 | mar 30/08/16 | NOD | | $0 |
| 152 | **Etapa de Adquisición** | **16 días** | **jue 01/09/1** | **vie 23/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 153 | TDR Presentados | 6 días | jue 01/09/1 | jue 08/09/16 | NOD | 151 | $0 |
| 154 | NOB a la Adjudicación | 7 días | vie 09/09/1 | mar 20/09/16 | NOD | 153 | $0 |
| 155 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | mié 21/09/1 | vie 23/09/16 | NOD | 154 | $0 |
| 156 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **148 días** | **lun 26/09/1** | **mar 02/05/17** | **NOD** | **152** | **$200,000** |
| 157 | Producto 1 | 38 días | lun 26/09/1 | jue 17/11/16 | NOD | 155 | $50,000 |
| 158 | Producto 2 | 35 días | vie 18/11/1 | vie 13/01/17 | NOD | 157 | $50,000 |

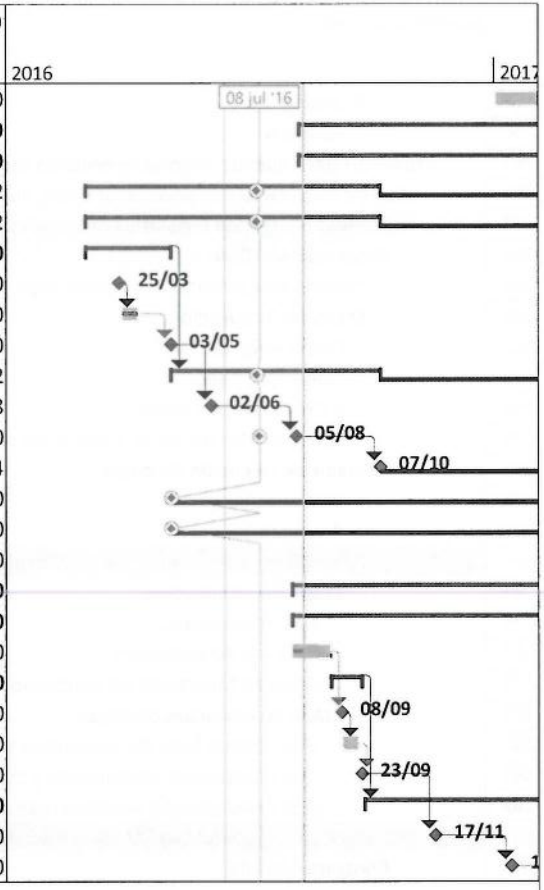


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Producto 3 | 40 días | lun 16/01/1 | vie 10/03/17 | NOD | 158 | $50,000 |
| 160 | Producto 4 | 35 días | lun 13/03/1 | mar 02/05/17 | NOD | 159 | $50,000 |
| 161 | **Proyectos para nuevas mejoras al entorno productivo elaborados** | **1341.13** | **lun 02/09/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$77,923** |
| 162 | Plan de priorización de acuerdo al Doing Business | 0 días | vie 16/09/1 | vie 16/09/16 | NOD | | $0 |
| 163 | **Iniciativas de agenda legislativa analizadas y difundidas (3 al año)** | **1341.13** | **lun 02/09/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$77,923** |
| 164 | **Contratación 2016** | **848 días** | **lun 02/09/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$25,974** |
| 165 | Proceso de Contratación: Asesor legal para el seguimiento de rel | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | NOD | | $0 |
| 166 | **Etapa de Adquisición** | **15 días?** | **lun 01/08/1** | **lun 22/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 167 | Elaboración de TDRS | 7 días? | lun 01/08/1 | mié 10/08/16 | NOD | | $0 |
| 168 | TDR Presentados | 1 día? | jue 11/08/1 | jue 11/08/16 | NOD | 167 | $0 |
| 169 | NOB a la Adjudicaciòn | 1 día? | mar 16/08/ | mar 16/08/16 | NOD | | $0 |
| 170 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 1 día? | lun 22/08/1 | lun 22/08/16 | NOD | | $0 |
| 171 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **79 días?** | **jue 01/09/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$0** |
| 172 | Producto 1 | 10 días? | jue 01/09/1 | mié 14/09/16 | NOD | | $0 |
| 173 | Producto 2 | 49 días? | lun 17/10/1 | jue 22/12/16 | NOD | | $0 |
| 174 | Proceso de Contratación: Asesor de impacto legislativo e | **215.88** | **lun** | **mié 30/11/16** | **NOD** | | **$11,039** |
| 175 | **Etapa de Adquisición** | **66.88 día** | **lun 01/02/1** | **vie 29/04/16** | **vie 29/04/...** | | **$0** |
| 176 | TDR Presentados | 46.88 día | lun 01/02/1 | vie 01/04/16 | vie 01/04/16 | | $0 |
| 177 | NOB a la Adjudicación | 5 días | lun 04/04/1 | vie 08/04/16 | vie 08/04/16 | 176 | $0 |
| 178 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 15 días | lun 11/04/1 | vie 29/04/16 | vie 29/04/16 | 177 | $0 |
| 179 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **149 días** | **lun 02/05/1** | **mié 30/11/16** | **NOD** | **175** | **$11,039** |
| 180 | (P1) Análisis legal de normativas y plan de impacto al Doing | 21 días | lun 02/05/1 | lun 30/05/16 | lun 30/05/16 | 178 | $5,195 |
| 181 | (P2) Concepción, elaboración y difusión de material de sens | 64 días | mar 31/05/ | mar 30/08/16 | NOD | 180 | $3,247 |
| 182 | (P3) Evaluación de acciones realizadas y Doing Business 201 | 64 días | mié 31/08/1 | mié 30/11/16 | NOD | 181 | $2,597 |
| 183 | Proceso de Contratación: Asesor en analisis y difusión de la | **217 días** | **lun** | **jue 01/12/16** | **NOD** | | **$14,936** |
| 192 | **Contratación 2017** | **243 días** | **lun 02/01/1** | **vie 15/12/17** | **NOD** | | **$25,974** |

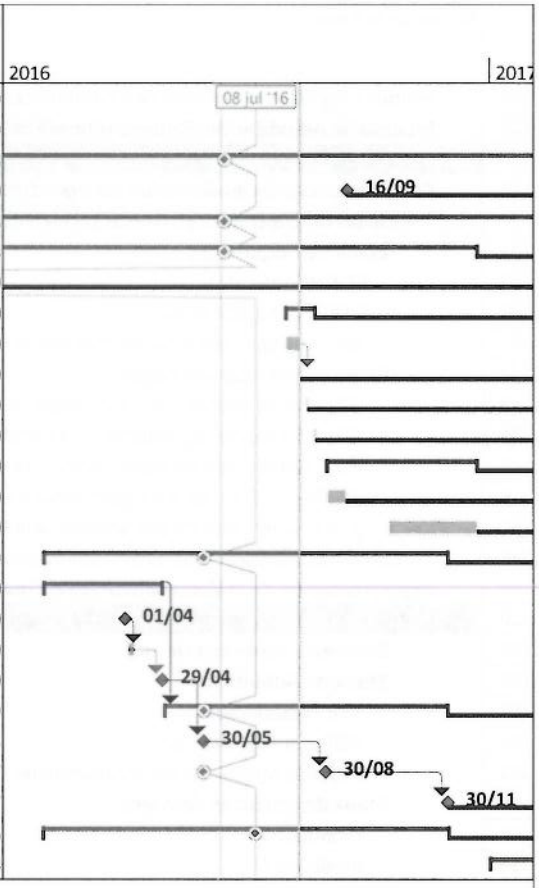


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | **Contratación 2018** | **243 días** | **mar 02/01/** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$25,974** |
| 205 | **Proceso de Contratación: Asesor de agenda legislativa 2018** | **243 días** | **mar** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$25,974** |
| 216 | **Difusión Anual sobre la Mejora del Entorno productivo** | **681.13 d** | **lun 22/02/1** | **mar 06/11/18** | **NOD** | | **$124,429** |
| 217 | **Proceso de Adjudicación: Capacitaciones en temas de Gobierno** | **74 días?** | **lun** | **mar** | **mar** | | **$34,429** |
| 218 | **Etapa de Adquisición** | **50 días** | **lun 22/02/1** | **mié 27/04/16** | **mié 27/04...** | | **$0** |
| 219 | TDR Presentados | 6 días | lun 22/02/1 | lun 29/02/16 | lun 29/02/16 | | $0 |
| 220 | NOB a la Adjudicación | 27 días | mar 01/03/: | lun 04/04/16 | lun 04/04/16 | 219 | $0 |
| 221 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | mar 05/04/: | mié 27/04/16 | mié 27/04/... | 220 | $0 |
| 222 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **24 días?** | **jue 28/04/1** | **mar 31/05/16** | **mar 31/05...** | **218** | **$34,429** |
| 223 | Producto 1 | 1 día? | jue 28/04/1 | jue 28/04/16 | jue 28/04/16 | | $0 |
| 224 | Producto 2 | 1 día? | jue 28/04/1 | jue 28/04/16 | jue 28/04/16 | | $0 |
| 225 | Producto 3 | 1 día? | jue 28/04/1 | jue 28/04/16 | jue 28/04/16 | | $0 |
| 226 | Producto 4 | 24 días | jue 28/04/1 | mar 31/05/16 | mar 31/05... | 221 | $34,429 |
| 227 | **Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo** | **543 días** | **jue 01/09/1** | **mar 06/11/18** | **NOD** | | **$90,000** |
| 228 | **Contratación 2017** | **294 días** | **jue 01/09/1** | **mar 07/11/17** | **NOD** | | **$45,000** |
| 246 | **Contratación 2018** | **294 días** | **vie 01/09/1** | **mar 06/11/18** | **NOD** | | **$45,000** |
| 264 | **Componente 2** | **1048 día** | **lun 02/09/1** | **lun 16/10/17** | **NOD** | | **$3,792,848** |
| 265 | **Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora** | **1015 día** | **lun 02/09/1** | **lun 28/08/17** | **NOD** | | **$3,792,848** |
| 266 | **Proceso de Adjudicación: Interconexión vial y tren urbano de** | **730 días** | **lun** | **lun 12/12/16** | **NOD** | | **$1,975,720** |
| 267 | **Etapa de Adquisición** | **552 días** | **lun 03/02/1** | **jue 31/03/16** | **jue 31/03/...** | | **$0** |
| 268 | TDR Presentados | 35 días | lun 03/02/1 | vie 21/03/14 | vie 21/03/14 | | $0 |
| 269 | NOB a la Adjudicación | 243 días | lun 24/03/1 | mar 24/02/15 | mar 24/02... | 268 | $0 |
| 270 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 25 días | mar 01/03/: | jue 31/03/16 | jue 31/03/16 | 269 | $0 |
| 271 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **175 días** | **mié 06/04/:** | **lun 12/12/16** | **NOD** | **267** | **$1,975,720** |
| 272 | (P1) Cronograma, Revisión de datos de partida y Propuesta de c | 40 días | mié 06/04/1 | mar 31/05/16 | mar 31/05... | 270 | $395,144 |
| 273 | (P2) Evaluación Ambiental Inicial y Diagnóstico | 40 días | mié 01/06/1 | mié 27/07/16 | NOD | 272 | $395,144 |

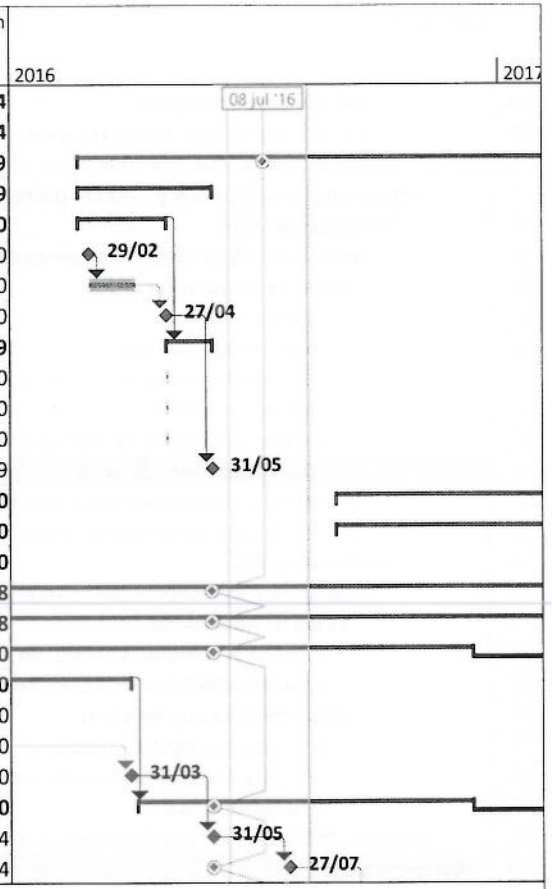


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | (P3) Estudio de demanda | 40 días | jue 28/07/1 | vie 23/09/16 | NOD | 273 | $395,144 |
| 275 | (P4) Estudio jurídico, Estudio Económico-Financiero y Estudio Té | 25 días | lun 26/09/1 | lun 31/10/16 | NOD | 274 | $395,144 |
| 276 | (P5) Estudio Medio Ambiente y Patrimonial e Informe Final y Sín | 30 días | mar 01/11/: | lun 12/12/16 | NOD | 275 | $395,144 |
| 277 | **Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR (Libramiento vial)** | **1015 día** | **lun 02/09/1** | **lun 28/08/17** | **NOD** | **2061** | **$1,817,128** |
| 278 | **Contratación 2016** | **910 días** | **lun 02/09/1** | **mar 28/03/17** | **NOD** | **2061** | **$545,138** |
| 279 | **Proceso de Adjudicación: Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR** | **910** | **lun** | **mar** | **NOD** | | **$545,138** |
| 280 | **Etapa de Adquisición** | **806 días** | **lun 02/09/1** | **mar 25/10/16** | **NOD** | | **$0** |
| 281 | TDR Presentados | 25 días | lun 01/02/1 | lun 07/03/16 | lun 07/03/16 | | $0 |
| 282 | NOB a la Adjudicación | 60 días | lun 07/03/1 | jue 26/05/16 | jue 26/05/16 | 281 | $0 |
| 283 | Solicitud de cambio de Categoría (Revisión de | 0 días | mar | mar 26/04/16 | NOD | 282F | $0 |
| 284 | Firma de contrato | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | NOD | | $0 |
| 285 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | vie 30/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 282, | $0 |
| 286 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **104 días** | **mié 26/10/:** | **mar 28/03/17** | **NOD** | **280** | **$545,138** |
| 287 | (P1) Cronograma de trabajo aprobado y estudio de diagnós | 42 días | mié 26/10/1 | jue 22/12/16 | NOD | 285 | $181,713 |
| 288 | (P2) Estudio de demanda y Estudio técnico | 62 días | lun 02/01/1 | mar 28/03/17 | NOD | 287 | $363,426 |
| 289 | **Contratación 2017** | **500 días** | **mié 02/09/:** | **lun 28/08/17** | **NOD** | **2061** | **$1,271,989** |
| 290 | **Proceso de Adjudicación: Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR** | **500 días** | **mié 02/09/:** | **lun 28/08/17** | **NOD** | | **$1,271,989** |
| 291 | **Etapa de Adquisición** | **374 días** | **mié 02/09/:** | **lun 27/02/17** | **NOD** | | **$0** |
| 292 | Proceso de Adquisición realizado 2015 | 60 días | mié 02/09/1 | mié 25/11/15 | mié 25/11/... | | $0 |
| 293 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 41 días | lun 02/01/1 | lun 27/02/17 | NOD | | $0 |
| 294 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **126 días** | **mar 28/02/** | **lun 28/08/17** | **NOD** | **291** | **$1,271,989** |
| 295 | (P3) Estudio catastral y Estudio economico-financiero | 42 días | mar 28/02/: | jue 27/04/17 | NOD | 293 | $545,138 |
| 296 | (P4) Estudio jurídico y Estudio socio-ambiental | 42 días | vie 28/04/1 | mar 27/06/17 | NOD | 295 | $363,426 |
| 297 | (P5) Informe final | 42 días | mié 28/06/1 | lun 28/08/17 | NOD | 296 | $363,426 |
| 298 | Proyectos de infraestructuras difundidos a inversores | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 299 | **Componente 3** | **1435 día** | **lun 02/09/1** | **jue 09/05/19** | **NOD** | | **$11,516,...** |

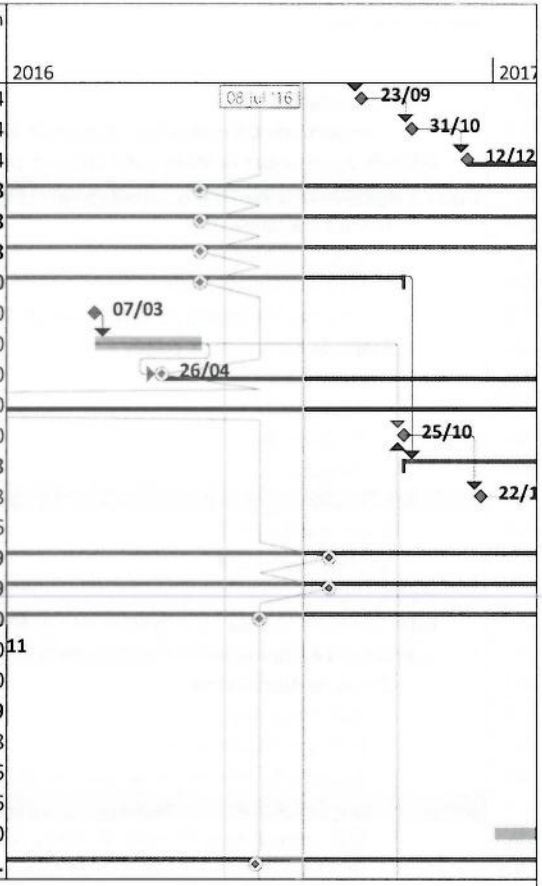


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | **Estrategia implementada para la mejora de la estructura institucional** | **1382 día** | **lun 02/09/1** | **mié 20/02/19** | **NOD** | | **$1,830,759** |
| 301 | **Levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y** | **563 días** | **lun** | **mié 20/02/19** | **NOD** | | **$185,000** |
| 327 | **Equipo técnico de emprendimiento e innovación contratado y** | **711 días** | **lun** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$445,759** |
| 328 | **Asesor en Productividad Empresarial** | **711 días** | **lun 22/02/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$73,223** |
| 329 | **Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial** | **243 días** | **lun** | **lun 06/02/17** | **NOD** | | **$13,991** |
| 330 | **Etapa de Adquisición** | **107 días** | **lun 22/02/1** | **vie 15/07/16** | **vie 15/07/...** | | **$0** |
| 331 | TDR Presentados | 44 días | lun 22/02/1 | mar 19/04/16 | mar 19/04... | | $0 |
| 332 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mié 20/04/1 | jue 12/05/16 | jue 12/05/16 | 331 | $0 |
| 333 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 46 días | vie 13/05/1 | vie 15/07/16 | vie 15/07/16 | 332 | $0 |
| 334 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **136 días** | **lun 18/07/1** | **lun 06/02/17** | **NOD** | | **$13,991** |
| 335 | (P1) Análisis de la situación actual en PROMIPYMES | 31 días | lun 18/07/1 | mié 31/08/16 | mié 31/08/... | 333 | $0 |
| 336 | (P2) Métricas claves de desempeño y supervisión de PROM | 21 días | jue 01/09/1 | vie 30/09/16 | NOD | 335 | $3,109 |
| 337 | (P3) Diseño de sistema de consolidación y expansión de PR | 21 días | lun 03/10/1 | mar 01/11/16 | NOD | 336 | $2,936 |
| 338 | (P4) Estrategias de apoyo y articulación | 21 días | mié 02/11/1 | mié 30/11/16 | NOD | 337 | $2,591 |
| 339 | (P5) Memoria de labores | 21 días | jue 01/12/1 | vie 06/01/17 | NOD | 338 | $2,764 |
| 340 | (P6) Estrategia de ejecución 2017 | 21 días | lun 09/01/1 | lun 06/02/17 | NOD | 339 | $2,591 |
| 341 | **Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial** | **282 días** | **mié** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 359 | **Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial** | **282 días** | **jue** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 377 | **Asesor en Desarrollo Emprendedor** | **711 días** | **lun 22/02/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$73,914** |
| 378 | **Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor** | **216 días** | **lun** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$14,682** |
| 379 | **Etapa de Adquisición** | **107 días** | **lun 22/02/1** | **vie 15/07/16** | **vie 15/07/...** | | **$0** |
| 380 | TDR Presentados | 44 días | lun 22/02/1 | mar 19/04/16 | mar 19/04... | | $0 |
| 381 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mié 20/04/1 | jue 12/05/16 | jue 12/05/16 | 380 | $0 |
| 382 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 46 días | vie 13/05/1 | vie 15/07/16 | vie 15/07/16 | 381 | $0 |
| 383 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **88 días** | **jue 18/08/1** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$14,682** |
| 384 | (P1) Plan de trabajo y cronograma 2016 | 31 días | jue 18/08/1 | vie 30/09/16 | NOD | | $3,282 |

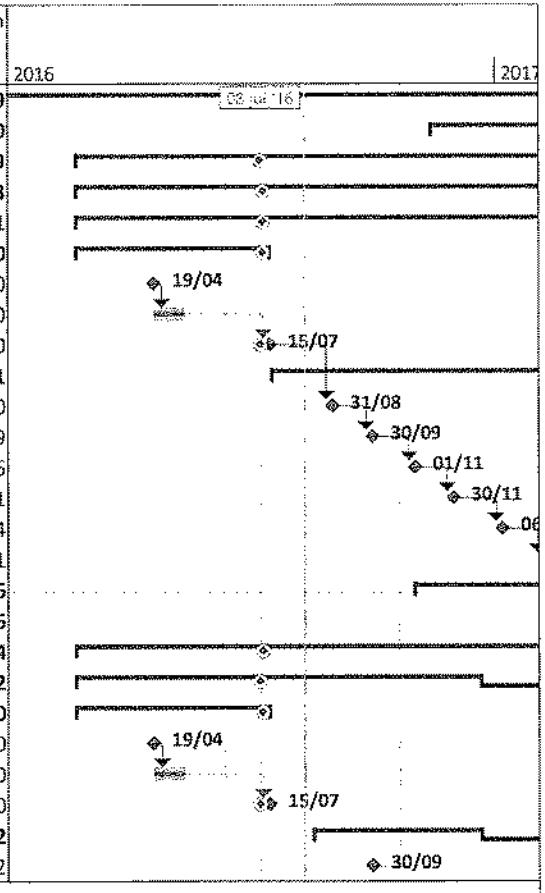


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | (P2) Estrategia de coordinación con el ecosistema | 21 días | lun 03/10/1 | mar 01/11/16 | NOD | 384 | $3,109 |
| 386 | (P3) Documento con grado de avance en la ejecución | 15 días | mié 02/11/1 | mar 22/11/16 | NOD | 385 | $2,936 |
| 387 | (P4) Estrategias de apoyo, articulación y ejecución 2017 | 15 días | mié 23/11/1 | mar 13/12/16 | NOD | 386 | $2,591 |
| 388 | (P5) Memoria de labores | 6 días | mié 14/12/1 | mié 21/12/16 | NOD | 387 | $2,764 |
| 389 | **Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor** | **282 días** | **mié** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 407 | **Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor** | **282 días** | **jue** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 425 | **Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual** | **711 días** | **lun 22/02/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$76,505** |
| 426 | **Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad** | **280 días** | **lun** | **mié 29/03/17** | **NOD** | | **$17,273** |
| 427 | **Etapa de Adquisición** | **144 días** | **lun 22/02/1** | **jue 08/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 428 | TDR Presentados | 110 días | lun 22/02/1 | mié 20/07/16 | mié 20/07/... | | $0 |
| 429 | NOB a la Adjudicación | 17 días | jue 21/07/1 | mar 16/08/16 | NOD | 428 | $0 |
| 430 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | mié 17/08/1 | jue 08/09/16 | NOD | 429 | $0 |
| 431 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **136 días** | **vie 09/09/1** | **mié 29/03/17** | **NOD** | | **$17,273** |
| 432 | (P1) Plan de trabajo y cronograma 2016 | 31 días | vie 09/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 430 | $3,282 |
| 433 | (P2) Estrategia de coordinación con el ecosistema | 21 días | mié 26/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 432 | $3,109 |
| 434 | (P3) Propuestas de iniciativas legales | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 433 | $2,936 |
| 435 | (P4) Estrategias de apoyo y articulación | 21 días | lun 02/01/1 | lun 30/01/17 | NOD | 434 | $2,591 |
| 436 | (P5) Memoria de labores | 21 días | mar 31/01/ | mar 28/02/17 | NOD | 435 | $2,764 |
| 437 | (P6) Estrategia de ejecución 2017 | 21 días | mié 01/03/1 | mié 29/03/17 | NOD | 436 | $2,591 |
| 438 | **Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad** | **282 días** | **mié** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 456 | **Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad** | **282 días** | **jue** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 474 | **Asesor en Financiamiento e Inversión** | **711 días** | **lun 22/02/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$76,505** |
| 475 | **Proceso de Contratación: Asesor en Financiamiento e** | **280 días** | **lun** | **mié 29/03/17** | **NOD** | | **$17,273** |
| 476 | **Etapa de Adquisición** | **144 días** | **lun 22/02/1** | **jue 08/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 477 | TDR Presentados | 110 días | lun 22/02/1 | mié 20/07/16 | mié 20/07/... | | $0 |
| 478 | NOB a la Adjudicación | 17 días | jue 21/07/1 | mar 16/08/16 | NOD | 477 | $0 |

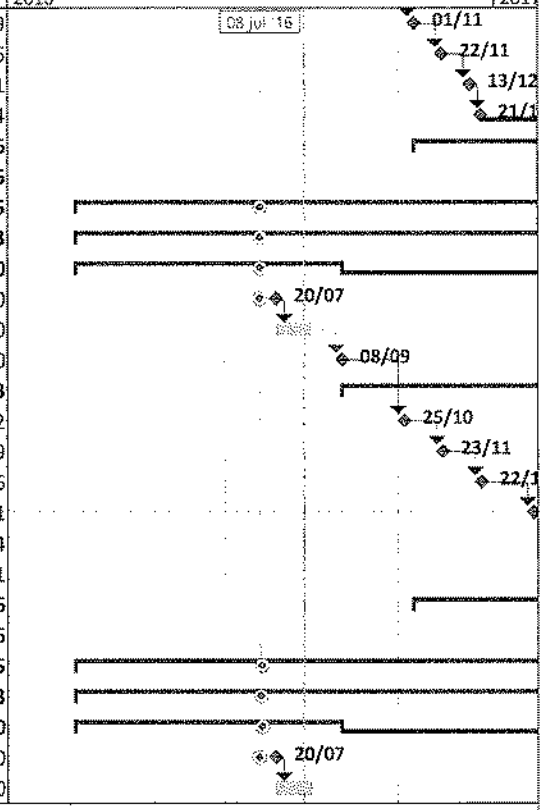


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | |
|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | mié 17/08/1 | jue 08/09/16 | NOD | 478 | $0 |
| 480 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **136 días** | **vie 09/09/1** | **mié 29/03/17** | **NOD** | | **$17,273** |
| 481 | (P1) Plan de trabajo y cronograma 2016 | 31 días | vie 09/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 479 | $3,282 |
| 482 | (P2) Estrategia de coordinaci´n con el ecosistema | 21 días | mié 26/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 481 | $3,109 |
| 483 | (P3) Diseño de productos financieros | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 482 | $2,936 |
| 484 | (P4) Estrategias de apoyo y articulación | 21 días | lun 02/01/1 | lun 30/01/17 | NOD | 483 | $2,591 |
| 485 | (P5) Memoria de labores | 21 días | mar 31/01/ | mar 28/02/17 | NOD | 484 | $2,764 |
| 486 | (P6) Estrategia de ejecución | 21 días | mié 01/03/1 | mié 29/03/17 | NOD | 485 | $2,591 |
| 487 | **Proceso de Contratación: Asesor en Financiamiento e** | **282 días** | **mié** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 505 | **Proceso de Contratación: Asesor en Financiamiento e** | **282 días** | **jue** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 523 | **Asesor de Mercadeo y Comunicación** | **610 días** | **vie 08/07/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$71,572** |
| 524 | **Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación** | **149 días** | **vie 08/07/1** | **mié 15/02/17** | **NOD** | | **$12,340** |
| 525 | **Etapa de Adquisición** | **44 días** | **vie 08/07/1** | **vie 09/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 526 | TDR Presentados | 10 días | vie 08/07/1 | jue 21/07/16 | jue 21/07/16 | | $0 |
| 527 | NOB a la Adjudicación | 17 días | vie 22/07/1 | mié 17/08/16 | NOD | 526 | $0 |
| 528 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | jue 18/08/1 | vie 09/09/16 | NOD | 527 | $0 |
| 529 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **105 días** | **lun 12/09/1** | **mié 15/02/17** | **NOD** | | **$12,340** |
| 530 | Producto 1 | 21 días | lun 12/09/1 | mar 11/10/16 | NOD | 528 | $2,468 |
| 531 | Producto 2 | 21 días | jue 13/10/1 | jue 10/11/16 | NOD | 530 | $2,468 |
| 532 | Producto 3 | 21 días | vie 11/11/1 | vie 09/12/16 | NOD | 531 | $2,468 |
| 533 | Producto 4 | 21 días | lun 12/12/1 | mar 17/01/17 | NOD | 532 | $2,468 |
| 534 | Producto 5 | 21 días | mié 18/01/1 | mié 15/02/17 | NOD | 533 | $2,468 |
| 535 | **Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación** | **282 días** | **mié 02/11/** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 553 | **Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación** | **282 días** | **jue 02/11/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 571 | **Asesor de Articulaciones Interinstitucionales** | **610 días** | **vie 08/07/1** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$74,040** |
| 572 | **Proceso de contratación: Asesor de Articulaciones** | **170 días** | **vie** | **jue 16/03/17** | **NOD** | | **$14,808** |

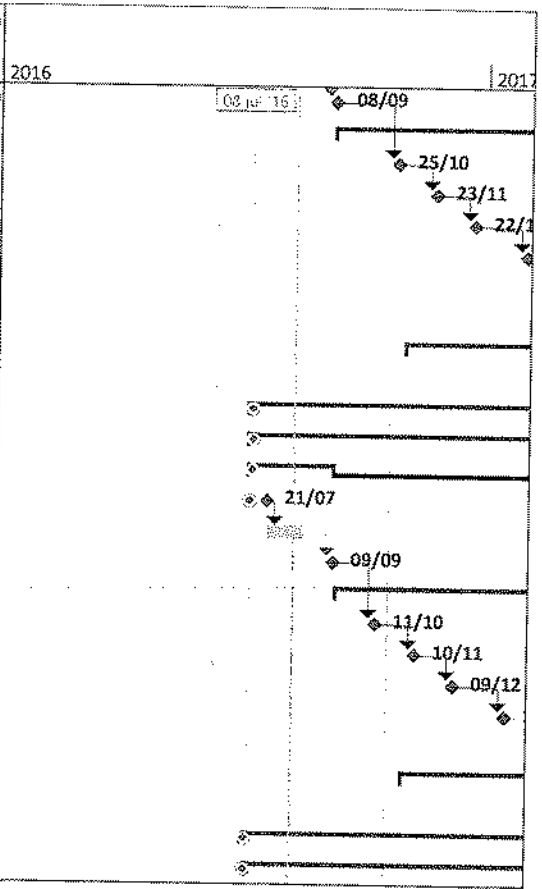


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | **Proceso de contratación: Asesor de Articulaciones** | **282 días** | **mié** | **lun 18/12/17** | **NOD** | | **$29,616** |
| 602 | **Proceso de contratación: Asesor de Articulaciones** | **282 días** | **jue** | **lun 17/12/18** | **NOD** | | **$29,616** |
| 620 | **Evento difusión emprendimiento e innovación** | **1213 día** | **lun 02/09/1** | **jue 14/06/18** | **NOD** | | **$1,200,000** |
| 621 | **Proceso de Adquisición: Eventos de emprendimiento,** | **851 días** | **lun** | **mié 04/01/17** | **NOD** | 2061 | **$400,000** |
| 622 | Diseño del Evento anual | 0 días | vie 29/07/1 | vie 29/07/16 | NOD | | $0 |
| 623 | **Etapa de Adquisición** | **841 días** | **lun 02/09/1** | **mar 13/12/16** | **NOD** | | **$0** |
| 624 | TDR Presentados | 10 días | vie 29/07/1 | vie 12/08/16 | vie 12/08/16 | 622 | $0 |
| 625 | NOB Términos de Referencia | 8 días | lun 02/09/1 | mié 11/09/13 | NOD | | $0 |
| 626 | NOB a la Adjudicación | 70 días | lun 15/08/1 | mar 22/11/16 | NOD | 624 | $0 |
| 627 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 15 días | mié 23/11/1 | mar 13/12/16 | NOD | 626 | $0 |
| 628 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **10 días** | **mié 14/12/1** | **mié 04/01/17** | **NOD** | **627** | **$400,000** |
| 629 | Producto 1 | 10 días | mié 14/12/1 | mié 04/01/17 | NOD | 627 | $120,000 |
| 630 | Producto 2 | 10 días | mié 14/12/1 | mié 04/01/17 | NOD | | $100,000 |
| 631 | Producto 3 | 10 días | mié 14/12/1 | mié 04/01/17 | NOD | | $180,000 |
| 632 | **Proceso de Adquisición: Evento de promoción y atracción de** | **195 días** | **jue** | **mié 14/06/17** | **NOD** | | **$400,000** |
| 639 | **Proceso de Adquisición: Evento de promoción y atracción de** | **195 días** | **vie** | **jue 14/06/18** | **NOD** | | **$400,000** |
| 646 | **Capacitaciones específicas en SDE** | **579 días** | **mar 30/08/** | **vie 21/12/18** | **NOD** | | **$307,792** |
| 647 | **Proceso de Adquisición:Capacitaciones específicas en SDE 2016** | **80 días** | **mar** | **mié 21/12/16** | **NOD** | 2061 | **$100,000** |
| 648 | Plan de capacitación aprobado | 0 días | mar 30/08/ | mar 30/08/16 | NOD | | $0 |
| 649 | **Etapa de Adquisición** | **30 días** | **mar 30/08/** | **mar 11/10/16** | **mar 11/10...** | | **$0** |
| 650 | TDR Presentados | 10 días | mar 30/08/ | lun 12/09/16 | lun 12/09/16 | 648 | $0 |
| 651 | NOB a la Adjudicación | 10 días | mar 13/09/ | mar 27/09/16 | mar 27/09... | 650 | $0 |
| 652 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 10 días | mié 28/09/1 | mar 11/10/16 | mar 11/10... | 651 | $0 |
| 653 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **50 días** | **jue 13/10/1** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$100,000** |
| 654 | Producto 1 | 50 días | jue 13/10/1 | mié 21/12/16 | NOD | 652 | $100,000 |
| 655 | **Proceso de Adquisición: Capacitaciones específicas en SDE 2017** | **147 días** | **jue** | **mié 19/07/17** | **NOD** | | **$103,896** |

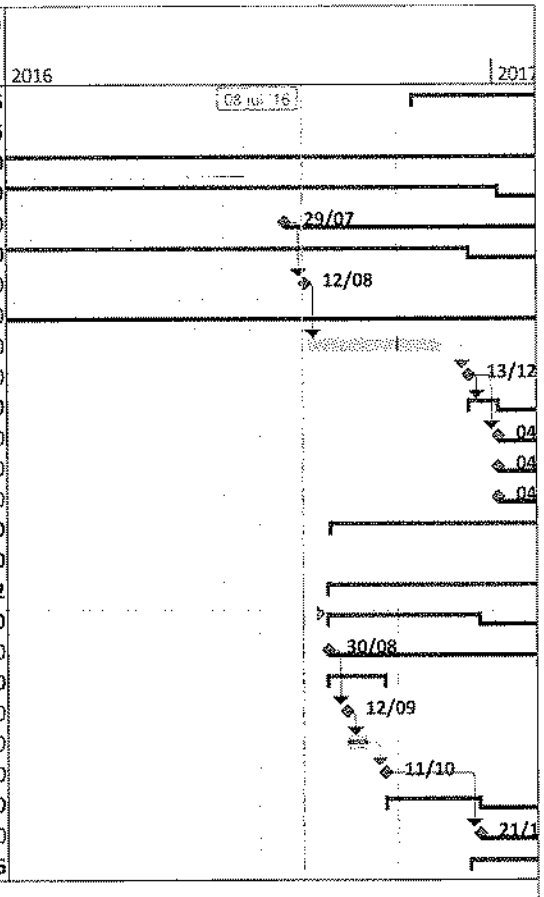


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | **Proceso de Adquisición: Capacitaciones específicas en SDE 2018** | **255 días** | **vie** | **vie 21/12/18** | **NOD** | | **$103,896** |
| 671 | **Proyectos de emprendimiento apoyados** | **577 días** | **vie 08/07/1** | **mié 31/10/18** | **NOD** | | **$1,040,000** |
| 672 | **Proceso de Adquisición: Programa de Emprendimiento ,75** | | | | | | |
| 683 | **Proceso de Adquisición: Programa de Emprendimiento ,75** | **326 días** | **vie** | **lun 30/10/17** | **NOD** | | **$520,000** |
| 699 | **Proceso de Adquisición: Programa de Emprendimiento ,75** | **304 días** | **mar** | **mié 31/10/18** | **NOD** | | **$520,000** |
| 715 | **Empresas capacitadas bajo Programa de Fomento a la Productividad (S** | **1295.13** | **lun 02/09/1** | **jue 11/10/18** | **NOD** | | **$2,837,922** |
| 716 | **Implementación de unidades de promoción de la MIPYMES (PROMI** | **1295.13** | **lun 02/09/1** | **jue 11/10/18** | **NOD** | | **$2,837,922** |
| 717 | **Proceso de Adquisición: Implementación de unidades de** | **859** | **lun** | **lun 16/01/17** | **NOD** | | **$886,753** |
| 718 | **Etapa de Adquisición** | **772 días** | **lun 02/09/1** | **lun 05/09/16** | **lun 05/09/...** | | **$0** |
| 719 | TDR Presentados | 50 días | lun 08/02/1 | mié 13/04/16 | mié 13/04/... | | $0 |
| 720 | NOB Terminos de Referencia | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | | $0 |
| 721 | Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | | $0 |
| 722 | NOB propuesta Técnica | 9 días | jue 28/07/1 | mié 10/08/16 | mié 10/08/... | | $0 |
| 723 | Negociación | 4 días | lun 15/08/1 | jue 18/08/16 | jue 18/08/16 | 722 | $0 |
| 724 | NOB a la Adjudicación | 5 días | vie 19/08/1 | jue 25/08/16 | jue 25/08/16 | 723 | $0 |
| 725 | Firma del Contrato | 4 días | vie 26/08/1 | mié 31/08/16 | mié 31/08/... | | $0 |
| 726 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | jue 01/09/1 | lun 05/09/16 | lun 05/09/16 | | $0 |
| 727 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **87 días** | **mar 06/09/** | **lun 16/01/17** | **NOD** | **718** | **$886,753** |
| 728 | Documento que contenga la estrategia de implementación de | 30 días | mar 06/09/ | mié 19/10/16 | NOD | | $266,026 |
| 729 | Documento que contenga el desarrollo de la planificación de l | 42 días | jue 20/10/1 | vie 16/12/16 | NOD | 728 | $443,377 |
| 730 | Documento que contenga la memoria de labores con los resul | 15 días | lun 19/12/1 | lun 16/01/17 | NOD | 729 | $177,351 |
| 731 | **Proceso de Adquisición: Implementación de unidades de** | **1005** | **lun** | **lun 14/08/17** | **NOD** | | **$975,584** |
| 741 | **Proceso de Adquisición: Implementación de unidades de** | **197 días** | **mar** | **jue 11/10/18** | **NOD** | | **$975,584** |
| 750 | **Empresas Asistidas bajo Programa de innovación a las empresas** | **703 días** | **vie** | **jue 09/05/19** | **NOD** | | **$5,500,000** |
| 751 | **Programa de Innovación** | **582 días** | **vie 08/07/1** | **mié 07/11/18** | **NOD** | | **$5,400,000** |
| 752 | **Proceso de Adquisición: Programa de Innovación 2016** | **92 días** | **vie** | **vie 18/11/16** | **NOD** | **2061** | **$0** |

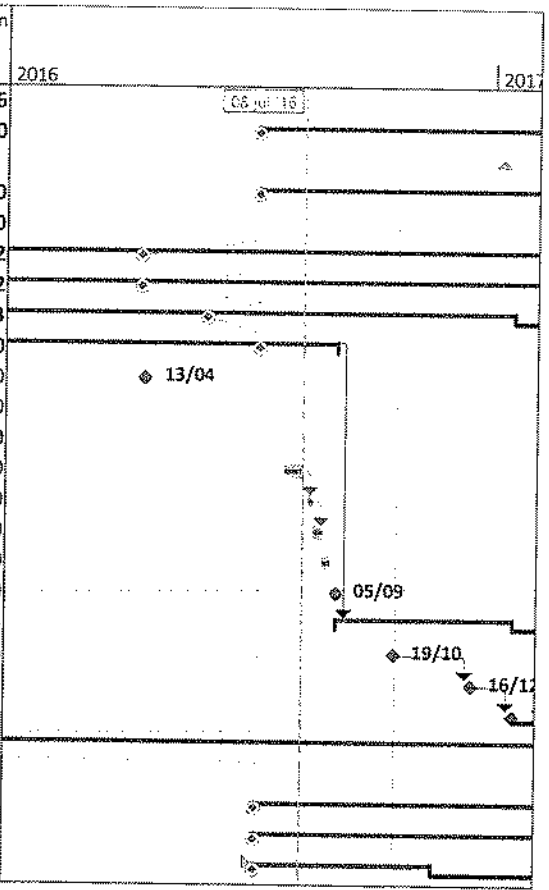


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | **Etapa de Adquisición** | **92 días** | **vie 08/07/1** | **vie 18/11/16** | **NOD** | | $0 |
| 754 | TDR Presentados | 10 días | vie 08/07/1 | jue 21/07/16 | NOD | | $0 |
| 755 | NOB a la Adjudicación | 65 días | vie 22/07/1 | mié 26/10/16 | NOD | 754 | $0 |
| 756 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | jue 27/10/1 | vie 18/11/16 | NOD | 755 | $0 |
| 757 | [illegible] | | | | | | |
| 758 | | | | | | | |
| 759 | | | | | | | |
| 760 | | | | | | | |
| 761 | **Proceso de Adquisición: Programa de Innovación 2017** | **210 días** | **lun 30/01/1** | **lun 27/11/17** | **NOD** | | $2,700,000 |
| 777 | **Proceso de Adquisición: Programa de Innovación 2018** | **247 días** | **lun 13/11/1** | **mié 07/11/18** | **NOD** | | $2,700,000 |
| 793 | **Proceso de Contratación: Asistencias Legales directas en Innovación** | **247 días** | **vie 11/05/1** | **jue 09/05/19** | **NOD** | | $100,000 |
| 809 | Planes y estudio de desarrollo sectorial desarrollados | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 810 | **Componente 4** | **1340 día** | **lun 02/09/1** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | $3,777,850 |
| 811 | **Planes del Sector turismo de Sacatepequez para la competitividad** | **717 días** | **mié** | **mar** | **NOD** | | $2,051,948 |
| 812 | **Plan de Desarrollo de Antigua Guatemala, Sacatepéquez** | **682 días** | **mié 16/09/** | **mar 05/06/18** | **NOD** | | $2,000,000 |
| 813 | **Proceso de Adquisición: Firma para desarrollo Plan de Desarrollo** | **572 días** | **mié** | **jue 21/12/17** | **NOD** | 206 | $400,000 |
| 814 | **Etapa de Adquisición** | **305 días** | **mié 16/09/** | **vie 25/11/16** | **NOD** | | $0 |
| 815 | TDR Presentados | 73 días | mié 16/09/1 | lun 04/01/16 | lun 04/01/16 | | $0 |
| 816 | NOB a la Adjudicación | 140 días | mar 05/01/ | jue 14/07/16 | NOD | 815 | $0 |
| 817 | TDR Modificados en base a observaciones de Comitè de Evalu | 8 días | vie 15/07/1 | mié 27/07/16 | NOD | 816 | $0 |
| 818 | Elaboración de Solicitud de Propuesta -SP- | 8 días | lun 18/07/1 | jue 04/08/16 | NOD | 817 | $0 |
| 819 | Evaluación de Ofertas técnicas y Financieras | 7 días | vie 05/08/1 | lun 15/08/16 | NOD | 818 | $0 |
| 820 | Preparación ofertas empresas de lista corta | 42 días | mar 16/08/ | vie 14/10/16 | NOD | 819 | $0 |
| 821 | Recepción de ofertas | 1 día | lun 17/10/1 | lun 17/10/16 | NOD | 820 | $0 |
| 822 | Firma del Contrato | 3 días | mar 18/10/ | jue 20/10/16 | NOD | 821 | $0 |
| 823 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 26 días | vie 21/10/1 | vie 25/11/16 | NOD | 822 | $0 |

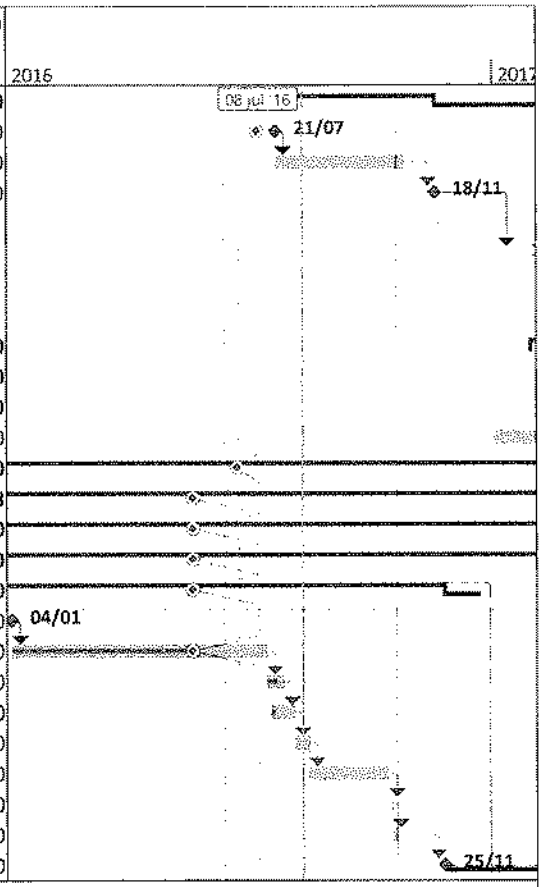


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **248 días** | **lun 02/01/1** | **jue 21/12/17** | **NOD** | **814** | **$400,000** |
| 825 | P1 Documento con la Visión Territorial Subregional -Sacatepe | 80 días | lun 02/01/1 | lun 24/04/17 | NOD | | $100,000 |
| 826 | P2 Plan Maestro y Plan Regulador | 80 días | mar 25/04/ | jue 17/08/17 | NOD | 825 | $150,000 |
| 827 | P3 Plan de Implementación de los Productos 1 y 2 | 88 días | vie 18/08/1 | jue 21/12/17 | NOD | 826 | $150,000 |
| 828 | **Proceso de Adquisición: Firma para desarrollo Plan de Desarrollo** | **168 días** | **lun** | **mar** | **NOD** | | **$1,600,000** |
| 829 | **Etapa de Adquisición** | **30 días** | **lun 02/10/1** | **lun 13/11/17** | **NOD** | | **$0** |
| 830 | TDR Presentados | 5 días | lun 02/10/1 | vie 06/10/17 | NOD | | $0 |
| 831 | NOB a la Adjudicación | 8 días | lun 09/10/1 | jue 19/10/17 | NOD | 830 | $0 |
| 832 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | vie 20/10/1 | lun 13/11/17 | NOD | 831 | $0 |
| 833 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **108 días** | **mar 02/01/** | **mar 05/06/18** | **NOD** | **829** | **$1,600,000** |
| 834 | Producto 1 | 30 días | mar 02/01/ | lun 12/02/18 | NOD | 832, | $500,000 |
| 835 | Producto 2 | 39 días | mar 13/02/ | mar 10/04/18 | NOD | 834 | $500,000 |
| 836 | Producto 3 | 39 días | mié 11/04/1 | mar 05/06/18 | NOD | 835 | $600,000 |
| 837 | **Implementación del Plan de Desarrollo de Antigua Guatemala,** | **165 días** | **vie** | **mar** | **NOD** | | **$51,948** |
| 838 | **Etapa de Adquisición** | **39 días** | **vie 24/11/1** | **mié 24/01/18** | **NOD** | | **$0** |
| 839 | TDR Presentados | 10 días | vie 24/11/1 | jue 07/12/17 | NOD | | $0 |
| 840 | NOB a la Adjudicación | 12 días | vie 08/12/1 | lun 01/01/18 | NOD | 839 | $0 |
| 841 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | mar 02/01/ | mié 24/01/18 | NOD | 840 | $0 |
| 842 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **126 días** | **jue 25/01/1** | **mar 24/07/18** | **NOD** | **838** | **$51,948** |
| 843 | Producto 1 | 42 días | jue 25/01/1 | vie 23/03/18 | NOD | 841 | $15,948 |
| 844 | Producto 2 | 42 días | lun 26/03/1 | vie 25/05/18 | NOD | 843 | $18,000 |
| 845 | Producto 3 | 42 días | lun 28/05/1 | mar 24/07/18 | NOD | 844 | $18,000 |
| 846 | Planes de Circunscripciones económicas de Desarrollo - CEDES- desarrol | 200 días | lun 02/01/1 | lun 16/10/17 | NOD | | $0 |
| 847 | **Plan desarrollo del turismo en Guatemágica desarrollado** | **985 días** | **lun 02/09/1** | **jue 13/07/17** | **NOD** | | **$765,455** |
| 848 | **Proceso de Adquisición: Plan de Desarrollo Turístico de** | **829** | **lun** | **vie 25/11/16** | **NOD** | **2061** | **$649,351** |
| 849 | **Etapa de Adquisición** | **752 días** | **lun 02/09/1** | **lun 08/08/16** | **NOD** | | **$0** |

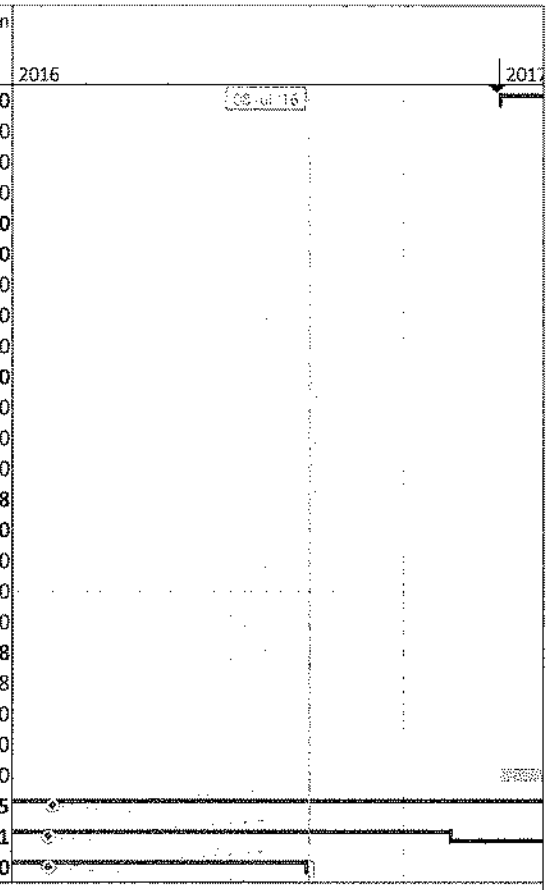


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | TDR Presentados | 6 días | lun 11/01/1 | lun 18/01/16 | lun 18/01/16 | | $0 |
| 851 | NOB a los TDR | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | lun 02/09/13 | | $0 |
| 852 | NOB a la Adjudicación (Empresa Ganadora) | 17 días | mar 19/01/ | mié 10/02/16 | mié 10/02/... | 850 | $0 |
| 853 | NOB a la Adjudicación (Renegociación) | 5 días | lun 02/09/1 | vie 06/09/13 | vie 06/09/13 | 852 | $0 |
| 854 | Renegociación | 15 días | lun 02/09/1 | vie 20/09/13 | vie 20/09/13 | 853 | $0 |
| 855 | Firma Acta de Negociacion de contrato (Empresa 2) | 5 días | lun 02/09/1 | jue 26/09/13 | NOD | 854 | $0 |
| 856 | Revisión de Requisitos Adicionales (BID) | 6 días | lun 02/09/1 | jue 03/10/13 | NOD | 855 | $0 |
| 857 | Firma del Contrato | 6 días | vie 29/07/1 | lun 08/08/16 | NOD | 856 | $0 |
| 858 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 7 días | vie 08/07/1 | lun 18/07/16 | NOD | | $0 |
| **859** | **Etapa de Ejecución de pagos** | **77 días** | **mar 09/08/** | **vie 25/11/16** | **NOD** | **849** | **$649,351** |
| 860 | Producto 1, Plan de trabajo para el desarrollo turístico y territori | 30 días | mar 09/08/ | mar 20/09/16 | NOD | 858 | $200,000 |
| 861 | Producto 2, Informe de diagnostico turistico | 30 días | mié 21/09/1 | mié 02/11/16 | NOD | 860 | $200,000 |
| 862 | Producto 3, Informe de oferta demanda turística | 15 días | jue 03/11/1 | mié 23/11/16 | NOD | 861 | $249,351 |
| 863 | Producto 4, Elaboración del plan de Desarrollo Turistico de Guat | 1 día | jue 24/11/1 | jue 24/11/16 | NOD | 862 | $0 |
| 864 | Producto 5, Informe Final | 1 día | vie 25/11/1 | vie 25/11/16 | NOD | 863 | $0 |
| **865** | **Proceso de Adquisición: Implementación Plan Guatemágica 2017** | **160 días** | **mar** | **jue 13/07/17** | **NOD** | | **$97,403** |
| **866** | **Etapa de Adquisición** | **40 días** | **mar 22/11/** | **mar 24/01/17** | **NOD** | | **$0** |
| **870** | **Etapa de Ejecución de pagos** | **120 días** | **mié 25/01/** | **jue 13/07/17** | **NOD** | **866** | **$97,403** |
| **874** | **Proceso de Contratación: Asesor técnico en seguimiento,** | **141 días** | **vie** | **vie 03/02/17** | **NOD** | **2061** | **$18,701** |
| **875** | **Etapa de Adquisición** | **51 días** | **vie 08/07/1** | **mié 21/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 876 | TDR Presentados | 17 días | vie 08/07/1 | mié 03/08/16 | mié 03/08/... | | $0 |
| 877 | NOB a la Adjudicación | 17 días | jue 04/08/1 | vie 26/08/16 | NOD | 876 | $0 |
| 878 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | lun 29/08/1 | mié 21/09/16 | NOD | 877 | $0 |
| **879** | **Etapa de Ejecución de pagos** | **90 días** | **jue 22/09/1** | **vie 03/02/17** | **NOD** | **875** | **$18,701** |
| 880 | Producto 1 | 30 días | jue 22/09/1 | jue 03/11/16 | NOD | 878 | $6,000 |
| 881 | Producto 2 | 30 días | vie 04/11/1 | jue 15/12/16 | NOD | 880 | $6,000 |

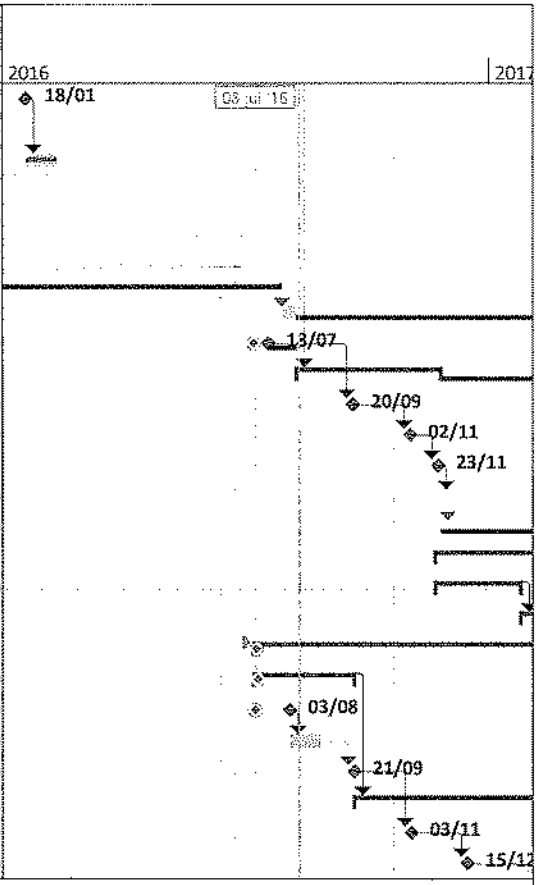


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | Producto 3 | 30 días | vie 16/12/1 | vie 03/02/17 | NOD | 881 | $6,701 |
| 883 | **Mesas de Competitividad Instaladas, Coordinadas y Difundidas** | **1340** | **lun** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$276,460** |
| 884 | **Mesas Instaladas** | **289 días** | **vie 26/02/1** | **mar 18/04/17** | **NOD** | | **$18,377** |
| 885 | **Proceso de Contratación: Instalación de la Mesa de** | **289 días** | **vie** | **mar** | **NOD** | | **$18,377** |
| 886 | **Etapa de Adquisición** | **123 días** | **vie 26/02/1** | **mar 16/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 887 | TDR Presentados | 6 días | vie 26/02/1 | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | | $0 |
| 888 | NOB a la Adjudicación | 24 días | lun 07/03/1 | mar 05/04/16 | mar 05/04... | 887 | $0 |
| 889 | Firma del Contrato | 11 días | lun 01/08/1 | mar 16/08/16 | NOD | | $0 |
| 890 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | mié 06/04/1 | vie 08/04/16 | vie 08/04/16 | 889 | $0 |
| 891 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **166 días** | **mié 17/08/** | **mar 18/04/17** | **NOD** | **886** | **$18,377** |
| 892 | (P1) Elaborar un mapeo de actores para integrar la mesa de c | 41 días | mié 17/08/1 | vie 14/10/16 | NOD | 890 | $1,838 |
| 893 | (P2) Plan estratégico de gestión de la mesa de competitividad | 41 días | lun 17/10/1 | lun 12/12/16 | NOD | 892 | $3,675 |
| 894 | (P3) Plan operativo de gestión de la mesa de competitividad 2 | 21 días | mar 13/12/ | mié 18/01/17 | NOD | 893 | $3,675 |
| 895 | (P4) Identificación y análisis de potencialidades territoriales d | 21 días | jue 19/01/1 | jue 16/02/17 | NOD | 894 | $4,594 |
| 896 | (P5) Agenda de competitividad local | 21 días | vie 17/02/1 | vie 17/03/17 | NOD | 895 | $2,757 |
| 897 | (P6) Perfil de proyecto priorizado | 21 días | lun 20/03/1 | mar 18/04/17 | NOD | 896 | $1,838 |
| 898 | **Mesas Coordinadas** | **1340 día** | **lun 02/09/1** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$224,316** |
| 899 | **Contratación 2016** | **955 días** | **lun 02/09/1** | **jue 01/06/17** | **NOD** | | **$76,624** |
| 900 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de** | **317.88** | **mar** | **mié 26/04/17** | **NOD** | | **$23,377** |
| 901 | **Etapa de Adquisición** | **151.88 d** | **mar 26/01/** | **mié 24/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 902 | TDR Presentados | 6 días | mar 26/01/ | mié 03/02/16 | mié 03/02/... | | $0 |
| 903 | NOB a la Adjudicación (1er candidato) | 120 días | mié 03/02/1 | lun 18/07/16 | lun 18/07/16 | 902 | $0 |
| 904 | NOB a la Adjudicación (2do Candidato) | 21 días | vie 15/07/1 | mar 16/08/16 | NOD | | $0 |
| 905 | Firma del Contrato | 3 días | mié 17/08/1 | vie 19/08/16 | NOD | 904 | $0 |
| 906 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | lun 22/08/1 | mié 24/08/16 | NOD | 905 | $0 |
| 907 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **166 días** | **jue 25/08/1** | **mié 26/04/17** | **NOD** | **901** | **$23,377** |

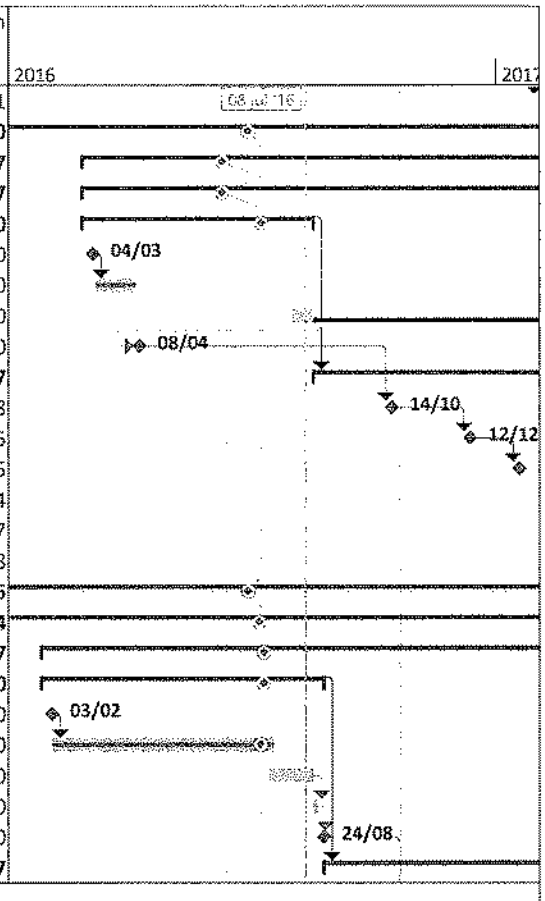


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | (P1) Sistematización de los estudios de potencial económic | 41 días | jue 25/08/1 | lun 24/10/16 | NOD | 906 | $3,507 |
| 909 | (P2) Plan para el congreso de competitividad regional (tem | 41 días | mar 25/10/ | mar 20/12/16 | NOD | 908 | $3,507 |
| 910 | (P3) Plan para la realización de talleres de capacitación y de | 21 días | mié 21/12/1 | jue 26/01/17 | NOD | 909 | $4,675 |
| 911 | (P4) Mapeo regional de necesidades de infraestructura estr | 21 días | vie 27/01/1 | vie 24/02/17 | NOD | 910 | $2,338 |
| 912 | (P5) Mapeo regional de productores de frutas y hortalizas | 21 días | lun 27/02/1 | lun 27/03/17 | NOD | 911 | $4,675 |
| 913 | (P6) Sistematización de avances y rezagos en la gestión de l | 21 días | mar 28/03/ | mié 26/04/17 | NOD | 912 | $4,675 |
| 914 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de** | **213 días** | **vie** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$16,884** |
| 915 | **Etapa de Adquisición** | **129 días** | **vie 26/02/1** | **mié 24/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 916 | TDR Presentados | 6 días | vie 26/02/1 | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | | $0 |
| 917 | NOB a la Adjudicación | 120 días | lun 07/03/1 | vie 19/08/16 | vie 19/08/16 | 916 | $0 |
| 918 | Firma del Contrato | 3 días | lun 08/08/1 | mié 10/08/16 | NOD | | $0 |
| 919 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | lun 22/08/1 | mié 24/08/16 | mié 24/08/... | 917 | $0 |
| 920 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **84 días** | **jue 25/08/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **915** | **$16,884** |
| 921 | Producto 1 | 15 días | jue 25/08/1 | mié 14/09/16 | NOD | 919 | $2,533 |
| 922 | Producto 2 | 15 días | vie 16/09/1 | jue 06/10/16 | NOD | 921 | $4,221 |
| 923 | Producto 3 | 15 días | vie 07/10/1 | vie 28/10/16 | NOD | 922 | $4,221 |
| 924 | Producto 4 | 18 días | lun 31/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 923 | $2,533 |
| 925 | Producto 5 | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 924 | $3,377 |
| 926 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de** | **847 días** | **lun** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$18,182** |
| 927 | **Etapa de Adquisición** | **761 días** | **lun 02/09/1** | **vie 19/08/16** | **NOD** | | **$0** |
| 928 | TDR Presentados | 97 días | vie 26/02/1 | jue 07/07/16 | jue 07/07/16 | | $0 |
| 929 | Selección de candidatos | 10 días | lun 08/08/1 | vie 19/08/16 | NOD | | $0 |
| 930 | NOB a la Adjudicación | 24 días | vie 08/07/1 | vie 12/08/16 | NOD | 928 | $0 |
| 931 | Firma de contrato | 3 días | lun 02/09/1 | mié 04/09/13 | NOD | | $0 |
| 932 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 3 días | lun 15/08/1 | mié 17/08/16 | NOD | 930 | $0 |
| 933 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **86 días** | **lun 22/08/1** | **mié 21/12/16** | **NOD** | **927** | **$18,182** |

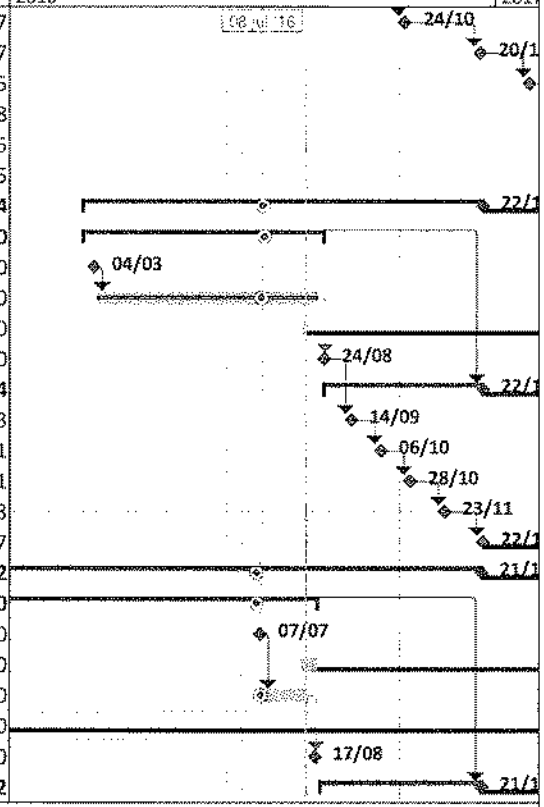


Project: PEP_SMART_1734
Date: Jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Producto 1 | 20 días | lun 22/08/1 | lun 19/09/16 | NOD | 932 | $2,727 |
| 935 | Producto 2 | 20 días | mar 20/09/1 | mar 18/10/16 | NOD | 934 | $3,636 |
| 936 | Producto 3 | 18 días | mié 19/10/1 | vie 11/11/16 | NOD | 935 | $4,546 |
| 937 | Producto 4 | 18 días | lun 14/11/1 | mié 07/12/16 | NOD | 936 | $4,546 |
| 938 | Producto 5 | 10 días | jue 08/12/1 | mié 21/12/16 | NOD | 937 | $2,727 |
| 939 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de** | **955** | **lun** | **jue 01/06/17** | **NOD** | | **$18,182** |
| 940 | **Etapa de Adquisición** | **790 días** | **lun 02/09/1** | **vie 30/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 941 | TDR Presentados | 97 días | vie 26/02/1 | jue 07/07/16 | jue 07/07/16 | | $0 |
| 942 | NOB a los TDR's | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | NOD | | $0 |
| 943 | Publicación de Convocatoria | 5 días | mar 16/08/1 | lun 22/08/16 | NOD | | $0 |
| 944 | Revisión de expedientes y entrevistas | 5 días | lun 26/09/1 | vie 30/09/16 | NOD | | $0 |
| 945 | NOB a la Adjudicación | 24 días | vie 08/07/1 | vie 12/08/16 | NOD | 941 | $0 |
| 946 | Firma de Contrato | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | NOD | | $0 |
| 947 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | lun 15/08/1 | mar 06/09/16 | NOD | 945 | $0 |
| 948 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **165 días** | **lun 03/10/1** | **jue 01/06/17** | **NOD** | **940** | **$18,182** |
| 949 | (P1) Plan estratégico de gestión de la mesa departamental | 41 días | lun 03/10/1 | mar 29/11/16 | NOD | 947 | $2,727 |
| 950 | (P2) Plan operativo de gestión de la mesa departamental de | 41 días | mié 30/11/1 | jue 02/02/17 | NOD | 949 | $3,636 |
| 951 | (P3) Identificación y analisis de potencialidades territoriales | 41 días | vie 03/02/1 | vie 31/03/17 | NOD | 950 | $4,546 |
| 952 | (P4) Agenda departamental de competitividad | 21 días | mar 04/04/1 | mié 03/05/17 | NOD | 951 | $4,546 |
| 953 | (P5) Perfil 1 de proyecto priorizado | 21 días | jue 04/05/1 | jue 01/06/17 | NOD | 952 | $2,727 |
| 954 | **Contratación 2017** | **230 días** | **lun 02/01/1** | **lun 27/11/17** | **NOD** | | **$76,000** |
| 955 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa** | **230 días** | **lun** | **lun 27/11/17** | **NOD** | | **$19,000** |
| 956 | **Etapa de Adquisición** | **40 días** | **lun 02/01/1** | **vie 24/02/17** | **NOD** | | **$0** |
| 957 | TDR Presentados | 6 días | lun 02/01/1 | lun 09/01/17 | NOD | | $0 |
| 958 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mar 10/01/1 | mié 01/02/17 | NOD | 957 | $0 |
| 959 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | jue 02/02/1 | vie 24/02/17 | NOD | 958 | $0 |

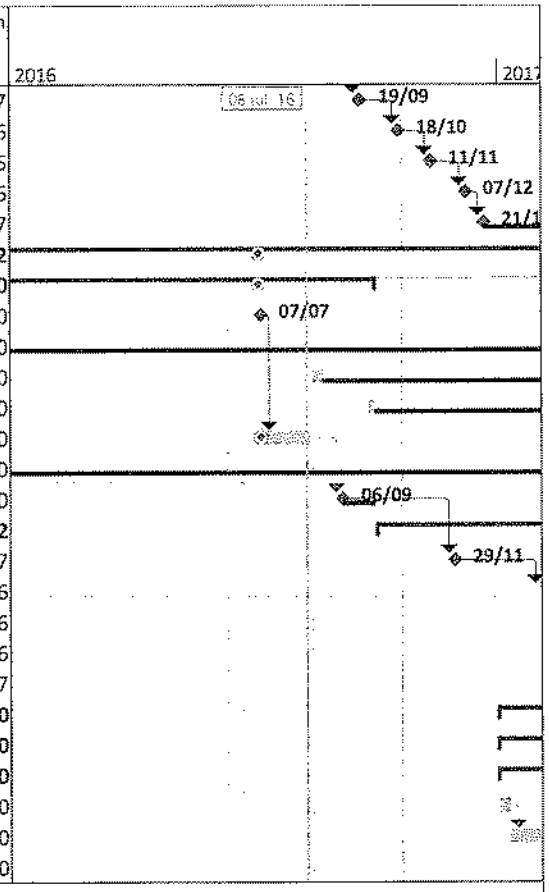


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **190 días** | **lun 27/02/1** | **lun 27/11/17** | **NOD** | **956** | **$19,000** |
| 961 | Producto 1 | 11 días | lun 27/02/1 | lun 13/03/17 | NOD | 959 | $1,900 |
| 962 | Producto 2 | 11 días | mar 14/03/: | mar 28/03/17 | NOD | 961 | $1,900 |
| 963 | Producto 3 | 21 días | mié 29/03/1 | jue 27/04/17 | NOD | 962 | $1,900 |
| 964 | Producto 4 | 21 días | vie 28/04/1 | lun 29/05/17 | NOD | 963 | $1,900 |
| 965 | Producto 5 | 21 días | mar 30/05/: | mar 27/06/17 | NOD | 964 | $1,900 |
| 966 | Producto 6 | 21 días | mié 28/06/1 | jue 27/07/17 | NOD | 965 | $1,900 |
| 967 | Producto 7 | 21 días | vie 28/07/1 | lun 28/08/17 | NOD | 966 | $1,900 |
| 968 | Producto 8 | 21 días | mar 29/08/: | mié 27/09/17 | NOD | 967 | $1,900 |
| 969 | Producto 9 | 21 días | jue 28/09/1 | vie 27/10/17 | NOD | 968 | $1,900 |
| 970 | Producto 10 | 21 días | lun 30/10/1 | lun 27/11/17 | NOD | 969 | $1,900 |
| 971 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa** | **230 días** | **lun** | **lun 27/11/17** | **NOD** | | **$19,000** |
| 987 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa** | **224 días** | **lun** | **vie 17/11/17** | **NOD** | | **$19,000** |
| 988 | **Etapa de Adquisición** | **34 días** | **lun 02/01/1** | **jue 16/02/17** | **NOD** | | **$0** |
| 989 | TDR Presentados | 0 días | lun 02/01/1 | lun 02/01/17 | NOD | | $0 |
| 990 | NOB a la Adjudicación | 17 días | lun 02/01/1 | mar 24/01/17 | NOD | 989 | $0 |
| 991 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | mié 25/01/1 | jue 16/02/17 | NOD | 990 | $0 |
| 992 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **190 días** | **vie 17/02/1** | **vie 17/11/17** | **NOD** | **988** | **$19,000** |
| 1003 | **Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de** | **230 días** | **lun** | **lun 27/11/17** | **NOD** | | **$19,000** |
| 1019 | **Asesor para la implementación de mesas de competitividad** | **703 días** | **mar 01/03/:** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$71,692** |
| 1020 | **Proceso Contratación Asesor para la implementación de mesas** | **210 días** | **mar** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$18,700** |
| 1021 | **Etapa de Adquisición** | **64 días** | **mar 01/03/:** | **mié 25/05/16** | **mié 25/05...** | | **$0** |
| 1022 | TDR Presentados | 26 días | mar 01/03/: | vie 01/04/16 | vie 01/04/16 | | $0 |
| 1023 | NOB a la Adjudicación | 14 días | lun 04/04/1 | jue 21/04/16 | jue 21/04/16 | 1022 | $0 |
| 1024 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 24 días | vie 22/04/1 | mié 25/05/16 | mié 25/05/... | 1023 | $0 |
| 1025 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **146 días** | **jue 26/05/1** | **mié 21/12/16** | **NOD** | **1021** | **$18,700** |

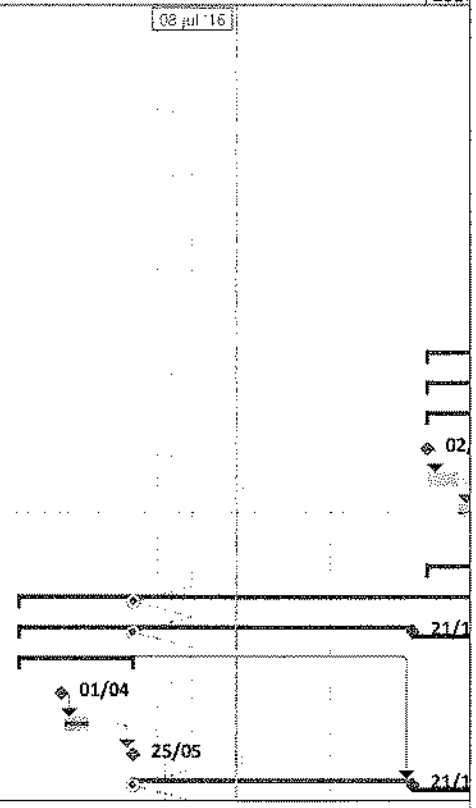


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | (P1) Formulación del plan operativo de red de mesas de co | 21 días | jue 26/05/1 | jue 23/06/16 | NOD | 102 | $2,992 |
| 1027 | (P2) Propuesta metodológica para la implementación de es | 41 días | vie 24/06/1 | mar 23/08/16 | NOD | 102 | $3,553 |
| 1028 | (P3) Informe de acompañamiento a estructuración de plata | 21 días | mié 24/08/1 | jue 22/09/16 | NOD | 102 | $2,805 |
| 1029 | (P4) Documento de apoyo para la difusión de las mesas de | 21 días | vie 23/09/1 | lun 24/10/16 | NOD | 102 | $2,618 |
| 1030 | (P5) Evaluación de estratégia de atracción de inversiones | 21 días | mar 25/10/ | mar 22/11/16 | NOD | 102 | $3,179 |
| 1031 | (P6) Evaluación y seguimiento para implementación y segui | 21 días | mié 23/11/1 | mié 21/12/16 | NOD | 103 | $3,553 |
| 1032 | **Proceso Contratación Asesor para la implementación de mesas** | **266 días** | **mar** | **jue 14/12/17** | **NOD** | | **$26,496** |
| 1050 | **Proceso Contratación Asesor para la implementación de mesas** | **266 días** | **mié** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$26,496** |
| 1068 | **Mesas Difundidas** | **87 días** | **lun 15/08/1** | **jue 15/12/16** | **NOD** | | **$33,766** |
| 1077 | **Ranking de Competitividad Territorial desarrollado** | **533 días** | **mié 02/09/** | **lun 16/10/17** | **NOD** | | **$57,144** |
| 1078 | Modelo matemático realizado | 80 días | mié 02/09/1 | mié 23/12/15 | mié 23/12/... | | $0 |
| 1079 | **Plataforma desarrollada** | **90 días** | **lun 15/08/1** | **mar 20/12/16** | **NOD** | **2061** | **$31,169** |
| 1089 | Sistematización de las capacidades de las mesas para medición de | 200 días | lun | lun 16/10/17 | NOD | | $25,975 |
| 1090 | **Planes de Ordenamiento Territorial desarrollados e implementados** | **723.88 d** | **lun 01/02/1** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$555,985** |
| 1091 | **Condiciones previas en los territorios para el desarrollo de POT** | **715 días** | **vie 12/02/1** | **jue 13/12/18** | **NOD** | | **$78,186** |
| 1151 | **POT desarrollados en los territorios** | **419.88 d** | **lun 01/02/1** | **mié 27/09/17** | **NOD** | | **$139,049** |
| 1207 | **POT Difundido (implementación)** | **651 días** | **vie 26/02/1** | **jue 27/09/18** | **NOD** | | **$338,750** |
| 1208 | **Contratación 2016** | **276 días** | **vie 26/02/1** | **mié 29/03/17** | **NOD** | | **$88,836** |
| 1209 | **Proceso de Contratación: Implementación de POT en Ayutla,** | **276 días** | **vie** | **mié 29/03/17** | **NOD** | **2061** | **$20,265** |
| 1220 | **Proceso de Contratación: Asesor para la implementación de** | **254 días** | **mar** | **mié 01/03/17** | **NOD** | | **$14,805** |
| 1231 | **Proceso de Contratación: Asesor para la implementación de** | **210 días** | **mar** | **mié 21/12/16** | **NOD** | | **$14,805** |
| 1232 | **Etapa de Adquisición** | **89 días** | **mar 01/03/** | **mié 29/06/16** | **mié 29/06...** | | **$0** |
| 1233 | TDR Presentados | 12 días | mar 01/03/ | lun 14/03/16 | lun 14/03/16 | | $0 |
| 1234 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mar 15/03/ | mié 06/04/16 | mié 06/04/... | 123 | $0 |
| 1235 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 60 días | jue 07/04/1 | mié 29/06/16 | mié 29/06/... | 123 | $0 |
| 1236 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **100 días** | **lun 01/08/1** | **mié 21/12/16** | **NOD** | **123** | **$14,805** |

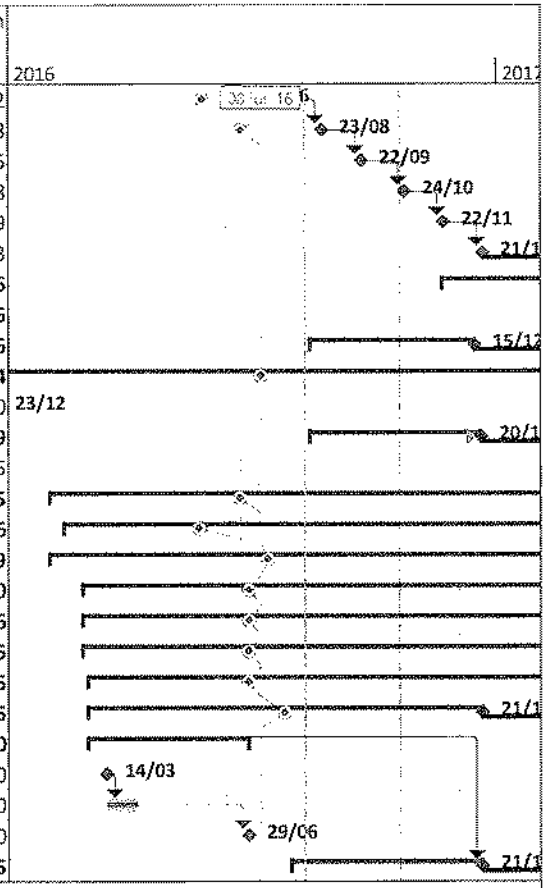


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | (P1) Plan de socialización y divulgación del proceso de OT | 21 días | lun 01/08/1 | mar 30/08/16 | NOD | | $2,221 |
| 1238 | (P2) Manual de funciones de la Dirección Municipal de OT y | 21 días | mié 31/08/1 | jue 29/09/16 | NOD | 123 | $2,961 |
| 1239 | (P3) Sistema de seguimiento y evaluación del POTM | 21 días | vie 30/09/1 | lun 31/10/16 | NOD | 123 | $2,961 |
| 1240 | (P4) Reglamento de construcción actualizado | 21 días | mar 01/11/ | mar 29/11/16 | NOD | 123 | $3,701 |
| 1241 | (P5) Plan de movilidad | 16 días | mié 30/11/1 | mié 21/12/16 | NOD | 124 | $2,961 |
| 1242 | **Contratación : Capacitación en OT** | **179 días** | **vie 08/07/1** | **mié 29/03/17** | **NOD** | **206** | **$38,961** |
| 1251 | **Contratación 2017** | **271 días** | **mar 22/11/** | **jue 21/12/17** | **NOD** | | **$99,567** |
| 1293 | **Contratación 2018** | **212 días** | **mié 22/11/** | **jue 27/09/18** | **NOD** | | **$150,347** |
| 1330 | **Territorios promocionados mediantes guías y planes** | **925 días** | **lun 02/09/1** | **mié 19/04/17** | **NOD** | | **$70,859** |
| 1331 | **Proceso de Contratación: Territorios promocionados mediante** | **839** | **lun** | **vie 09/12/16** | **NOD** | | **$44,898** |
| 1332 | **Etapa de Adquisición** | **778 días** | **lun 02/09/1** | **mar 13/09/16** | **NOD** | | **$0** |
| 1333 | Terminos de Referencia | 1 día? | lun 02/09/1 | lun 02/09/13 | NOD | | $0 |
| 1334 | NOB a los TDR's | 21 días | vie 08/07/1 | mar 09/08/16 | mar 09/08... | | $0 |
| 1335 | Revisión TDR's (Solicitud sub dirección) | 8 días | mié 10/08/1 | vie 19/08/16 | NOD | 133 | $0 |
| 1336 | NOB de Tdr's (2da revisión) | 4 días | mar 09/08/ | vie 12/08/16 | NOD | | $0 |
| 1337 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | lun 22/08/1 | mar 13/09/16 | NOD | 133 | $0 |
| 1338 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **61 días?** | **mié 14/09/** | **vie 09/12/16** | **NOD** | **133** | **$44,898** |
| 1339 | Producto 1 | 41 días | mié 14/09/1 | vie 11/11/16 | NOD | 133 | $23,717 |
| 1340 | Producto 2 | 20 días | lun 14/11/1 | vie 09/12/16 | NOD | 133 | $21,181 |
| 1341 | Producto 3 | 1 día? | mié 14/09/1 | mié 14/09/16 | NOD | | $0 |
| 1342 | Producto 4 | 1 día? | mié 14/09/1 | mié 14/09/16 | NOD | | $0 |
| 1343 | **Proceso de Contratación: Territorios promocionados mediante** | **100 días** | **mar** | **mié 19/04/17** | **NOD** | | **$25,961** |
| 1344 | **Etapa de Adquisición** | **23 días** | **mar 22/11/** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$0** |
| 1345 | TDR Presentados | 6 días | mar 22/11/ | mar 29/11/16 | NOD | | $0 |
| 1346 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mié 30/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 134 | $0 |
| 1347 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **77 días** | **lun 02/01/1** | **mié 19/04/17** | **NOD** | **134** | **$25,961** |

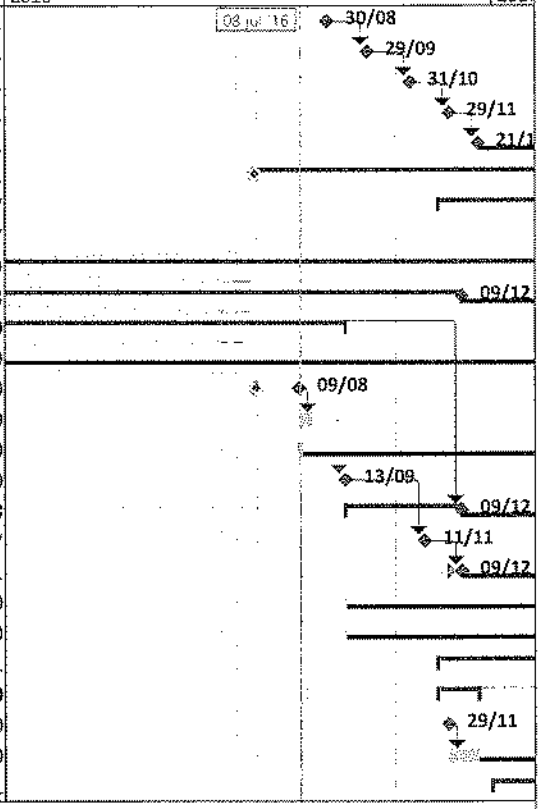


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | Producto 1 | 34 días | lun 02/01/1 | jue 16/02/17 | NOD | | $12,961 |
| 1349 | Producto 2 | 43 días | vie 17/02/1 | mié 19/04/17 | NOD | 1348 | $13,000 |
| 1350 | **Componente 5** | **849.88 d** | **lun 04/01/1** | **vie 24/05/19** | **NOD** | | **$960,161** |
| 1351 | | | | | | | |
| 1352 | | | | | | | |
| 1356 | | | | | | | |
| 1358 | **Otros gestión** | **849.88 d** | **lun 04/01/1** | **vie 24/05/19** | **NOD** | | **$817,282** |
| 1359 | **Préstamo coordinado y funcionando** | **749.88 d** | **lun 04/01/1** | **vie 21/12/18** | **NOD** | | **$785,670** |
| 1360 | **Renglón 081** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$158,447** |
| 1361 | **Proceso de Contratación: Asesor de Mesas de Competitividad** | **58.88** | **lun** | **mar** | **mar** | | **$5,409** |
| 1362 | **Etapa de Adquisición** | **21 días** | **lun 04/01/1** | **mar 02/02/16** | **mar 02/02...** | | **$0** |
| 1363 | TDR Presentados | 5 días | lun 04/01/1 | lun 11/01/16 | lun 11/01/16 | | $0 |
| 1364 | NOB a la Adjudicación | 8 días | lun 11/01/1 | jue 21/01/16 | jue 21/01/16 | 1363 | $0 |
| 1365 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 8 días | jue 21/01/1 | mar 02/02/16 | mar 02/02... | 1364 | $0 |
| 1366 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **32 días** | **mié 10/02/** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | **1362** | **$5,409** |
| 1367 | Producto 1 | 8 días | mié 10/02/1 | vie 19/02/16 | vie 19/02/16 | 1365 | $1,000 |
| 1368 | Producto 2 | 2 días | vie 19/02/1 | mar 23/02/16 | mar 23/02... | 1367 | $2,213 |
| 1369 | Producto 3 | 22 días | mié 24/02/1 | mar 22/03/16 | mar 22/03... | 1368 | $2,196 |
| 1370 | **Asistente de Contabilidad** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$38,331** |
| 1371 | **Contratación 2016** | **251.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$11,835** |
| 1372 | **Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad (Contr** | **58.88 día** | **lun 04/01/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | | **$1,899** |
| 1373 | **Etapa de Adquisición** | **38 días** | **lun 04/01/1** | **jue 25/02/16** | **jue 25/02/...** | | **$0** |
| 1374 | TDR Presentados | 6 días | lun 04/01/1 | mar 12/01/16 | mar 12/01... | | $0 |
| 1375 | NOB a la Adjudicación | 14 días | mar 12/01/ | lun 01/02/16 | lun 01/02/16 | 1374 | $0 |
| 1376 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 15 días | jue 04/02/1 | jue 25/02/16 | jue 25/02/16 | 1375 | $0 |
| 1377 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **20.88 día** | **jue 25/02/1** | **mar 22/03/16** | **mar 22/03...** | **1375** | **$1,899** |

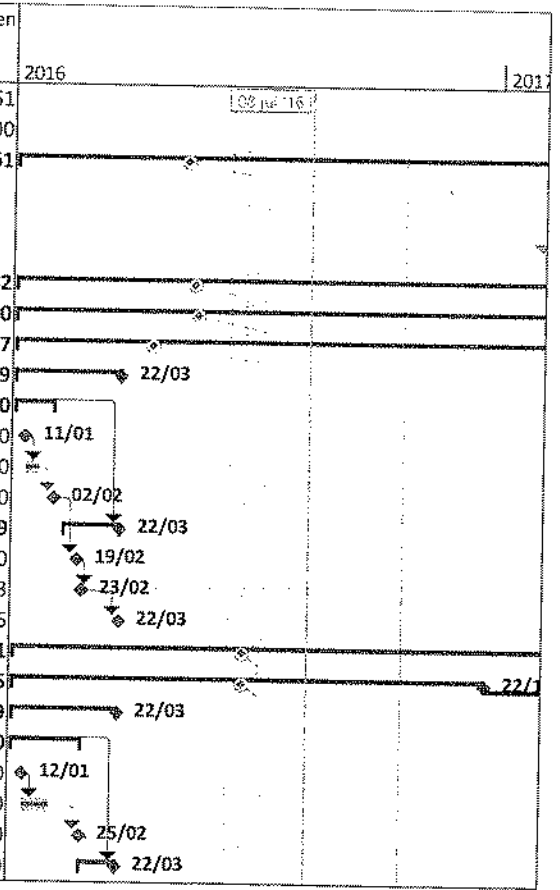


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | Producto 1 | 2.88 días | jue 25/02/1 | lun 29/02/16 | lun 29/02/16 | 137 | $801 |
| 1379 | Producto 2 | 18 días | mar 01/03/1 | mar 22/03/16 | mar 22/03... | 137 | $1,098 |
| 1380 | **Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad (Contr** | **222 días** | **lun 15/02/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | | **$9,936** |
| 1381 | **Etapa de Adquisición** | **44 días** | **lun 15/02/1** | **mar 12/04/16** | **mar 12/04...** | | **$0** |
| 1382 | TDR Presentados | 11 días | lun 15/02/1 | lun 29/02/16 | lun 29/02/16 | | $0 |
| 1383 | NOB a la Adjudicación | 4 días | mar 01/03/1 | vie 04/03/16 | vie 04/03/16 | 138 | $0 |
| 1384 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 29 días | lun 07/03/1 | mar 12/04/16 | mar 12/04... | 138 | $0 |
| 1385 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **178 días** | **mié 13/04/1** | **jue 22/12/16** | **NOD** | **138** | **$9,936** |
| 1386 | Producto 1 | 10 días | mié 13/04/1 | mar 26/04/16 | mar 26/04... | 138 | $1,104 |
| 1387 | Producto 2 | 21 días | mié 27/04/1 | mié 25/05/16 | mié 25/05/... | 138 | $1,104 |
| 1388 | Producto 3 | 21 días | jue 26/05/1 | jue 23/06/16 | jue 23/06/16 | 138 | $1,104 |
| 1389 | Producto 4 | 21 días | vie 24/06/1 | vie 22/07/16 | NOD | 138 | $1,104 |
| 1390 | Producto 5 | 21 días | mar 26/07/1 | mié 24/08/16 | NOD | 138 | $1,104 |
| 1391 | Producto 6 | 21 días | jue 25/08/1 | vie 23/09/16 | NOD | 139 | $1,104 |
| 1392 | Producto 7 | 21 días | lun 26/09/1 | mar 25/10/16 | NOD | 139 | $1,104 |
| 1393 | Producto 8 | 21 días | mié 26/10/1 | mié 23/11/16 | NOD | 139 | $1,104 |
| 1394 | Producto 9 | 21 días | jue 24/11/1 | jue 22/12/16 | NOD | 139 | $1,104 |
| 1395 | **Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad 2017** | **277 días** | **lun** | **jue 21/12/17** | **NOD** | | **$13,248** |
| 1396 | **Etapa de Adquisición** | **40 días** | **lun 14/11/1** | **lun 16/01/17** | **NOD** | | **$0** |
| 1397 | TDR Presentados | 6 días | lun 14/11/1 | lun 21/11/16 | NOD | | $0 |
| 1398 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mar 22/11/1 | mié 14/12/16 | NOD | 139 | $0 |
| 1399 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | jue 15/12/1 | lun 16/01/17 | NOD | 139 | $0 |
| 1400 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **237 días** | **mar 17/01/1** | **jue 21/12/17** | **NOD** | **139** | **$13,248** |
| 1401 | Producto 1 | 10 días | mar 17/01/1 | lun 30/01/17 | NOD | 139 | $1,104 |
| 1402 | Producto 2 | 17 días | mar 31/01/1 | mié 22/02/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1403 | Producto 3 | 21 días | jue 23/02/1 | jue 23/03/17 | NOD | 140 | $1,104 |

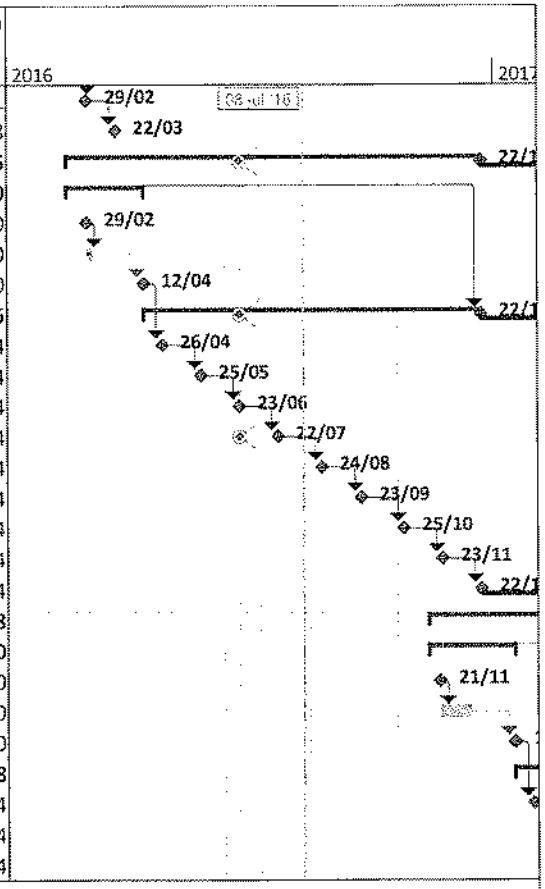


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | Producto 4 | 21 días | vie 24/03/1 | lun 24/04/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1405 | Producto 5 | 21 días | mar 25/04/ | mié 24/05/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1406 | Producto 6 | 21 días | jue 25/05/1 | jue 22/06/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1407 | Producto 7 | 21 días | vie 23/06/1 | vie 21/07/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1408 | Producto 8 | 21 días | lun 24/07/1 | mié 23/08/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1409 | Producto 9 | 21 días | jue 24/08/1 | vie 22/09/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1410 | Producto 10 | 21 días | lun 25/09/1 | mar 24/10/17 | NOD | 140 | $1,104 |
| 1411 | Producto 11 | 21 días | mié 25/10/1 | mié 22/11/17 | NOD | 141 | $1,104 |
| 1412 | Producto 12 | 21 días | jue 23/11/1 | jue 21/12/17 | NOD | 141 | $1,104 |
| 1413 | **Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad 2018** | **277 días** | **mar** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$13,248** |
| 1414 | **Etapa de Adquisición** | **40 días** | **mar 14/11/** | **lun 15/01/18** | **NOD** | | **$0** |
| 1415 | TDR Presentados | 6 días | mar 14/11/ | mar 21/11/17 | NOD | | $0 |
| 1416 | NOB a la Adjudicación | 17 días | mié 22/11/1 | jue 14/12/17 | NOD | 141 | $0 |
| 1417 | Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato | 17 días | vie 15/12/1 | lun 15/01/18 | NOD | 141 | $0 |
| 1418 | **Etapa de Ejecución de pagos** | **237 días** | **mar 16/01/** | **jue 20/12/18** | **NOD** | **141** | **$13,248** |
| 1419 | Producto 1 | 10 días | mar 16/01/ | lun 29/01/18 | NOD | 141 | $1,104 |
| 1420 | Producto 2 | 17 días | mar 30/01/ | mié 21/02/18 | NOD | 141 | $1,104 |
| 1421 | Producto 3 | 21 días | jue 22/02/1 | jue 22/03/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1422 | Producto 4 | 21 días | vie 23/03/1 | mar 24/04/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1423 | Producto 5 | 21 días | mié 25/04/1 | jue 24/05/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1424 | Producto 6 | 21 días | vie 25/05/1 | vie 22/06/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1425 | Producto 7 | 21 días | lun 25/06/1 | lun 23/07/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1426 | Producto 8 | 21 días | mar 24/07/ | jue 23/08/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1427 | Producto 9 | 21 días | vie 24/08/1 | vie 21/09/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1428 | Producto 10 | 21 días | lun 24/09/1 | mar 23/10/18 | NOD | 142 | $1,104 |
| 1429 | Producto 11 | 21 días | mié 24/10/1 | mié 21/11/18 | NOD | 142 | $1,104 |

2016 | 2017

08 jul '16

Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | Producto 12 | 21 días | jue 22/11/1 | jue 20/12/18 | NOD | 1429 | $1,104 |
| 1431 | **Asistente II Adquisiciones** | **724 días** | **lun 08/02/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$36,432** |
| 1432 | **Proceso de Contratación: Asistente II Adquisiciones 2016** | **217 días** | **lun 08/02/1** | **jue 08/12/16** | **NOD** | | **$9,936** |
| 1447 | **Proceso de Contratación:Asistente II Adquisiciones 2017** | **277 días** | **lun** | **jue 21/12/17** | **NOD** | | **$13,248** |
| 1465 | **Proceso de Contratación:Asistente II Adquisiciones 2018** | **277 días** | **mar 14/11/** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$13,248** |
| 1483 | **Asesor en Monitoreo y Evaluación** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$78,275** |
| 1545 | **Renglón 183** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$92,186** |
| 1546 | **Asesor Legal** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$92,186** |
| 1606 | **Renglón 186** | **705 días** | **vie 04/03/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$40,528** |
| 1607 | **Servicios de Informática** | **705 días** | **vie 04/03/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$40,528** |
| 1658 | **Renglón 189** | **749.88 d** | **lun 04/01/1** | **vie 21/12/18** | **NOD** | | **$494,509** |
| 1659 | **Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y** | **727 días** | **jue** | **vie 21/12/18** | **NOD** | | **$119,989** |
| 1718 | **Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$111,976** |
| 1778 | **Asesor de proyectos de desarrollo empresarial** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$115,220** |
| 1849 | **Asesor de desarrollo de territorios de inversión** | **742.88 d** | **lun 04/01/1** | **mié 12/12/18** | **NOD** | | **$122,323** |
| 1910 | **Proceso de Contratación: Evaluación Intermedia del Préstamo** | **124 días** | **vie** | **mié 11/01/17** | **NOD** | | **$25,000** |
| 1917 | **Auditoría externa** | **829.88 d** | **lun 01/02/1** | **vie 24/05/19** | **NOD** | | **$31,612** |
| 1946 | **Otros Estrategia de comunicación** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$142,879** |
| 1947 | **Asesor en Comunicación** | **748.88 d** | **lun 04/01/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$82,885** |
| 2009 | **Asesor en Relaciones Públicas e Imagen** | **729 días** | **lun 01/02/1** | **jue 20/12/18** | **NOD** | | **$59,994** |
| 2061 | ~~Riesgo: NO Ampliación presupuestaria requerida~~ | | | | | | |
| 2062 | Operación Aprobada | 0 días | mié 03/05/( | mié 03/05/06 | mié 03/05/... | | $0 |
| 2063 | Efectividad | 0 días | vie 24/08/12 | vie 24/08/12 | vie 24/08/12 | | $0 |
| 2064 | Elegibilidad | 0 días | lun 26/08/13 | lun 26/08/13 | lun 26/08/13 | | $0 |
| 2065 | Primer Desembolso | 0 días | jue 04/04/13 | jue 04/04/13 | jue 04/04/13 | | $0 |
| 2066 | Cierre | 0 días | vie 24/02/17 | vie 24/02/17 | NOD | | $0 |

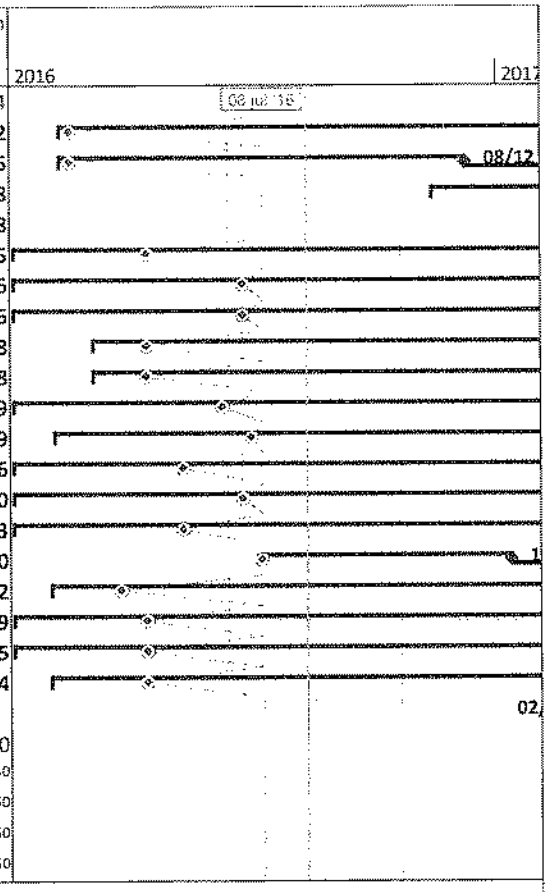


Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Task | External Tasks | Manual Task | Finish-only | | |
| Split | External Milestone | Duration-only | Deadline | | |
| Milestone | Inactive Task | Manual Summary Rollup | Progress | | |
| Summary | Inactive Milestone | Manual Summary | Progreso manual | | |
| Project Summary | Inactive Summary | Start-only | Margen de demora | | |

| Id | Nombre de la Tarea | Duración | Inicio | Fin | Fin real | Pred | Financiamien | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | Evaluación Final | 0 días | vie 30/08/19 | vie 30/08/19 | NOD | | $0 | | |
| 2068 | PCR | 0 días | vie 24/02/17 | vie 24/02/17 | NOD | 2066 | $0 | | |
| 2069 | Evaluación de Impacto | 0 días | vie 24/02/17 | vie 24/02/17 | NOD | 2066 | $0 | | |
| 2070 | Aprobación Ampliación de Plazo último desembolso del Préstamo y Cambi | 0 días | vie 30/09/16 | vie 30/09/16 | NOD | | $0 | | 30/09 |

Project: PEP_SMART_1734
Date: jue 11/08/16

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Task | | External Tasks | | Manual Task | | Finish-only | |
| Split | | External Milestone | | Duration-only | | Deadline | |
| Milestone | | Inactive Task | | Manual Summary Rollup | | Progress | |
| Summary | | Inactive Milestone | | Manual Summary | | Progreso manual | |
| Project Summary | | Inactive Summary | | Start-only | | Margen de demora | |

# ANEXO No. 2

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Ejercicio: | 2016 |
| Mes a Reportar: | JULIO |
| Entidad: | MINECO 11130011 |
| Unidad Ejecutora: | 102 |
| Préstamo: | BID 1734/OC-GU |
| Código Presupuesto: | 5204029111 |

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II. 2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| | Empresas beneficiadas con diagnósticos, programas, políticas y proyectos de competitividad y clima de negocios. | | 481 | 290 | 113 | 38.97 | 17,608,797.90 | 47,045,622.00 | 4,668,519.47 | 9.92% | |
| Apoyo al diseño e implementación de mejoras en el clima de inversión y en el entorno productivo privado | Empresas beneficiadas con mejoras en el clima de negocios en la reducción de costos, tiempo o procedimientos para iniciar, operar o cerrar negocios, en sus fases de producción, comercialización, financiamiento o venta | Documento | 170 | 159 | 91 | 57.23 | 5,872,000.00 | 5,393,340.00 | 595,456.16 | 11.04% | |
| Apoyo a inversiones estratégicas | Empresas beneficiadas con proyectos dinamizadores de la economía | Documento | 2 | 1 | | 0.00 | 3,137,721.90 | 15,213,026.00 | 3,042,605.16 | 20.00% | |
| Puesta en marcha de un programa de fomento de apoyo a empresas y encadenamientos productivos | Empresas beneficiadas con estrategias, programas de innovación y servicios de desarrollo empresarial. | Documento | 251 | 30 | | 0.00 | 905,551.00 | 14,440,740.00 | 15,746.51 | 0.11% | Reporte de SIGES No. 00818265 y SICOIN No. 00815811 |
| Apoyo para el desarrollo de institucionalidad para la competitividad a nivel territorial | Empresas beneficiadas con estrategias para el desarrollo institucional y competitivo a nivel territorial | Documento | 47 | 13 | | 0.00 | 3,902,980.00 | 9,208,420.00 | 68,190.00 | 0.74% | |
| Fortalecimiento institucional | Empresas beneficiadas con la implementación de un sistema marco de productividad y competitividad | Documento | 11 | 37 | 22 | 59.46 | 4,690,545.00 | 2,790,096.00 | 946,501.62 | 33.92% | |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | | | Avance del mes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.1 Componente al que se vincula | III. 2 Nombre | III.3 Unidad de medida | III.4 Línea Base | III. 5 Inicial 2016 | III.6 Vigente 2016 | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas Aclaratorias |
| Clima de Negocios | Doing Business | Es el Mayor rango en el promedio simple de su clasificación porcentual de cada uno de los 10 temas que se incluyen en el Indice de Doing Business 2014 | 81 | 79 | 79 | 81 | Informe Anual del Doing Business (www.doingbusiness.org) | |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Implementación de Unidades de Promoción de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYMES) | Unidad de Promoción a MIPYMES implementada / Unidad de Promoción a MIPYMES programada | 0 | 10 | 10 | 0 | Informes presentados | |
| Servicios de Desarrollo Territorial | Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Ayutla San Marcos, San Agustín Acasaguastlán y Masagua Escuintla. | Plan de Ordenamiento Territorial gestionado / Plan de Ordenamiento Territorial programado | 0 | 3 | 3 | 0 | Plan de Ordenamiento Territorial (POT) gestionado en Ayutla San Marcos, San Agustín Acasaguastlán y Masagua Escuintla | |
| | Elaboración de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) San Juan Ostuncalco Quetzaltenango (Región VI) y Zacapa Zacapa | Plan de Ordenamiento Territorial elaborado / Plan de Ordenamiento Territorial programado | 0 | 2 | 2 | 0 | Plan de Ordenamiento Territorial (POT) elaborado en San Juan Ostuncalco Quetzaltenango (Región VI) y Zacapa Zacapa | |
| | Gestión de Mesa Regional de Competitividad (Región VI) y Mesa Departamental de Competitividad (Zacapa) | Mesas implementadas / Mesas programadas | 0 | 2 | 2 | 0 | Informes presentados | |
| | Gestión de una Mesa Regional de Competitividad (Región VI) y cuatro Mesas Departamentales de Competitividad en Zacapa, Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, Escuintla y San Marcos | Mesas implementadas / Mesas programadas | 0 | 5 | 5 | 0 | Informes presentados | |

## III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| | | | Avance del mes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.1 Componente al que se vincula | III. 2 Nombre | III.3 Unidad de medida | III.4 Línea Base | III. 5 Inicial 2016 | III.6 Vigente 2016 | III.7 Ejecutado | III.8 Medios de verificación | III.9 Notas Aclaratorias |
| Clima de Negocios | Doing Business | Es el Mayor rango en el promedio simple de su clasificacion porcentual de cada uno de los 10 temas que se incluyen en el índice de Doing Business 2014 | 81 | 79 | 79 | 81 | Informe Anual del Doing Business (www.doingbusiness.org) | |
| Servicios de Desarrollo Empresarial | Implementación de Unidades de Promoción de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PROMIPYMES) | Unidad de Promoción a MIPYMES implementada / Unidad de Promoción a MIPYMES programado | 0 | 10 | 10 | 0 | Informes presentados | |
| | Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Ayuda San Marcos, San Agustín Acasaguastlán y Masagua Escuintla | Plan de Ordenamiento Territorial gestionado / Plan de Ordenamiento Territorial programado | 0 | 3 | 3 | 0 | Plan de Ordenamiento Territorial (POT) gestionado en Ayuda San Marcos, San Agustín Acasaguastlán y Masagua Escuintla | |
| | Proyectos de desarrollo Sectorial (Plan turístico de Guatemágica) | Plan sectorial ejecutado / Plan sectorial programado | 0 | 1 | 1 | 0 | Plan elaborado | |
| Monitoreo y seguimiento | Agenda Nacional de Competitividad | Agenda Nacional de Competitividad actualizada / Agenda Nacional de Competitividad programada | 1 | 1 | 1 | 0 | Informe de actualizacion del resultado | |

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

Recuento comparativo

| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA | | |
| 31.67 | 3.27% | Variación % Física | 7.30 |
| | | Variación % Financiera | 0.07 |

| IV. 2 GESTIÓN AL MES | |
|---|---|
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA |
| 38.97 | 9.92% |

IV.2 Valoración Balance

IV. 3 Alertivos

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Prestamos

Ejercicio: 2016
Entidad: MINECO
Unidad Ejecutora: PRONACOM
Préstamo: 1734

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero .

## I AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| Componente | Programa | Actividad | Meta 2016 | | % Avance Financiero | Medios de verificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 170 | | 0.110406197 | Reporte de SIGES No. 00818265 y SICOIN No. 00815611 |
| 2 | 12 | 2 | 2 | | 0.199999999 | |
| 3 | 12 | 2 | 251 | | 0.001090423 | |
| 4 | 12 | 2 | 47 | | 0.007405179 | |
| 5 | 12 | 2 | 11 | | 0.33923622 | |

## II INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| Nombre | INDICADOR | | | | | | | Notas Aclaratorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad de medida | Línea Base 2015 | Meta 2016 | Alcance al Mes | Proyección Mes siguiente | Proyección Cierre 2016 | Medios de verificación | |
| **Componente 1: Mejorar el entorno productivo** | | | | | | | | |
| Sistemas de trámites para mejorar clima de negocios diagnosticado, propuesto y mejorado | Sistemas | 5.00 | 5 | 0 | | 5 | SIGES | |
| Plan Nacional de Logística elaborado e implementado | Plan de logística | 1 | 1 | 1 | | 1 | SIGES | |
| Trámites actualizados y simplificados a través de la Plataforma Ventanilace | Trámites | 150 | 150 | 72 | 12 | 150 | SIGES | |
| Estrategia para la mejora de la calificación país diseñada e implementada | Estrategia | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Misiones de difusión de reformas implementadas a stakeholders internacional (tres misiones al año) | Misiones | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Diseño del Banco de segundo piso | Diseño | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Buró de crédito diseñado y propuesta de ley | Sistemas | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Proyecto de ley de Buró de crédito aprobado | Sistema | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Sistema de Buró de Crédito diseñado | Sistema | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Política y legislación Nacional de competencia diseñada | Diseño | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Política diseñada | Proyecto de ley | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Sistema informático de monitoreo para mejoras a los derechos del consumidor diseñado y desarrollado | Sistema | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Consumidores informados sobre los derechos de los consumidores | Consumidores | 3200 | 3200 | 80 | 1592 | 3200 | SIGES | |
| Propuesta de Código de Gobierno Corporativo desarrollada | Propuesta | 1 | 1 | 1 | | 1 | SIGES | |
| Implementación de la Ventanilla única de inversión (VUI) | Propuesta | 1 | 1 | 1 | | 1 | SIGES | |
| Proyectos para nuevas mejoras al entorno productivo elaborados | Proyectos | 3 | 3 | 0 | | 3 | SIGES | |
| Iniciativas de agenda legislativas analizadas y difundidas | Iniciativas | 3 | 3 | 0 | | 3 | SIGES | |
| Difusión Anual sobre la Mejora del Entorno productivo | Informe Anual | 0 | 0 | 0 | | 0 | SIGES | |
| Evento de proyectos de proyección internacional | Eventos | 2 | 2 | 2 | | 2 | SIGES | |
| Eventos y materiales de difusión, socialización nacional y formación de consensos | Eventos | 10 | 10 | 5 | | 10 | SIGES | |
| **Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad** | | | | | | | SIGES | |
| Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad | Estudios técnicos de prefactibilidad | 1 | 1 | 0.00 | | 1 | SIGES | |
| Proyecto interconexión vial y tren urbano de pasajeros | Proyectos | 1 | 1 | 0.00 | | 1 | SIGES | |
| Proyecto Servicios Aéreos | Proyectos | 1 | 1 | 0.00 | | 1 | SIGES | |
| Proyectos interconexión vial CA-9 N y CA-1 Or | Proyectos | 1 | 1 | 0.00 | | 1 | SIGES | |
| Proyectos de infraestructuras difundidos a inversores | Difusiones | 1 | 1 | 0.00 | | 1 | SIGES | |
| **Componente 3: Servicios de Desarrollo Empresarial** | | | | | | | | |
| Estrategia implementada para la mejora de la estructura institucional en temas de Servicio de Desarrollo Empresarial e Innovación | Estrategia | 1 | 1 | 1.00 | | 1.00 | SIGES | |
| Procesamiento, diagnóstico y análisis de datos | Informe | 1 | 1 | 0.00 | | 1.00 | SIGES | |
| Capacitaciones específicas en SDE | Número de empresas | | | 600.00 | | 0.00 | SIGES | |
| Proyectos de emprendimiento apoyados | Número de proyectos | | | 75.00 | | 0.00 | SIGES | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de apoyo al emprendurismo de empresas funcionando | Programa | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | SIGES |
| Empresas capacitadas bajo programa de fomento a la productividad (Small Business Development Center) | Número de empresas | | | 2003.00 | 0.00 | SIGES |
| Programa de apoyo a la productividad de empresas funcionando | Programa | | | 8.00 | 0.00 | SIGES |
| Empresas asistidas bajo programa de innovación a las empresas | Número de empresas | | | 160.00 | 0.00 | SIGES |
| Programa de apoyo a la innovación de empresas funcionando | Programa | | | 1.00 | 0.00 | SIGES |
| Planes y estudios de desarrollo sectorial desarrollados | Planes y estudios | | | | | SIGES |
| COMPONENTE 4: Servicios de Desarrollo Territorial | | | | | | |
| Planes del Sector turismo de Sacatepequez para la competitividad territorial apoyado | Planes | | | | | SIGES |
| Planes de Conceptualizaciones económicas de Desarrollo - CEDES- desarrollados | Planes | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | SIGES |
| Plan de desarrollo del turismo en Guatemagica desarrollado | Plan | | | | | SIGES |
| Mesas de competitividad instaladas y coordinadas | Mesas | 8.00 | 8.00 | | | SIGES |
| Ranking de Competitividad Territorial desarrollado | Ranking | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | SIGES |
| Planes de Ordenamiento Territorial desarrollados e implementados | Planes y reglamentos | 3.00 | 3.00 | | | SIGES |
| Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos | Personas | 10000.00 | 10000.00 | | | SIGES |
| Territorios promocionados mediante guías y planos | Territorios | 4.00 | 4.00 | | | SIGES |
| COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad | | | | | | |
| desarrollado | Sistema | | | | | SIGES |
| Prestamo coordinado y funcionando | Apoyos | | | | | SIGES |
| Evaluacion y auditoria del programa | Auditorias | | | | | SIGES |
| Gestión de oficinas y recursos humanos | Oficina y equipo funcional | | | | | SIGES |
| Otras estrategias de comunicación | Informes de comunicación | | | | | SIGES |
| Estrategia de comunicación del Programa Desarrollado | Apoyos | | | | | SIGES |
| Eventos de socialización nacional y formación de consensos usuarios, stakeholders y tomadores de decisión | Eventos | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | SIGES |
| Materiales de difusión, socialización, educativo, e informativo de Competitividad (Material Virtual, impreso y publicaciones en prensa) | Materiales | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | SIGES |

## III BALANCE DE GESTIÓN

Recuento comparativo

| GESTIÓN MES ANTERIOR | |
|---|---|
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA |
| | |

| GESTIÓN AL MES | |
|---|---|
| EJECUCION FISICA | EJECUCION FINANCIERA |
| | |

## IV ALERTIVOS
